

Informe

de ejecución física del
Presupuesto General del Estado

Periodo: enero – septiembre 2023

Secretaría Nacional
de Planificación


Gobierno
del **Ecuador**

| | |
|---|------------|
| CAPÍTULO I | 3 |
| 1.1. Introducción | 3 |
| 1.2. Marco Legal | 3 |
| 1.3. Objetivo | 5 |
| 1.4. Plan de Creación de Oportunidades 2021-2025 | 6 |
| 1.5. Estructura de componentes presupuestarios del PGE | 6 |
| 1.6. Estructura de componentes presupuestarios del PGE por ejes del PND 2021-2025 | 7 |
| CAPÍTULO II SEGUIMIENTO A PLANES INSTITUCIONALES – PI | 9 |
| 2.1. Metodología aplicada | 9 |
| 2.2. Ejecución presupuestaria | 12 |
| 2.3. Ejecución presupuestaria por objetivo del Plan Nacional de Desarrollo -PND | 14 |
| 2.4. Análisis de cumplimiento de metas de la planificación institucional | 30 |
| CAPITULO III SEGUIMIENTO DEL PLAN ANUAL DE INVERSIONES – PAI 2023 | 54 |
| 3.1 Metodología aplicada | 54 |
| 3.2. Estructura y ejecución del Plan Anual de Inversiones – PAI 2023 | 56 |
| 3.3. Análisis por objetivos del Plan Nacional de Desarrollo | 58 |
| 3.4. Alertas de proyectos de inversión | 107 |
| Anexos | 117 |

CAPÍTULO I

1.1. Introducción

Las entidades que reciben recursos del Presupuesto General del Estado (PGE), en el ámbito de sus competencias, identifican y establecen la programación de su planificación institucional a corto y mediano plazo, lo cual orienta la toma de decisiones y el curso de acción encaminado a la generación y provisión de productos (bienes y/o servicios) que benefician a la ciudadanía. Al formular la planificación, las entidades programan las metas a alcanzar en el marco de los objetivos de la Planificación Institucional y que contribuyen al Plan Nacional de Desarrollo.

En este contexto, mediante oficio Nro. SNP-SNP-2023-0493-OF de 29 de septiembre de 2023, se informó a las entidades la apertura del Módulo de Seguimiento a la Planificación Institucional del Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública -SIPeIP, para la ejecución del proceso de seguimiento a los planes institucionales (nivel estratégico) y el avance físico de los estudios, programas y proyectos de inversión que conforman el Plan Anual de Inversiones (PAI) con corte al 30 de septiembre de 2023.

El proceso de seguimiento a través de la verificación de los resultados alcanzados mide el cumplimiento de las metas programadas por las entidades, a partir de lo cual es posible identificar desviaciones y generar alertas para la toma de acciones correctivas.

El presente informe sustenta su análisis sobre la base de la información que reportan las entidades que reciben recursos del Presupuesto General del Estado, relacionado con la programación de metas y resultados de los objetivos de sus planes institucionales, así como, de los estudios, programas y proyectos de inversión. Los componentes analizados en el presente informe son: i) Seguimiento a planes institucionales (PI); y, ii) Seguimiento del Plan Anual de Inversiones, correspondiente al periodo comprendido entre enero a septiembre del ejercicio fiscal 2023, que se financia con recursos del gasto permanente y gasto no permanente.

1.2. Marco Legal

Constitución de la República del Ecuador- 2008

Artículo 280.- *“El Plan Nacional de Desarrollo es el instrumento al que se sujetarán las políticas, programas y proyectos públicos; la programación y ejecución del presupuesto del Estado; y la inversión y la asignación de los recursos públicos; y coordinar las competencias exclusivas entre el Estado central y los gobiernos autónomos descentralizados. Su observancia será de carácter obligatorio para el sector público e indicativo para los demás sectores.”*

Artículo 297.- *“Todo programa financiado con recursos públicos tendrá objetivos, metas y un plazo predeterminado para ser evaluado, en el marco de lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo.*

Las instituciones y entidades que reciban o transfieran bienes o recursos públicos se someterán a las normas que las regulan y a los principios y procedimientos de transparencia, rendición de cuentas y control público.”

Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas

Artículo 34.- *“Plan Nacional de Desarrollo. - El Plan Nacional de Desarrollo es la máxima directriz política y administrativa para el diseño y aplicación de la política pública y todos los instrumentos, dentro del ámbito definido en este código. Su observancia es obligatoria para el sector público e indicativa para los demás sectores”.*

Artículo 54.- *“Planes institucionales. - Las instituciones sujetas al ámbito de este código, excluyendo los Gobiernos Autónomos Descentralizados, reportarán al ente rector de la planificación nacional sus instrumentos de planificación institucionales, para verificar que las propuestas de acciones, programas y proyectos correspondan a las competencias institucionales y los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo.*

El ente rector de la planificación nacional definirá el instrumento de reporte. Mediante normativa técnica se establecerán las metodologías, procedimientos, plazos e instrumentos necesarios, que serán de obligatorio cumplimiento.”

Artículo 60.- *“Priorización de programas y proyectos de inversión. - Serán prioritarios los programas y proyectos de inversión que el ente rector de la planificación nacional incluya en el plan anual de inversiones del Presupuesto General del Estado, con sujeción al Plan Nacional de Desarrollo. El Plan Anual de Inversiones garantizará el cumplimiento de las reglas fiscales determinadas en este Código, y deberá respetar los techos institucionales y de gasto definidos por el ente rector de las finanzas públicas, de conformidad con este Código y los requisitos y procedimientos que se establezcan en el reglamento al mismo...”*

2. Para el caso de universidades y escuelas politécnicas, por parte de su máxima autoridad; ...”

Artículo (...). *“Programas de preservación de capital del Presupuesto General del Estado. - Se entenderá como programa de preservación de capital el que preserve o aumente la riqueza, el patrimonio o la capacidad financiera del Estado.”*

Artículo 77. – *“Presupuesto General del Estado. - El Presupuesto General del Estado es el instrumento para la determinación y gestión de los ingresos y egresos de todas las entidades que constituyen las diferentes funciones del Estado. No se consideran parte del Presupuesto General del Estado, los ingresos y egresos pertenecientes a la Seguridad Social, la banca pública, las empresas públicas y los gobiernos autónomos descentralizados.”*

Artículo 119.- *“Contenido y finalidad. - Fase del ciclo presupuestario que comprende la medición de los resultados físicos y financieros obtenidos y los efectos producidos, el análisis de las variaciones observadas, con la determinación de sus causas y la recomendación de medidas correctivas.*

La evaluación física y financiera de la ejecución de los presupuestos de las entidades contempladas en el presente código, será responsabilidad del titular de cada entidad u organismo y se realizará en forma periódica. Los informes de evaluación serán remitidos al ente rector de las finanzas públicas en coordinación con el ente rector de la planificación nacional y difundidos a la ciudadanía.

El ministro a cargo de finanzas públicas efectuará la evaluación financiera global trimestral del Presupuesto General del Estado y la pondrá en conocimiento del Presidente o Presidenta de la República y de la Asamblea Nacional en el plazo de 45 días de terminado cada trimestre.”

Reglamento al Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas

Artículo 40.- *“Sistema integrado de Planificación e Inversión Pública. - Es la herramienta tecnológica puesta a disposición por parte del ente rector de la planificación, que permitirá realizar transacciones en medios digitales. Las solicitudes realizadas con las claves otorgadas para el uso de dicho sistema y los pronunciamientos emitidos a través del mismo son válidas y tendrán el mismo efecto legal que si se hubieran realizado mediante petición escrita mediante firma ológrafa. Cada una de las entidades deberá mantener debidamente archivados todos los documentos de soporte y serán responsables administrativa, civil y penalmente por las solicitudes realizadas con base en formación imprecisa o falsa suministrada a través del sistema”*

Artículo 59.- *“Del seguimiento a la planificación institucional. - La planificación institucional incluirá indicadores de resultado, cuyo seguimiento estará a cargo de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, en coordinación con los entes competentes. Las entidades del sector público deberán remitir de manera oportuna la información sobre el cumplimiento de su planificación.”*

Norma Técnica del Sistema Nacional de Planificación Participativa

Artículo 46.- *“Seguimiento a los planes institucionales. - El seguimiento a los planes institucionales de las entidades del sector público previstas en la Constitución de la República, excepto los Gobiernos Autónomos Descentralizados, se hará de acuerdo a las guías metodológicas, directrices y lineamientos que emita el ente rector de la planificación nacional”.*

Artículo 47.- *“Alcance del seguimiento a los planes institucionales. - El seguimiento a la Planificación Institucional se enfocará en la planificación del nivel estratégico de las entidades del sector público previstas en la presente norma”.*

Artículo 102.- *“Seguimiento a la Inversión. - El seguimiento a los estudios, programas y proyectos de inversión que forman parte del Plan Anual de Inversiones se lo realizará de manera trimestral por parte del ente rector de la planificación nacional”.*

Artículo 104.- *“Metodología. - El ente rector de la planificación establecerá los respectivos lineamientos metodológicos para el seguimiento a los estudios, programas y proyectos de inversión pública”.*

Resolución No. 002-2021-CNP del 20 de septiembre de 2021

El Consejo Nacional de Planificación mediante Resolución Nro. 002-2021-CNP de 20 de septiembre de 2021, artículo 1.- *“Dar por conocido y aprobar el Plan Nacional de Desarrollo 2021 - 2025, en su integridad y contenidos.”*

Resolución No. 002-2022-CNP del 5 de octubre de 2022

El Consejo Nacional de Planificación dispone en su artículo 1 la incorporación de 3 nuevas metas y una Política al PND 2021-2025, dentro del Eje de Seguridad Integral, Objetivo 10.

1.3. Objetivo


Analizar el avance de la planificación institucional con base a las metas establecidas en los objetivos institucionales y estudios, programas y proyectos de inversión que conforman el Plan Anual de Inversiones - PAI 2023, a la alineación a los Objetivos del Plan Nacional de Desarrollo denominado

“Plan de Creación de Oportunidades 2021-2025” y su correlación con la ejecución presupuestaria, a fin de exponer alertas que permitan la toma de decisiones en mejora de la gestión.

1.4. Plan de Creación de Oportunidades 2021-2025

El *Plan de Creación de Oportunidades 2021-2025*, se encuentra estructurado por 5 ejes y 16 objetivos, los cuales se detallan a continuación:

Gráfico 1. Ejes y Objetivos del Plan de Creación de Oportunidades 2021 – 2025

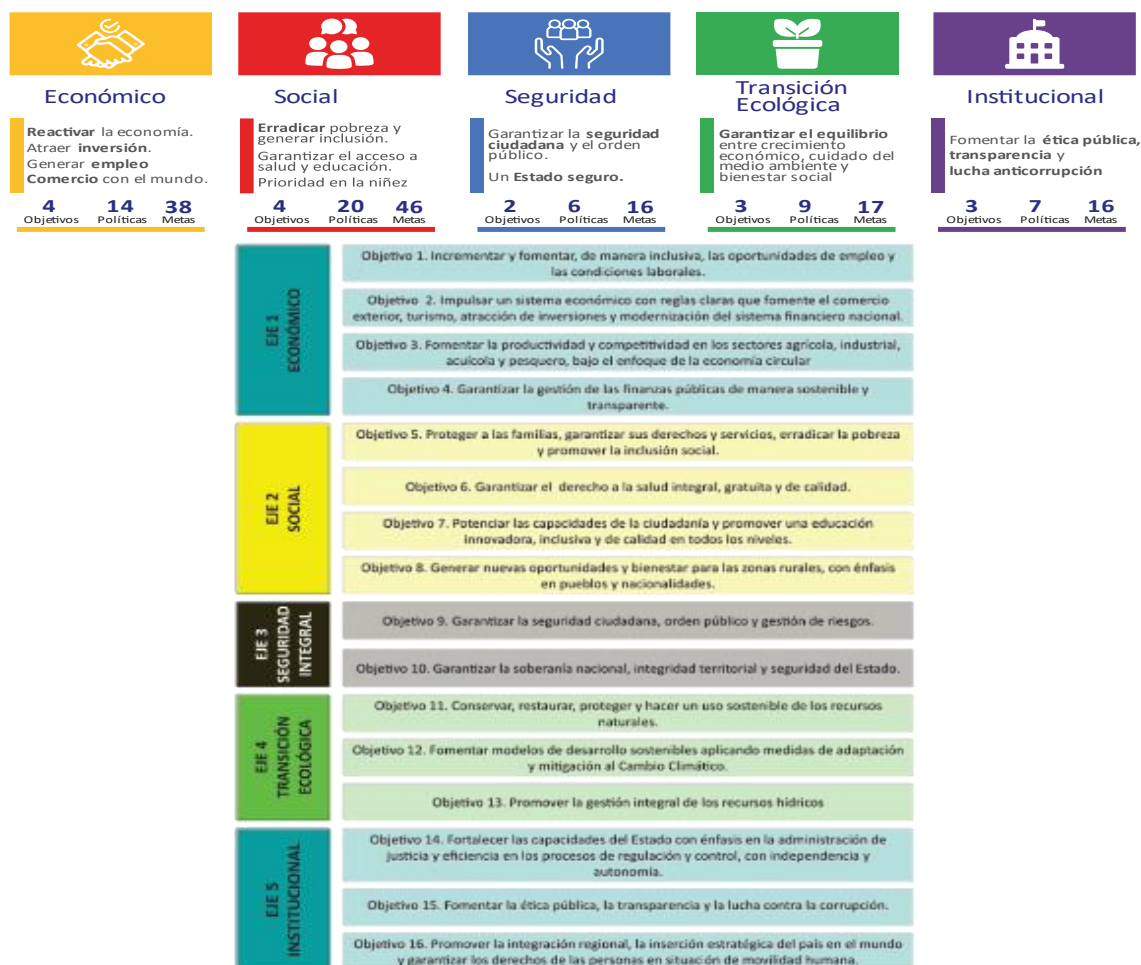

Fuente: Plan Nacional de Desarrollo Creación de Oportunidades 2021-2025 - Secretaría Nacional de Planificación

1.5. Estructura de componentes presupuestarios del PGE

El Presupuesto General del Estado (PGE) aprobado para el año 2023, corresponde a USD 31.502,87 millones¹ por concepto de asignado inicial. Al 30 de septiembre de 2023 se registra un monto codificado de USD 32.492,66 millones y un devengado de USD 20.708,91 millones, que corresponde al 63,73% de ejecución presupuestaria; sin embargo, para el presente informe correspondiente al tercer trimestre 2023, se consideran los siguientes componentes presupuestarios del PGE:

¹ Presupuesto General del Estado considerando el Tesoro Nacional.

**Tabla 1. Componentes presupuestarios del PGE
 (millones de dólares)**

| Componente | Detalle | Codificado | Devengado |
|---------------------------------|--|------------------|------------------|
| Planes Institucionales - PI | Gasto corriente ² | 14.355,17 | 9.687,66 |
| | Gasto de capital ³ | 670,91 | 32,37 |
| | Aplicación del financiamiento ⁴ | 418,73 | 229,49 |
| Subtotal PI | | 15.444,81 | 9.949,52 |
| Plan Anual de Inversiones - PAI | Gasto de inversión - PAI ⁵ | 6.876,99 | 3.764,26 |
| Subtotal PAI | | 6.876,99 | 3.764,26 |
| Total | | 22.321,80 | 13.713,78 |

Fuente: Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF – Ministerio de Economía y Finanzas – Ejecución Presupuestaria consolidada. corte 30 de septiembre de 2023. y Montos informe PGE PI -PAI, al 30 de septiembre de 2023 – Secretaría Nacional de Planificación.

Los planes institucionales sustentan su vinculación con el PGE a través de la alineación de los programas presupuestarios a los objetivos institucionales, financiados con recursos de gasto corriente, aplicación del financiamiento y gasto de capital no atado a proyectos; mientras que el Plan Anual de Inversiones tiene correlación con el gasto de inversión. En este sentido, el monto total que se presenta en el informe con corte al 30 de septiembre de 2023, contempla el presupuesto codificado de USD 22.321,80 millones y devengado de USD 13.713,78 millones de 157 entidades que forman parte del PGE, de las cuales 107 entidades están incluidas en el Plan Anual de Inversiones - PAI 2023.

1.6. Estructura de componentes presupuestarios del PGE por ejes del PND 2021-2025

En el gráfico Nro. 2, se detalla el presupuesto de los planes institucionales articulados por eje del Plan Nacional de Desarrollo, se observa que el Eje Social tiene un monto codificado anual, por un valor de USD 5.594,63 millones, seguido por el Eje Seguridad con un valor de USD 2.984,34 millones y el Eje de Institucional con USD 2.892,12 millones. El Eje Económico cuenta con USD 118,54 millones y el de Transición Ecológica con USD 27,12 millones.

En cuanto a la ejecución presupuestaria, se observa que, el Eje de Seguridad con 70,36% presenta el mayor porcentaje, seguido del Eje Económico con 69,80%; mientras que el Eje de menor ejecución es el Institucional con el 58,54%.


² Grupos de Gasto 51, 53, 56, 57 y 58 excluyendo Tesoro Nacional.

³ Grupo 84 gasto de capital no atado a proyectos.

⁴ Grupos de Gasto 96, 97 y 99 atado a gasto corriente excluyendo Tesoro Nacional.

⁵ Se incluye el Grupo 96 (Amortización de Deuda Pública), del "Programa de preservación de capital, periodo 2023", cuya entidad responsable es el Ministerio de Economía y Finanzas. El presupuesto codificado y devengado del programa, al 30 de septiembre de 2023, es de USD 4.600,27 millones y USD 2.990,46 millones; respectivamente.

**Gráfico 2. Presupuesto - Planes institucionales – PI alineados a los ejes del PND
(en millones de dólares)**

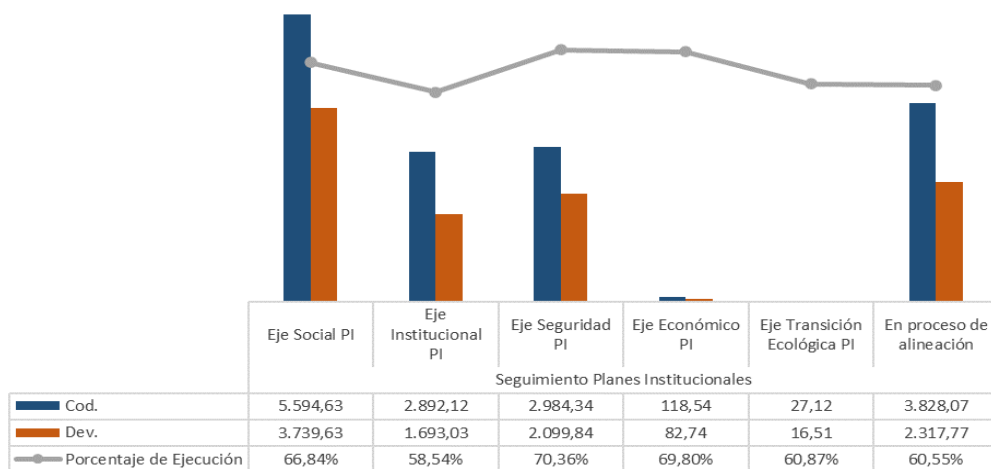


Nota: La categoría “En proceso de alineación”, corresponde al presupuesto de las entidades que se encuentran gestionando la aprobación de planes institucionales y su sistematización respecto a las alineaciones a los objetivos del PND 2021-2025. En esta misma categoría se incluyen las unidades administrativas financieras de otras entidades que por su estructura orgánica no están sujetas a presentar sus planes institucionales.

Fuente: Módulo Seguimiento del Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública (SIPeIP) - Submódulo de Seguimiento a planes institucionales, Secretaría Nacional de Planificación, corte al 30 de septiembre de 2023. Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF, Ministerio de Economía y Finanzas – Ejecución Presupuestaria, corte al 30 de septiembre de 2023.

Conforme al gráfico Nro. 3, de acuerdo con la alineación de los estudios, programas y proyectos de inversión realizada por las entidades, se observa que el Eje Económico tiene un monto codificado por un valor de USD 5.046,55 millones, seguido por el Eje Social con un valor de USD 886,87 millones. De la misma forma, el Eje Institucional con USD 504,21 millones, el Eje de Seguridad USD 336,70 millones y el Eje Transición Ecológica con USD 102,65 millones.

**Gráfico 3. Presupuesto de estudios, programas y proyectos de inversión – Plan Anual de Inversiones – PAI
(en millones de dólares)**

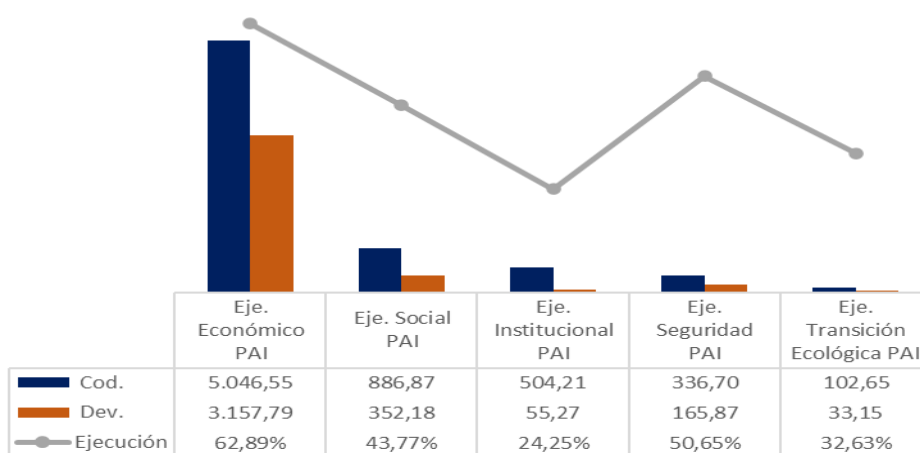

Nota: Se incluye grupo de gasto 96 (Amortización de la Deuda Pública), del “Programa de preservación de capital periodo 2023”, cuya entidad responsable es el Ministerio de Economía y Finanzas. El presupuesto codificado del programa, al 30 de septiembre de 2023, es de USD 4.600,27 millones (que incluye el codificado de la Procuraduría General del Estado USD 38,72 millones, deuda pública USD 4.421,13 millones e ingresos y transferencias USD 140,42 millones) y su devengado es USD 2.990,46 millones.

Fuente: Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF, Ministerio de Economía y Finanzas - Ejecución Presupuestaria. corte al 30 de septiembre de 2023.

CAPÍTULO II

SEGUIMIENTO A PLANES INSTITUCIONALES – PI

2.1. Metodología aplicada

El proceso de seguimiento a planes institucionales se sustenta en el Acuerdo Nro. SNP-SNP-2023-0028-A de 28 de marzo de 2023, en el que se emite la “*Metodología de Seguimiento a Planes Institucionales*”, la cual es de cumplimiento obligatorio para todas las entidades del sector público, conforme el artículo 54 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas. Se recalca que esta metodología permite efectuar un análisis homologado a los reportes de resultados que generan las herramientas tecnológicas, (Herramienta de Gobierno Por Resultados - GPR y Submódulo de Seguimiento a Planes Institucionales - SIPeIP), los mismos que son administrados por la Secretaría Nacional de Planificación, siendo la base para la elaboración del presente informe.

El seguimiento se aplica a las entidades que cuentan con la validación, aprobación, registro y sistematización de los planes institucionales (*Directrices para el proceso de sistematización de los Planes Institucionales GPR y SIPeIP*, emitidas mediante Oficios: Nro. SNP-SNP-2023-0109-OF, Nro. SNP-SNP-0110-OF y Nro. SNP-SNP-2023-0111-OF de 13 de febrero 2023), con programación de metas en el tercer trimestre y que reportan el resultado de su gestión en las herramientas tecnológicas administradas por la Secretaría Nacional de Planificación.

En este sentido, se generan los insumos necesarios para la consolidación de los resultados registrados por las entidades, correspondiente al tercer trimestre 2023, a fin de realizar el análisis y retroalimentación del accionar de la gestión institucional. Para las entidades que gestionan su planificación institucional en la Herramienta de Gobierno Por Resultados (GPR) y en el Submódulo de Seguimiento a planes institucionales, la información se tomó el **16 de octubre de 2023**.

Consolidación de la información

Para la consolidación de la información del seguimiento a planes institucionales, se consideraron los resultados alcanzados en los indicadores del nivel estratégico, reportados en las siguientes herramientas:

- SIPeIP: Módulo de Seguimiento a la Planificación Institucional -Submódulo de Seguimiento a Planes Institucionales.
- GPR: Herramienta de Gobierno Por Resultados.

Adicionalmente, se contemplan todos los elementos sistematizados en la fase de programación correspondiente al año 2023, siendo estos:

- Alineaciones de los objetivos institucionales con los elementos del Plan Nacional de Desarrollo, (eje, objetivo, política, meta).
- Indicadores de los objetivos institucionales con sus características (patrón del indicador, unidad de medida, línea base, meta anual).
- Programación de metas de los indicadores registrados, de acuerdo con su periodicidad, para cada objetivo institucional en la fase de programación.
- Alineaciones de los programas presupuestarios a los objetivos institucionales.

Asimismo, se utilizó la agrupación de entidades de acuerdo con los gabinetes sectoriales establecidos en el Decreto Ejecutivo Nro. 536 de 16 de agosto de 2022. En caso de que una entidad integre dos o más gabinetes sectoriales y preside uno de estos, se consideró únicamente al gabinete sectorial que preside. En cuanto a las entidades adscritas, se incluyeron en el gabinete sectorial de la entidad rectora.

Aquellas entidades que no forman parte de un gabinete sectorial fueron agrupadas en la categoría “Sin Gabinete”.

Tendencia y Comportamiento de los indicadores para el análisis de resultados

Para el proceso de análisis de avance de las metas programadas por las entidades, se consideró la tendencia de los indicadores (ascendente, descendente y sin tendencia) y el comportamiento (discretos o continuos).

La tendencia de los indicadores puede ser: ascendente, descendente y sin tendencia.

- Ascendente: a medida que aumenta la variable independiente (tiempo) también aumenta la variable dependiente (valor del indicador).
- Descendente: a medida que aumenta la variable independiente (tiempo) disminuye la variable dependiente (valor del indicador).
- Sin tendencia: aquel que no se puede identificar si es ascendente o descendente, dado que cambia o se mantiene, en cada uno de los periodos analizados.

Por otra parte, el comportamiento de los indicadores se categoriza en:

- Discreto: muestra el valor del indicador de cada periodo independientemente del periodo anterior o posterior.
- Continuo: muestra el valor del indicador de manera acumulada desde el inicio de su medición de acuerdo a su periodicidad. Cabe indicar que, al existir indicadores continuos fraccionales, configurados en la herramienta de GPR, se ha establecido el siguiente esquema para su análisis:
 - ✓ Indicadores con numeradores ascendentes o descendentes y denominador constante, se considera el último dato reportado.
 - ✓ Indicadores con numeradores distintos o sin una tendencia clara y denominador constante, se considera la suma de numeradores y el denominador constante.
 - ✓ Indicadores con numeradores y denominadores distintos, se considera la suma de todos los numeradores dividido para la suma de todos los denominadores.

Para efectos de este informe los indicadores de tipo discreto, con periodicidad mensual serán tomados como 9 (nueve) resultados independientes (enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre). Para indicadores de tipo continuo, con periodicidad mensual se considera un resultado acumulado (septiembre).

Para indicadores de tipo continuo con periodicidad trimestral se considera un resultado acumulado (septiembre). Para indicadores de tipo discreto con periodicidad trimestral se considera tres resultados independientes, uno por cada trimestre (marzo, junio y septiembre).

Porcentaje de cumplimiento de metas y umbrales de valoración

Para determinar el porcentaje de cumplimiento de la meta, se utiliza la siguiente fórmula:

$$\text{Porcentaje de cumplimiento meta} = \frac{\text{Resultado}}{\text{Meta}} \times 100$$

Posteriormente, una vez obtenido el porcentaje de cumplimiento de meta, se aplican los umbrales de valoración, logrando determinar la semaforización de cada uno de los periodos analizados.

Respecto a los umbrales de valoración que se utilizan, a fin de que las entidades puedan observar el desempeño de los indicadores estratégicos, a continuación, se establecen las siguientes categorías de análisis:

- Avance esperado: Cuando los avances de los resultados indican que se están cumpliendo con las metas proyectadas (Semáforo verde).
- Avance cercano al esperado: Cuando los resultados han alcanzado un avance parcial, lo que significa que está cercano a cumplir la meta y que se deben hacer mejoras ligeras para un mejor desempeño (Semáforo amarillo).
- Avance menor al esperado: Cuando los resultados se encuentran muy distantes de la meta planificada, por lo que se requiere que las instituciones implementen acciones correctivas para mejorar el desempeño de los indicadores (Semáforo rojo).

Tabla 2 Categorías y Umbrales para indicadores Ascendentes

| Categoría | Umbrales | Descripción |
|----------------------------|------------------|---|
| Avance esperado | ● ≥ 100% | Si el resultado es igual o superior al valor correspondiente a la meta del indicador |
| Avance cercano al esperado | ● ≥ 90% y < 100% | Si el resultado es inferior al valor de la meta y su rango de cumplimiento está entre 90% y 100%. |
| Avance menor al esperado | ● ≥ 0% y < 90% | Si el resultado es inferior al 90% del valor de la meta. |

Fuente: Dirección de Seguimiento a la Planificación y Política Pública – Subsecretaría de Seguimiento

Tabla 3. Categorías y Umbrales para indicadores Descendentes

| Categoría | Umbrales | Descripción |
|----------------------------|-------------------|--|
| Avance esperado | ● ≤ 100% | Si el resultado es igual o inferior al valor correspondiente a la meta del indicador. |
| Avance cercano al esperado | ● > 100% y ≤ 110% | Si el resultado es superior al valor de la meta y su resultado de cumplimiento está entre 100% y 110%. |
| Avance menor al esperado | ● > 110% | Si el resultado es superior al valor de la meta por sobre el 110%. |

Fuente: Dirección de Seguimiento a la Planificación y Política Pública - Subsecretaría de Seguimiento

Tabla 4. Categoría y Umbrales para indicadores Sin Tendencia

| Categoría | Umbrales | Descripción |
|----------------------------|-------------------------------------|---|
| Avance esperado | ● ≥ 99% y ≤ 101% | Si su resultado de cumplimiento está entre 99% y 101% con respecto a la meta programada. |
| Avance cercano al esperado | ● ≥ 95% y < 99% ● >101% y ≤ 105% | Si su resultado de cumplimiento está entre el rango del 95% y el 99% o el rango de 101% y 105%. |
| Avance menor al esperado | ● < 95% y ≥ 0% ● >105% | Si el resultado de cumplimiento es menor al 95% o mayor al 105%. |

Fuente: Dirección de Seguimiento a la Planificación y Política Pública – Subsecretaría de Seguimiento

Adicionalmente, se ha establecido una categorización sin semáforo, que se identifica con color “plomo”, que permite analizar la información de las entidades en los siguientes casos:

Tabla 5. Categoría para indicadores sin semáforo

| Categoría | Descripción |
|--------------|---|
| Sin semáforo | ● <i>Indicadores con programación de metas y sin registró de resultados, hasta la fecha de corte del reporte.</i> |

Fuente: Dirección de Seguimiento a la Planificación y Política Pública – Subsecretaría de Seguimiento

Alineación planificación con el presupuesto

La vinculación entre la planificación institucional y el presupuesto de la entidad se realiza con la alineación de los programas presupuestarios a los objetivos institucionales. Los programas presupuestarios corresponden a las categorías programáticas del Ministerio de Economía y Finanzas - MEF, que proporcionó la base de datos del e-SIGEF, con los presupuestos codificados y devengados de las entidades que son parte del Presupuesto General del Estado -PGE, para el presente ejercicio fiscal, el corte corresponde al 30 de septiembre de 2023.

Con la información proporcionada por el MEF, se consolida la información presupuestaria correspondiente a los Grupos de Gasto 5⁶, 8⁷ y 9⁸ (sin proyecto), excluye el presupuesto que financia los estudios, programas y/o proyectos de inversión, el sectorial Tesoro Nacional (entidades virtuales manejadas por el Ministerio de Economía y Finanzas).


Para establecer el porcentaje de ejecución presupuestaria, se contempla la relación entre el monto devengado y el monto codificado por entidades que conforman los Gabinetes Sectoriales y Sin Gabinete, las cuales se alinean por Objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 2021-2025.

2.2. Ejecución presupuestaria

Dentro del componente seguimiento a planes institucionales, se contempla el presupuesto de 157 entidades que forman parte del PGE, sin considerar el presupuesto de inversión.

En este sentido al 30 de septiembre de 2023, se cuenta con un valor codificado de USD 15.444,81 millones y un devengado de USD 9.949,52 millones, lo que representa una ejecución presupuestaria del 64,42%.

Gráfico 4. Ejecución presupuestaria – componente seguimiento a planes institucionales (millones de dólares)



Fuente: Base de datos e-SIGEF (Sistema Integrado de Gestión Financiera) – Ministerio de Economía y Finanzas - Ejecución Presupuestaria, corte 30 de septiembre de 2023.

De las 157 entidades que son parte del PGE, existen 129 entidades con planes institucionales registrados y aprobados que representan 373 programas presupuestarios articulados a los diferentes objetivos y ejes del PND, con un presupuesto codificado de USD 11.616,73 millones y un

⁶ Corresponde a los grupos de gasto 51 “egresos de personal”, 53 “bienes y servicios de consumo”, 56 “egresos financieros”, 57 “otros egresos corrientes”, 58 “transferencias o donaciones corrientes”.

⁷ Grupo de gasto 84 “egresos de capital” no atado a proyectos.

⁸ Grupo de gasto 96 “amortización de la deuda pública”, 97 “pasivo circulante”, 99 “otros pasivos” no atado a proyectos.

devengado de USD 7.631,75 millones, con corte al tercer trimestre del 2023, conforme se detalla en la siguiente tabla:

**Tabla 6. Presupuesto por ejes y objetivos del Plan Nacional de Desarrollo
 (millones de dólares)**

| Eje | Objetivo PND | Entidades | Programas Presupuestarios | Codificado | Devengado | Ejecución % |
|-------------------------|--------------|-----------|---------------------------|------------------|-----------------|---------------|
| 1. Económico | 1 | 3 | 3 | 4,90 | 3,06 | 62,41% |
| | 2 | 15 | 23 | 57,60 | 39,58 | 68,72% |
| | 3 | 11 | 13 | 22,08 | 14,26 | 64,56% |
| | 4 | 5 | 9 | 33,95 | 25,85 | 76,12% |
| 2. Social | 5 | 12 | 17 | 1.539,53 | 1.138,67 | 73,96% |
| | 6 | 8 | 6 | 55,65 | 44,51 | 79,98% |
| | 7 | 37 | 94 | 2.611,46 | 1.892,64 | 72,47% |
| 3. Seguridad Integral | 8 | 4 | 7 | 1.388,00 | 663,82 | 47,83% |
| | 9 | 12 | 13 | 1.677,64 | 1.204,97 | 71,83% |
| 4. Transición Ecológica | 10 | 4 | 8 | 1.306,69 | 894,87 | 68,48% |
| | 11 | 7 | 6 | 20,21 | 12,51 | 61,92% |
| | 12 | 6 | 3 | 5,72 | 3,15 | 55,12% |
| 5. Institucional | 13 | 1 | 1 | 1,19 | 0,84 | 70,68% |
| | 14 | 129 | 152 | 2.554,82 | 1.475,33 | 57,75% |
| | 15 | 14 | 13 | 285,18 | 178,12 | 62,46% |
| | 16 | 4 | 5 | 52,11 | 39,57 | 75,95% |
| Total | | | 373 | 11.616,73 | 7.631,75 | 65,70% |

Fuente: Secretaría Nacional de Planificación, Módulo Seguimiento a la Planificación Institucional del Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública-SIPeIP-Submódulo de Seguimiento a Planes Institucionales, corte 30 de septiembre de 2023. Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF – Ministerio de Economía y Finanzas - Ejecución Presupuestaria, corte 30 de septiembre de 2023.

La diferencia (28 entidades) se encuentra en la categoría “en proceso de alineación”, que corresponde a 14 entidades en estado de validación, aprobación, registro y sistematización de sus planes, incluye entidades de la academia; 11 con planes registrados y su sistematización en revisión; y, 3 unidades administrativas que por su estructura orgánica no están sujetas a presentar sus planes institucionales. A continuación, se detalla el presupuesto codificado y devengado de aquellas entidades que se encuentran en dicha categoría:

**Tabla 7. Detalle de entidades en proceso de validación, aprobación, registro y sistematización de sus planes
 (millones de dólares)**

| Entidad | Codificado | Devengado | Ejecución % |
|---|---------------|--------------|---------------|
| Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos | 10,19 | 7,91 | 77,70% |
| Instituto de Fomento a la Creatividad y la Innovación | 9,88 | 6,94 | 70,29% |
| Ministerio de Gobierno | 64,96 | 43,33 | 66,70% |
| Consejo Nacional para la Igualdad de Pueblos y Nacionalidades | 0,79 | 0,52 | 66,67% |
| Ministerio del Interior | 24,90 | 14,76 | 59,29% |
| Unidad de Gestión y Regularización | 2,12 | 1,24 | 58,37% |
| Secretaría Nacional de Seguridad Pública y del Estado | 1,51 | 0,87 | 57,48% |
| Unidad Nacional Antidopaje del Ecuador | 0,27 | 0,13 | 49,97% |
| Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada | 13,41 | 4,12 | 30,72% |
| Total | 128,03 | 79,82 | 62,34% |

Fuente: Base de datos e-SIGEF, Ejecución Presupuestaria Consolidada – Ministerio de Economía y Finanzas corte al 30 de septiembre de 2023. Estado de validación de planes institucionales 3er. trimestre 2023 – Secretaría Nacional de Planificación, corte 30 de septiembre de 2023.

**Tabla 8. Detalle de entidades de la academia en proceso de validación, aprobación, registro y sistematización de sus planes
 (millones de dólares)**

| Entidad | Codificado | Devengado | Ejecución % |
|--|------------|-----------|-------------|
| Universidad Técnica Luis Vargas Torres de Esmeraldas | 20,57 | 12,94 | 62,92% |
| Universidad Técnica del Norte | 35,98 | 22,18 | 61,65% |

| Entidad | Codificado | Devengado | Ejecución % |
|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Universidad Central del Ecuador | 147,94 | 89,18 | 60,28% |
| Universidad de las Artes | 14,75 | 8,46 | 57,36% |
| Universidad Agraria del Ecuador | 19,09 | 8,87 | 46,47% |
| Total | 238,33 | 141,63 | 59,43% |

Fuente: Base de datos e-SIGEF, Ejecución Presupuestaria Consolidada – Ministerio de Economía y Finanzas corte al 30 de septiembre de 2023. Estado de validación de planes institucionales 3er. trimestre 2023 – Secretaría Nacional de Planificación, corte 30 de septiembre de 2023.

Tabla 9. Detalle de entidades con planes registrados y sistematización en revisión
(millones de dólares)

| Entidad | Codificado | Devengado | Ejecución % |
|--|-----------------|-----------------|---------------|
| Centro Interamericano de Artesanías y Artes Populares | 0,47 | 0,33 | 69,80% |
| Ministerio del Ambiente Agua y Transición Ecológica * | 34,27 | 23,82 | 69,52% |
| Instituto Superior Tecnológico de Artes del Ecuador | 0,40 | 0,27 | 67,44% |
| Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología * | 2,13 | 1,47 | 68,76% |
| Secretaría de Inversiones Público - Privadas | 1,40 | 0,92 | 65,93% |
| Ministerio de Salud Pública * | 3.264,52 | 1.983,49 | 60,76% |
| Universidad Técnica de Machala | 32,99 | 19,90 | 60,32% |
| Secretaría de Gestión y Desarrollo de Pueblos y Nacionalidades | 2,93 | 1,75 | 59,56% |
| Misión F.A.O. en el Ecuador | 0,04 | 0,02 | 56,57% |
| Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública Dr. Leopoldo Izquieta Pérez (1) | 10,25 | 5,64 | 54,97% |
| Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos (1) | 13,55 | 6,59 | 48,60% |
| Total | 3.362,95 | 2.044,20 | 60,79% |

Nota: * Entidad que gestionan su planificación en la herramienta GPR y no culmina el proceso de sistematización a pesar de tener su Plan Institucional registrado.

Fuente: Base de datos e-SIGEF, Ejecución Presupuestaria Consolidada – Ministerio de Economía y Finanzas; y, el estado de validación de planes institucionales 3er. trimestre 2023 – Secretaría Nacional de Planificación, con corte 30 de septiembre de 2023.

Tabla 10. Detalle de unidades administrativas de otras entidades
(millones de dólares)

| Entidad | Codificado | Devengado | Ejecución % |
|--|--------------|--------------|---------------|
| Dirección Nacional de la Policía Judicial | 6,71 | 4,47 | 66,66% |
| Dirección Nacional de Salud de la Policía Nacional | 34,23 | 18,97 | 55,41% |
| Hospital de Especialidades Fuerzas Armadas No. 1 | 57,85 | 28,68 | 49,58% |
| Total | 98,78 | 52,11 | 52,76% |

Fuente: Base de datos e-SIGEF, Ejecución Presupuestaria Consolidada – Ministerio de Economía y Finanzas corte al 30 de septiembre de 2023. Estado de validación de planes institucionales 3er. trimestre 2023 – Secretaría Nacional de Planificación, corte 30 de septiembre de 2023.

2.3. Ejecución presupuestaria por objetivo del Plan Nacional de Desarrollo -PND

Objetivo 1: Incrementar y fomentar, de manera inclusiva, las oportunidades de empleo y las condiciones laborales

Este objetivo se enfoca en la generación de empleo con la existencia de una economía de libre mercado con tres fundamentos importantes que son: 1) sistema de precios, 2) competencia y, 3) defensa de la propiedad privada. Esta es la mejor forma de crear oportunidades para todos y mejorar la calidad de vida de los ecuatorianos, considerando las diversidades de género, intergeneracional, pueblos y nacionalidades y grupos de atención prioritaria.

A este objetivo se encuentran alineadas 3 entidades a través de 3 programas presupuestarios, con un presupuesto codificado de USD 4,90 millones y un monto devengado de USD 3,06 millones, lo que representa una ejecución presupuestaria del 62,41%. A continuación, se detalla la ejecución presupuestaria correspondiente al tercer trimestre por institución:

**Tabla 11. Ejecución presupuestaria de las entidades alineadas al objetivo 1
(millones de dólares)**

| Gabinete Sectorial | Entidad | Programa | Codificado | Devengado | Ejecución % |
|------------------------|--|----------|-------------|-------------|---------------|
| Desarrollo del Talento | Ministerio del Trabajo | 55 | 1,03 | 0,73 | 70,88% |
| | Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión | 79 | 3,50 | 2,14 | 61,13% |
| | Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional | 81 | 0,37 | 0,19 | 50,79% |
| TOTAL | | | 4,90 | 3,06 | 62,41% |

Fuente: Secretaría Nacional de Planificación, Módulo Seguimiento a la Planificación Institucional del SIPeIP-Submódulo de planes institucionales corte 30 de septiembre de 2023. Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF – Ministerio de Economía y Finanzas - Ejecución Presupuestaria, se excluye el sectorial Tesoro Nacional, que son entidades virtuales manejadas por MEF, corte 30 de septiembre de 2023.

Elaborado: Dirección de Seguimiento a la Planificación y Política Pública.

Objetivo 2: Impulsar un sistema económico con reglas claras que fomente el comercio exterior, turismo, atracción de inversiones y modernización del sistema financiero nacional

Este objetivo se enfoca en incrementar el nivel de bienestar de las personas, considerando los recursos naturales como punto de partida conjugada con habilidades profundas (especialización del comercio exterior, turismo, inversiones y financiero), mejor tecnología y aprovechamiento de las economías a escala, dando como resultado efectos positivos que cuentan con aumentos de la productividad, competitividad e innovación, reducción de precios y costos de producción, una mayor optimización de los recursos; y, mejoras en el bienestar y calidad de vida.

A este objetivo se encuentran alineados 13 entidades a través de 23 programas presupuestarios, con un presupuesto codificado de USD 57,60 millones y un monto devengado de USD 39,58 millones lo que representa una ejecución presupuestaria del 68,72%. A continuación, se detalla la ejecución presupuestaria correspondiente al tercer trimestre por institución:

**Tabla 12. Ejecución presupuestaria de las entidades alineadas al objetivo 2
(millones de dólares)**

| Gabinete Sectorial | Entidad | Programa | Codificado | Devengado | Ejecución % |
|---|--|----------|------------|-----------|-------------|
| Desarrollo Productivo | Ministerio de Turismo | 55 | 0,03 | 0,02 | 77,28% |
| | | 56 | 0,12 | 0,08 | 68,01% |
| | Ministerio de Producción Comercio Exterior Inversiones y Pesca | 55 | 0,43 | 0,32 | 72,91% |
| | | 78 | 2,57 | 1,97 | 76,83% |
| | | 89 | 6,14 | 4,24 | 69,04% |
| Servicio de Acreditación Ecuatoriano | 55 | 1,03 | 0,74 | 72,00% | |
| Sin Gabinete | Superintendencia de Economía Popular Solidaria | 55 | 9,40 | 6,79 | 72,18% |
| | Superintendencia de Compañías Valores y Seguros | 55 | 10,73 | 7,61 | 70,93% |
| Desarrollo de Inversiones | Ministerio de Transporte y Obras Públicas* | 58 | 0,12 | 0,09 | 71,96% |
| | | 57 | 2,31 | 1,64 | 70,99% |
| | | 56 | 3,22 | 2,28 | 70,86% |
| | | 24 | - | - | |
| | | 25 | - | - | |
| | | 59 | - | - | |
| | | 97 | - | - | |
| | Instituto de Investigación Geológico y Energético | 86 | 1,69 | 1,14 | 67,40% |
| | Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar | 77 | 3,86 | 2,51 | 64,87% |
| | Autoridad Portuaria de Esmeraldas | 77 | 3,19 | 2,00 | 62,90% |
| | Autoridad Portuaria de Guayaquil | 77 | - | - | |
| Servicio Nacional de Derechos Intelectuales | 55 | 2,77 | 1,88 | 67,93% | |

| Gabinete Sectorial | Entidad | Programa | Codificado | Devengado | Ejecución % |
|------------------------|--|----------|--------------|--------------|---------------|
| Desarrollo del Talento | Ministerio de Cultura y Patrimonio | 80 | 8,26 | 5,54 | 67,02% |
| | | 79 | 1,50 | 0,64 | 42,26% |
| Seguridad | Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana | 65 | 0,22 | 0,10 | 45,13% |
| Total | | | 57,60 | 39,58 | 68,72% |

Nota: * (-) Entidad con programas presupuestarios alineados al Objetivo del PND, sin presupuesto de gasto corriente, aplicación del financiamiento y gasto de capital no atado a proyectos que son parte de la estructura programática.

Fuente: Secretaría Nacional de Planificación, Módulo Seguimiento a la Planificación Institucional del SIPeIP-Submódulo de planes institucionales corte 30 de septiembre de 2023. Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF – Ministerio de Economía y Finanzas - Ejecución Presupuestaria, se excluye el sectorial Tesoro Nacional, que son entidades virtuales manejadas por MEF, corte 30 de septiembre de 2023.

Elaborado: Dirección de Seguimiento a la Planificación y Política Pública.

Objetivo 3: Fomentar la productividad y competitividad en los sectores agrícola, industrial, acuícola y pesquero, bajo el enfoque de la economía circular

Este objetivo se enfoca en la dinámica productiva que incluye actividades económicas a nivel agrícola, acuícola, pesquero y de infraestructura, con un esquema que brinde igualdad de oportunidades para todos, para ello se impulsarán modelos de asociatividad productiva y comercial para mejorar las ganancias de los productores, incrementar la tecnificación, crear oportunidades y promover el progreso económico de estos sectores.

A este objetivo se encuentran alineadas 12 entidades a través de 13 programas presupuestarios, con un presupuesto codificado de USD 22,08 millones y un monto devengado de USD 14,26 millones, lo que representa una ejecución presupuestaria del 64,56%. A continuación, se detalla la ejecución presupuestaria correspondiente al tercer trimestre por institución:

Tabla 13. Ejecución presupuestaria de las entidades alineadas al objetivo 3
(millones de dólares)

| Gabinete Sectorial | Entidad | Programa | Codificado | Devengado | Ejecución % |
|---------------------------|---|----------|--------------|--------------|---------------|
| Desarrollo Productivo | Ministerio de Producción Comercio Exterior Inversiones y Pesca | 91 | 9,52 | 7,04 | 74,03% |
| | | 90 | 3,03 | 2,20 | 72,47% |
| | Agencia de Regulación y Control Fito y Zoonosanitario | 55 | 2,27 | 1,29 | 56,97% |
| | Ministerio de Agricultura y Ganadería | 56 | 0,03 | 0,02 | 56,80% |
| | Instituto Ecuatoriano de Normalización | 55 | 2,28 | 1,24 | 54,13% |
| | Ministerio de Agricultura y Ganadería | 57 | 1,43 | 0,24 | 16,70% |
| | Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarias* | 86 | - | - | - |
| Sin Gabinete | Conferencia Plurinacional e Intercultural de Soberanía Alimentaria | 55 | 0,56 | 0,41 | 72,31% |
| | Universidad Técnica de Manabí | 84 | 0,01 | 0,00 | 0,00% |
| Económico y Financiero | Servicio Nacional de Contratación Pública, SERCOP | 57 | 0,87 | 0,63 | 71,58% |
| Desarrollo Territorial | Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información | 57 | 0,64 | 0,44 | 69,49% |
| Desarrollo de Inversiones | Autoridad Portuaria de Manta | 77 | 1,43 | 0,75 | 52,32% |
| Desarrollo Social | Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria* | 55 | - | - | - |
| Total | | | 22,08 | 14,26 | 64,56% |

Nota: * (-) Entidad con programas presupuestarios alineados al Objetivo del PND, sin presupuesto de gasto corriente, aplicación del financiamiento y gasto de capital no atado a proyectos que son parte de la estructura programática.

Fuente: Secretaría Nacional de Planificación, Módulo Seguimiento a la Planificación Institucional del SIPeIP-Submódulo de planes institucionales corte 30 de septiembre de 2023. Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF – Ministerio de Economía y Finanzas - Ejecución Presupuestaria, se excluye el sectorial Tesoro Nacional, que son entidades virtuales manejadas por MEF, corte 30 de septiembre de 2023.

Elaborado: Dirección de Seguimiento a la Planificación y Política Pública

Objetivo 4: Garantizar la gestión de las finanzas públicas de manera sostenible y transparente

Este objetivo se enfoca en las decisiones políticas, teniendo en cuenta que el sector público funciona como el sector privado bajo condiciones de escasez e incertidumbre, los políticos ofrecen medios para enfrentar esta escasez distribuyendo el ingreso y la riqueza con el afán de promover el bienestar en general, fundamentándose en la implementación de una política de gasto público que priorice la inversión en capital humano, educación, salud e infraestructura y que sea sostenible en el largo plazo.

A este objetivo se encuentran alineadas 6 entidades a través de 9 programas presupuestarios, con un presupuesto codificado de USD 33,95 millones y un monto devengado de USD 25,85 millones lo que representa una ejecución presupuestaria del 76,12%. A continuación, se detalla la ejecución presupuestaria correspondiente al tercer trimestre por institución:

**Tabla 14. Ejecución presupuestaria de las entidades alineadas al objetivo 4
 (millones de dólares)**

| Gabinete Sectorial | Entidad | Programa | Codificado | Devengado | Ejecución % |
|------------------------|---|----------|--------------|--------------|---------------|
| Sin Gabinete | Superintendencia de Bancos | 20 | 0,02 | 0,02 | 100,00% |
| | Corporación del Seguro de Depósitos | 55 | 0,04 | 0,03 | 83,57% |
| | Superintendencia de Bancos | 55 | 10,25 | 6,88 | 67,08% |
| Económico y Financiero | Ministerio de Economía y Finanzas* | 56 | 20,43 | 17,22 | 84,29% |
| | | 75 | 1,09 | 0,73 | 67,28% |
| | | 55 | - | - | - |
| | Servicio Nacional de Aduana del Ecuador | 55 | 0,85 | 0,66 | 78,49% |
| | | 56 | 1,27 | 0,30 | 23,23% |
| | | 55 | - | - | - |
| Total | | | 33,95 | 25,85 | 76,12% |

Nota: * (-) Entidad con programas presupuestarios alineados al Objetivo del PND, sin presupuesto de gasto corriente, aplicación del financiamiento y gasto de capital no atado a proyectos que son parte de la estructura programática.

Fuente: Secretaría Nacional de Planificación, Módulo Seguimiento a la Planificación Institucional del SIPeIP-Submódulo de planes institucionales corte 30 de septiembre de 2023. Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF – Ministerio de Economía y Finanzas - Ejecución Presupuestaria, se excluye el sectorial Tesoro Nacional, que son entidades virtuales manejadas por MEF, corte 30 de septiembre de 2023.

Elaborado: Dirección de Seguimiento a la Planificación y Política Pública.

Objetivo 5: Proteger a las familias, garantizar sus derechos y servicios, erradicar la pobreza y promover la inclusión social

Este objetivo se enfoca en la protección de las familias, la erradicación de la pobreza y la garantía sin discriminación de los derechos consagrados en la Constitución de la República de Ecuador; priorizando la creación de oportunidades para una sociedad más justa que respete la dignidad de las personas y haga frente a las condiciones de pobreza y violencia, siendo la seguridad social un derecho irrenunciable de todas las personas y cuya garantía es un deber del Estado.

A este objetivo se encuentran alineadas 9 entidades a través de 17 programas presupuestarios, con un presupuesto codificado de USD 1.539,53 millones y un monto devengado de USD 1.138,67 millones, lo que representa una ejecución presupuestaria del 73,96%. A continuación, se detalla la ejecución presupuestaria correspondiente al tercer trimestre por institución:

**Tabla 15. Ejecución presupuestaria de las entidades alineadas al objetivo 5
(millones de dólares)**

| Gabinete Sectorial | Entidad | Programa | Codificado | Devengado | Ejecución % |
|------------------------|--|----------|-----------------|-----------------|---------------|
| Desarrollo Social | Ministerio de Inclusión Económica y Social | 57 | 1.290,04 | 980,43 | 76,00% |
| | | 59 | 14,01 | 9,50 | 67,76% |
| | | 56 | 152,04 | 100,25 | 65,93% |
| | | 58 | 33,99 | 21,72 | 63,91% |
| | | 61 | 28,66 | 17,28 | 60,30% |
| | 55 | 16,49 | 6,59 | 39,96% | |
| | Unidad del Registro Social | 55 | 0,04 | 0,02 | 54,57% |
| Desarrollo Productivo | Secretaría Técnica de Asentamientos Humanos Irregulares | 55 | 0,04 | 0,03 | 73,85% |
| | Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda | 56 | 0,83 | 0,58 | 70,18% |
| | | 55 | 0,34 | 0,23 | 67,36% |
| | | 57 | 0,18 | 0,11 | 61,62% |
| 97 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Desarrollo Territorial | Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información | 55 | 0,63 | 0,44 | 69,72% |
| Sin Gabinete | Consejo Nacional de Discapacidades | 87 | 0,81 | 0,56 | 69,07% |
| | Consejo Nacional para la Igualdad de Género | 87 | 0,33 | 0,22 | 65,39% |
| | Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional | 87 | 1,07 | 0,70 | 65,33% |
| | Superintendencia de Ordenamiento Territorial Uso y Gestión del Suelo | 55 | 0,01 | 0,01 | 40,88% |
| Total | | | 1.539,53 | 1.138,67 | 73,96% |

Fuente: Secretaría Nacional de Planificación, Módulo Seguimiento a la Planificación Institucional del SIPeIP-Submódulo de planes institucionales corte 30 de septiembre de 2023. Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF – Ministerio de Economía y Finanzas - Ejecución Presupuestaria, se excluye el sectorial Tesoro Nacional, que son entidades virtuales manejadas por MEF, corte 30 de septiembre de 2023.

Elaborado: Dirección de Seguimiento a la Planificación y Política Pública.

Objetivo 6: Garantizar el derecho a la salud integral, gratuita y de calidad

Este objetivo se enfoca en una visión de salud integral, inclusiva y de calidad, a través de políticas públicas concernientes a: hábitos de vida saludable, salud sexual y reproductiva, superación de adicciones y acceso universal a vacunas, siendo prioritario la Estrategia Nacional de Primera Infancia para la Prevención y Reducción de la Desnutrición Crónica Infantil: Ecuador Crece Sin Desnutrición Infantil, que tiene como finalidad disminuir de manera sostenible la desnutrición y/o malnutrición infantil.

A este objetivo se encuentran alineadas 6 entidades a través de 6 programas presupuestarios con un presupuesto codificado de USD 55,65 millones y un monto devengado de USD 44,51 millones, lo que representa una ejecución presupuestaria del 79,98%. A continuación, se detalla la ejecución presupuestaria correspondiente al tercer trimestre por institución:50

**Tabla 16. Ejecución presupuestaria de las entidades alineadas al objetivo 6
(millones de dólares)**

| Gabinete Sectorial | Entidad | Programa | Codificado | Devengado | Ejecución % |
|------------------------|---|----------|------------|-----------|-------------|
| Desarrollo del Talento | Ministerio del Deporte | 55 | 41,55 | 34,66 | 83,41% |
| Salud | Agencia de Aseguramiento de la Calidad de Servicios de Salud y Medicina Prepagada | 55 | 3,68 | 2,62 | 71,35% |
| | Agencia Nacional de Regulación Control y Vigilancia Sanitaria | 55 | 10,17 | 7,13 | 70,09% |

| Gabinete Sectorial | Entidad | Programa | Codificado | Devengado | Ejecución % |
|--------------------|---|----------|--------------|--------------|---------------|
| | Instituto Nacional de Donación y Trasplantes de Órganos Tejidos y Células | 55 | 0,17 | 0,04 | 25,35% |
| Sin Gabinete | Consejo Nacional de Salud, CONASA | 55 | 0,08 | 0,06 | 68,46% |
| Desarrollo Social | Secretaría Técnica Ecuador Crece Sin Desnutrición Infantil* | 75 | - | - | - |
| Total | | | 55,65 | 44,51 | 79,98% |

Nota: * (-) Entidad con programas presupuestarios alineados al Objetivo del PND, sin presupuesto de gasto corriente, aplicación del financiamiento y gasto de capital no atado a proyectos que son parte de la estructura programática.

Fuente: Secretaría Nacional de Planificación, Módulo Seguimiento a la Planificación Institucional del SIPeIP-Submódulo de planes institucionales corte 30 de septiembre de 2023. Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF – Ministerio de Economía y Finanzas - Ejecución Presupuestaria, se excluye el sectorial Tesoro Nacional, que son entidades virtuales manejadas por MEF, corte 30 de septiembre de 2023.

Elaborado: Dirección de Seguimiento a la Planificación y Política Pública.

Objetivo 7: Potenciar las capacidades de la ciudadanía y promover una educación innovadora, inclusiva y de calidad en todos los niveles

Este objetivo se enfoca en la promoción de una educación innovadora, inclusiva y de calidad en todos los niveles; un modelo educativo eficiente y transparente; mejoramiento de la investigación e innovación; libre de violencia, promoviendo la inclusión en las aulas y en todos los niveles de educación; fortalecimiento de la educación superior; perfeccionamiento del docente; y consecución de la excelencia deportiva.

A este objetivo se encuentran alineadas 36 entidades a través de 94 programas presupuestarios con un presupuesto codificado de USD 2.611,46 millones y un monto devengado de USD 1.892,64 millones, lo que representa una ejecución presupuestaria del 72,47%. A continuación, se detalla la ejecución presupuestaria correspondiente al tercer trimestre por institución:

Tabla 17. Ejecución presupuestaria de las entidades alineadas al objetivo 7 (millones de dólares)

| Gabinete Sectorial | Entidad | Programa | Codificado | Devengado | Ejecución % |
|--|--|----------|------------|-----------|-------------|
| Sin Gabinete | Universidad de Guayaquil | 84 | 0,92 | 0,83 | 89,25% |
| | | 82 | 81,04 | 55,69 | 68,72% |
| | | 83 | 3,94 | 0,94 | 23,80% |
| | Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí | 82 | 46,31 | 33,06 | 71,39% |
| | | 84 | 2,61 | 1,74 | 66,55% |
| | | 83 | 2,51 | 1,23 | 49,03% |
| | Escuela Superior Politécnica del Chimborazo | 83 | 0,93 | 0,66 | 70,58% |
| | | 82 | 44,33 | 30,99 | 69,90% |
| | | 84 | 0,49 | 0,13 | 26,22% |
| | Universidad Estatal del Sur de Manabí | 82 | 12,64 | 8,77 | 69,38% |
| | | 83 | 0,40 | 0,06 | 14,71% |
| | | 84 | 0,33 | 0,03 | 8,24% |
| | Junta Nacional de Defensa del Artesano | 55 | 0,55 | 0,38 | 69,29% |
| | Universidad de Investigación de Tecnología Experimental YACHAY | 82 | 7,47 | 5,16 | 69,06% |
| | | 84 | 0,12 | 0,06 | 52,49% |
| | | 83 | 0,96 | 0,44 | 46,24% |
| | Universidad Nacional de Chimborazo | 83 | 1,18 | 0,80 | 68,46% |
| | | 82 | 21,85 | 14,67 | 67,16% |
| | | 84 | 0,06 | 0,03 | 46,94% |
| | Escuela Politécnica Nacional | 82 | 34,26 | 23,45 | 68,44% |
| 84 | | 5,74 | 3,52 | 61,33% | |
| 83 | | 4,21 | 2,20 | 52,26% | |
| Escuela Superior Politécnica del Litoral | 82 | 45,42 | 30,54 | 67,24% | |

| Gabinete Sectorial | Entidad | Programa | Codificado | Devengado | Ejecución % |
|--------------------|---|----------|------------|-----------|-------------|
| | | 83 | 6,54 | 3,83 | 58,60% |
| | | 84 | 0,73 | 0,42 | 57,97% |
| | Universidad Técnica Estatal de Quevedo | 82 | 14,59 | 9,80 | 67,21% |
| | | 84 | 1,52 | 0,87 | 57,09% |
| | | 83 | 4,67 | 2,17 | 46,50% |
| | Universidad Nacional de Loja | 82 | 24,96 | 16,75 | 67,09% |
| | | 84 | 0,02 | 0,01 | 57,17% |
| | | 83 | 0,93 | 0,39 | 41,67% |
| | Universidad de Cuenca | 82 | 46,42 | 31,01 | 66,79% |
| | | 83 | 6,78 | 4,44 | 65,49% |
| | | 84 | 1,47 | 0,72 | 49,09% |
| | Universidad Técnica de Ambato | 82 | 33,16 | 22,15 | 66,79% |
| | | 83 | 1,59 | 0,90 | 56,46% |
| | | 84 | 1,31 | 0,52 | 39,35% |
| | Universidad Estatal de Milagro | 82 | 23,42 | 15,61 | 66,64% |
| | | 84 | 0,43 | 0,26 | 61,11% |
| | | 83 | 2,93 | 0,95 | 32,36% |
| | Universidad Estatal Península de Santa Elena | 82 | 11,34 | 7,46 | 65,76% |
| | | 83 | 0,98 | 0,43 | 44,32% |
| | | 84 | 0,15 | 0,01 | 6,09% |
| | Universidad Nacional de Educación, UNAE | 82 | 10,56 | 6,85 | 64,90% |
| | | 83 | 1,14 | 0,31 | 26,87% |
| | | 84 | 0,59 | 0,13 | 21,08% |
| | Universidad Técnica de Manabí | 82 | 35,91 | 23,11 | 64,37% |
| | | 83 | 0,20 | 0,00 | 0,00% |
| | Consejo de Educación Superior | 55 | 2,21 | 1,41 | 64,16% |
| | Universidad Estatal Amazónica | 82 | 7,23 | 4,63 | 64,06% |
| | | 84 | 2,34 | 1,19 | 50,95% |
| | | 83 | 1,18 | 0,51 | 43,51% |
| | Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de Manabí Manuel Félix López* | 82 | 9,67 | 6,09 | 62,99% |
| | | 83 | 0,15 | 0,05 | 32,83% |
| | | 84 | - | - | |
| | Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE | 82 | 48,52 | 30,25 | 62,33% |
| | | 84 | 0,56 | 0,19 | 34,51% |
| | | 83 | 0,83 | 0,19 | 23,32% |
| | Universidad Técnica de Babahoyo | 82 | 17,19 | 10,49 | 61,04% |
| | | 83 | 0,95 | 0,13 | 13,77% |
| | | 84 | 0,05 | 0,00 | 0,00% |
| | Universidad Regional Amazónica IKIAM | 82 | 4,68 | 2,83 | 60,57% |
| | | 83 | 1,11 | 0,39 | 35,25% |
| | | 84 | 0,37 | 0,07 | 17,92% |
| | Instituto de Altos Estudios Nacionales | 82 | 3,04 | 1,78 | 58,70% |
| | | 83 | 0,67 | 0,16 | 24,19% |
| | Universidad Politécnica Estatal del Carchi | 82 | 7,44 | 4,35 | 58,39% |
| | | 84 | 0,14 | 0,06 | 46,88% |
| | | 83 | 1,33 | 0,24 | 17,70% |
| | Universidad Técnica de Cotopaxi | 82 | 19,00 | 10,74 | 56,53% |
| | | 84 | 0,01 | 0,01 | 49,37% |
| | | 83 | 0,84 | 0,08 | 9,78% |
| | Casa de Montalvo | 79 | 0,09 | 0,05 | 56,30% |

| Gabinete Sectorial | Entidad | Programa | Codificado | Devengado | Ejecución % |
|---|---|----------|-----------------|-----------------|---------------|
| | Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior | 55 | 2,14 | 1,14 | 53,39% |
| | Universidad Intercultural de Las Nacionalidades y Pueblos Indígenas AMAWTAY WASI* | 82 | 0,71 | 0,38 | 53,30% |
| | | 83 | 0,36 | 0,05 | 12,89% |
| | | 57 | - | - | |
| | Universidad Estatal de Bolívar | 82 | 12,22 | 6,11 | 49,97% |
| | | 83 | 1,22 | 0,51 | 41,83% |
| 84 | | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| Desarrollo del Talento | Secretaría de Educación Intercultural Bilingüe y la Etnoeducación | 55 | 0,98 | 0,87 | 88,20% |
| | Ministerio del Deporte* | 56 | 6,08 | 5,25 | 86,32% |
| | | 20 | - | - | |
| | Ministerio de Educación* | 56 | 1.493,57 | 1.183,78 | 79,26% |
| | | 58 | 44,23 | 35,02 | 79,18% |
| | | 59 | 236,34 | 152,04 | 64,33% |
| | | 60 | 51,40 | 17,63 | 34,30% |
| | | 025 | - | - | - |
| | | 029 | - | - | - |
| | Instituto Nacional de Evaluación Educativa | 55 | 1,36 | 0,92 | 67,93% |
| Secretaría Nacional de Educación Superior Ciencia Tecnología e Innovación | 55 | 67,54 | 43,90 | 65,01% | |
| | 86 | 1,88 | 1,13 | 59,85% | |
| | 56 | 11,04 | 3,40 | 30,83% | |
| Desarrollo de Inversiones | Instituto de Investigación Geológico y Energético | 55 | 0,19 | 0,14 | 72,48% |
| Total | | | 2.611,46 | 1.892,64 | 72,47% |

Nota: * (-) Entidad con programas presupuestarios alineados al Objetivo del PND, sin presupuesto de gasto corriente, aplicación del financiamiento y gasto de capital no atado a proyectos que son parte de la estructura programática.

Fuente: Secretaría Nacional de Planificación, Módulo Seguimiento a la Planificación Institucional del SIPeIP-Submódulo de planes institucionales corte 30 de septiembre de 2023. Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF – Ministerio de Economía y Finanzas - Ejecución Presupuestaria, se excluye el sectorial Tesoro Nacional, que son entidades virtuales manejadas por MEF, corte 30 de septiembre de 2023.

Elaborado: Dirección de Seguimiento a la Planificación y Política Pública.

Objetivo 8: Generar nuevas oportunidades y bienestar para las zonas rurales, con énfasis en pueblos y nacionalidades

Este objetivo se enfoca en la generación de nuevas oportunidades para el bienestar de los habitantes de las zonas rurales, mediante la generación de oportunidades de empleo, incremento de la cobertura de la seguridad social, con acceso a un hábitat seguro y vivienda digna, con pertenencia cultural en educación, salud, conectividad, agua potable y saneamiento bajo la implementación de políticas públicas.

A este objetivo se encuentran alineadas 4 entidades a través de 7 programas presupuestarios con un presupuesto codificado de USD 1.388,00 millones y un monto devengado de USD 663,82 millones, lo que representa una ejecución presupuestaria del 47,80%. A continuación, se detalla la ejecución presupuestaria correspondiente al tercer trimestre por institución:

Tabla 18. Ejecución presupuestaria de las entidades alineadas al objetivo 8
(millones de dólares)

| Gabinete Sectorial | Entidad | Programa | Codificado | Devengado | Ejecución % |
|---------------------------|---|----------|------------|-----------|-------------|
| Desarrollo del Talento | Ministerio de Educación | 57 | 689,29 | 532,51 | 77,3% |
| | | 55 | 689,69 | 124,89 | 18,1% |
| Desarrollo de Inversiones | Ministerio de Energía y Minas* | 55 | 6,13 | 4,40 | 71,9% |
| | | 56 | - | - | - |
| | | 57 | - | - | - |
| Desarrollo del Talento | Instituto Nacional de Patrimonio Cultural | 80 | 2,77 | 1,94 | 70,1% |
| | Secretaría de Educación Intercultural Bilingüe y la Etnoeducación | 56 | 0,12 | 0,07 | 55,1% |
| Total | | | 1.388,00 | 663,82 | 47,80% |

Nota: * (-) Entidad con programas presupuestarios alineados al Objetivo del PND, sin presupuesto de gasto corriente, aplicación del financiamiento y gasto de capital no atado a proyectos que son parte de la estructura programática.

Fuente: Secretaría Nacional de Planificación, Módulo Seguimiento a la Planificación Institucional del SIPeIP-Submódulo de planes institucionales corte 30 de septiembre de 2023. Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF – Ministerio de Economía y Finanzas - Ejecución Presupuestaria, se excluye el sectorial Tesoro Nacional, que son entidades virtuales manejadas por MEF, corte 30 de septiembre de 2023.

Elaborado: Dirección de Seguimiento a la Planificación y Política Pública.

Objetivo 9: Garantizar la seguridad ciudadana, orden público y gestión de riesgos

Este objetivo se enfoca en la defensa nacional, protección interna y el orden público como competencias exclusivas del Estado que garanticen una convivencia pacífica y segura para los ciudadanos, previniendo formas de violencia y discriminación. Para lograrlo se requiere plantear políticas de seguridad orientadas a erradicar la delincuencia común, el crimen organizado interno y transnacional, la inseguridad vial, y; el tráfico ilegal de drogas, de armas de fuego y terrorismo en todas sus formas. Además, fortalecer el sistema penitenciario y la gestión de riesgos.

A este objetivo se encuentran alineadas 9 entidades a través de 13 programas presupuestarios con un presupuesto codificado de USD 1.677,64 millones y un monto devengado de USD 1.204,97 millones, lo que representa una ejecución presupuestaria del 71,83%. A continuación, se detalla la ejecución presupuestaria correspondiente al tercer trimestre por institución:

Tabla 19. Ejecución presupuestaria de las entidades alineadas al objetivo 9
(millones de dólares)

| Gabinete Sectorial | Entidad | Programa | Codificado | Devengado | Ejecución % |
|---|---|----------|------------|-----------|-------------|
| Seguridad | Dirección General de Aviación Civil | 55 | 20,66 | 15,25 | 73,78% |
| | Policía Nacional | 91 | 1.336,42 | 972,54 | 72,77% |
| | Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos | 57 | 2,30 | 1,64 | 71,42% |
| | | 55 | 1,51 | 1,00 | 66,53% |
| | | 56 | 2,01 | 1,12 | 55,44% |
| | Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores* | 56 | 97,76 | 65,51 | 67,01% |
| | 98 | - | - | - | - |
| Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 | 55 | 21,79 | 13,09 | 60,05% | |
| Desarrollo de Inversiones | Comisión de Tránsito del Ecuador | 56 | 2,27 | 1,63 | 71,72% |
| | | 55 | 106,65 | 74,24 | 69,61% |
| | Servicio Público para pago de Accidentes de Tránsito | 55 | 79,64 | 54,27 | 68,14% |
| | Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial* | 55 | - | - | - |
| Sin Gabinete | Casa Militar Presidencial | 91 | 6,62 | 4,69 | 70,87% |
| Total | | | 1.677,64 | 1.204,97 | 71,83% |

Nota: * (-) Entidad con programas presupuestarios alineados al Objetivo del PND, sin presupuesto de gasto corriente, aplicación del financiamiento y gasto de capital no atado a proyectos que son parte de la estructura programática.

Fuente: Secretaría Nacional de Planificación, Módulo Seguimiento a la Planificación Institucional del SipeIP-Submódulo de planes institucionales corte 30 de septiembre de 2023. Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF – Ministerio de Economía y Finanzas - Ejecución Presupuestaria, se excluye el sectorial Tesoro Nacional, que son entidades virtuales manejadas por MEF, corte 30 de septiembre de 2023.

Elaborado: Dirección de Seguimiento a la Planificación y Política Pública

Objetivo 10: Garantizar la soberanía nacional, integridad territorial y seguridad del Estado

Este objetivo se enfoca en la implementación de medidas que inhiban el potencial de agresión mediante la disuasión defensiva, alerta temprana, la acción preventiva ante los conflictos y el fomento de medidas de confianza y seguridad entre los Estados para lograr la estabilidad y paz; con la finalidad de estar atentos a las amenazas globales que tienen una connotación transnacional que podrían afectar a la defensa y seguridad de los Estados, entre amenazas tenemos: terrorismo, narcotráfico y sus delitos conexos, crimen organizado, ciberataques, exploración y explotación ilegal de la riqueza marítima y, delincuencia organizada transnacional.

A este objetivo se encuentra alineada 2 entidad a través de 8 programas presupuestarios con un presupuesto codificado de USD 1.306,69 millones y un monto devengado de USD 894,87 millones, lo que representa una ejecución presupuestaria del 68,48%. A continuación, se detalla la ejecución presupuestaria correspondiente al tercer trimestre por institución:

Tabla 20. Ejecución presupuestaria de las entidades alineadas al objetivo 10
(millones de dólares)

| Gabinete Sectorial | Entidad | Programa | Codificado | Devengado | Ejecución % |
|--------------------|---------------------------------|----------|-----------------|---------------|---------------|
| Seguridad | Instituto Geográfico Militar | 87 | 1,42 | 1,40 | 98,41% |
| | | 86 | 43,05 | 18,45 | 42,86% |
| | Ministerio de Defensa Nacional* | 55 | 1.185,61 | 837,15 | 70,61% |
| | | 91 | 20,35 | 13,23 | 65,00% |
| | | 56 | 4,41 | 2,74 | 62,03% |
| | | 57 | 37,27 | 16,55 | 44,40% |
| | | 86 | 14,59 | 5,36 | 36,75% |
| | | 58 | - | - | - |
| Total | | | 1.306,69 | 894,87 | 68,48% |

Nota: * (-) Entidad con programas presupuestarios alineados al Objetivo del PND, sin presupuesto de gasto corriente, aplicación del financiamiento y gasto de capital no atado a proyectos que son parte de la estructura programática.

Fuente: Secretaría Nacional de Planificación, Módulo Seguimiento a la Planificación Institucional del SipeIP-Submódulo de planes institucionales corte 30 de septiembre de 2023. Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF – Ministerio de Economía y Finanzas - Ejecución Presupuestaria, se excluye el sectorial Tesoro Nacional, que son entidades virtuales manejadas por MEF, corte 30 de septiembre de 2023.

Elaborado: Dirección de Seguimiento a la Planificación y Política Pública.

Objetivo 11: Conservar, restaurar, proteger y hacer un uso sostenible de los recursos naturales

Este objetivo se enfoca en proponer avances en las condiciones legales, económicas y de protección ambiental para lograr el funcionamiento de las actividades humanas en el marco de la transición ecológica, a través de la programación de acciones que permita la conservación de los hábitats, la gestión eficiente de los recursos naturales y la reparación de los ecosistemas.

A este objetivo se encuentran alineadas 5 entidades a través de 6 programas presupuestarios con un presupuesto codificado de USD 20,21 millones y un monto devengado de USD 12,51 millones, lo que representa una ejecución presupuestaria del 61,92%. A continuación, se detalla la ejecución presupuestaria correspondiente al tercer trimestre por institución:

Tabla 21. Ejecución presupuestaria de las entidades alineadas al objetivo 11
(millones de dólares)

| Gabinete Sectorial | Entidad | Programa | Codificado | Devengado | Ejecución % |
|-------------------------------------|--|----------|--------------|--------------|---------------|
| Desarrollo de Inversiones | Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables | 55 | 13,50 | 9,26 | 68,60% |
| Desarrollo Productivo | Instituto Público de Investigación de Acuicultura y Pesca | 86 | 0,76 | 0,52 | 67,90% |
| | Agencia de Regulación y Control de la Bioseguridad y Cuarentena para Galápagos | 55 | 3,31 | 2,06 | 62,17% |
| | Parque Nacional Galápagos | 57 | 0,19 | 0,09 | 46,87% |
| | | 55 | 2,43 | 0,58 | 23,85% |
| Instituto Nacional De Biodiversidad | 55 | 0,02 | 0,01 | 38,75% | |
| Total | | | 20,21 | 12,51 | 61,92% |

Fuente: Secretaría Nacional de Planificación, Módulo Seguimiento a la Planificación Institucional del SIPeIP-Submódulo de planes institucionales corte 30 de septiembre de 2023. Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF – Ministerio de Economía y Finanzas - Ejecución Presupuestaria, se excluye el sectorial Tesoro Nacional, que son entidades virtuales manejadas por MEF, corte 30 de septiembre de 2023.

Elaborado: Dirección de Seguimiento a la Planificación y Política Pública.

Objetivo 12: Fomentar modelos de desarrollo sostenibles aplicando medidas de adaptación y mitigación al Cambio Climático

Este objetivo se enfoca en la generación e implementación de un modelo económico circular que busque el aprovechamiento sostenible y equitativo de los recursos, marcando un nuevo desafío en la reducción, reutilización y el reciclaje, mediante la incentivación de innovación de nuevas tecnologías que optimicen la recuperación con métodos de producción eficientes, reduciendo los efectos del cambio climático.

A este objetivo se encuentran alineadas 3 entidades a través de 3 programas presupuestarios con un presupuesto codificado de USD 5,72 millones y un monto devengado de USD 3,15 millones, lo que representa una ejecución presupuestaria del 55,12%. A continuación, se detalla la ejecución presupuestaria correspondiente al tercer trimestre por institución:

Tabla 22. Ejecución presupuestaria de las entidades alineadas al objetivo 12
(millones de dólares)

| Gabinete Sectorial | Entidad | Programa | Codificado | Devengado | Ejecución % |
|---------------------------|---|----------|-------------|-------------|---------------|
| Desarrollo de Inversiones | Instituto de Investigación Geológico y Energético | 57 | 0,26 | 0,18 | 70,70% |
| Desarrollo de Inversiones | Operador Nacional de Electricidad | 55 | 5,40 | 2,95 | 54,66% |
| Desarrollo Productivo | Parque Nacional Galápagos | 56 | 0,06 | 0,02 | 30,53% |
| Total | | | 5,72 | 3,15 | 55,12% |

Fuente: Secretaría Nacional de Planificación, Módulo Seguimiento a la Planificación Institucional del SIPeIP-Submódulo de planes institucionales corte 30 de septiembre de 2023. Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF – Ministerio de Economía y Finanzas - Ejecución Presupuestaria, se excluye el sectorial Tesoro Nacional, que son entidades virtuales manejadas por MEF, corte 30 de septiembre de 2023.

Elaborado: Dirección de Seguimiento a la Planificación y Política Pública.

Objetivo 13: Promover la gestión integral de los recursos hídricos

Este objetivo se enfoca en el desarrollo de políticas específicas para la gestión de los recursos hídricos que permitan ordenar el uso y acceso al recurso, priorizando las necesidades básicas del ser humano; además promover políticas para el uso de actividades productivas con enfoque ecológico.

A este objetivo se encuentran alineada 1 entidad a través de 1 programa presupuestario con un presupuesto codificado de USD 1,19 millones y un monto devengado de USD 0,84 millones, lo que

representa una ejecución presupuestaria del 70,68%. A continuación, se detalla la ejecución presupuestaria correspondiente al tercer trimestre por institución:

Tabla 23. Ejecución presupuestaria de las entidades alineadas al objetivo 13
(millones de dólares)

| Gabinete Sectorial | Entidad | Programa | Codificado | Devengado | Ejecución % |
|-----------------------|--|----------|-------------|-------------|---------------|
| Desarrollo Productivo | Agencia de Regulación y Control del Agua | 55 | 1,19 | 0,84 | 70,68% |
| Total | | | 1,19 | 0,84 | 70,68% |

Fuente: Secretaría Nacional de Planificación, Módulo Seguimiento a la Planificación Institucional del SIPeIP-Submódulo de planes institucionales corte 30 de septiembre de 2023. Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF – Ministerio de Economía y Finanzas - Ejecución Presupuestaria, se excluye el sectorial Tesoro Nacional, que son entidades virtuales manejadas por MEF, corte 30 de septiembre de 2023.

Elaborado: Dirección de Seguimiento a la Planificación y Política Pública.

Objetivo 14: Fortalecer las capacidades del Estado con énfasis en la administración de justicia y eficiencia en los procesos de regulación y control, con independencia y autonomía

Enfocada en garantizar el pleno goce de derechos y libertades de los ciudadanos, el Estado debe facilitar la prestación de sus servicios en materia judicial a la población de forma oportuna, eficiente y con igualdad de oportunidades; con la necesidad en mira de reducir los procesos burocráticos, tiempos de resolución y evitar la injerencia del Estado u otros grupos de Poder.

A este objetivo se encuentran alineadas 129 entidades a través de 152 programas presupuestarios con un presupuesto codificado de USD 2.554,82 millones y un monto devengado de USD 1.475,33 millones, lo que representa una ejecución presupuestaria del 57,75%.

Cabe indicar que, conforme la “Guía metodológica de planificación institucional” las entidades deben incorporar en su Plan Institucional el objetivo denominado “fortalecimiento de las capacidades institucionales”, mismo que es financiado con recursos del programa presupuestario de administración central, que refiere al pago de remuneraciones del personal de las áreas operativas de las entidades, así como los bienes y servicios producto de la gestión institucional. A continuación, se detalla la ejecución presupuestaria correspondiente al tercer trimestre por institución:

Tabla 24. Ejecución presupuestaria de las entidades alineadas al objetivo 14
(millones de dólares)

| Gabinete Sectorial | Entidad | Programa | Codificado | Devengado | Ejecución % | |
|--------------------|--|----------|------------|-----------|-------------|--------|
| Sin Gabinete | Asamblea Nacional | 01 | 27,03 | 24,93 | 92,26% | |
| | Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí | 01 | 10,99 | 8,04 | 73,13% | |
| | Secretaría Nacional de Planificación | | 01 | 3,50 | 2,55 | 72,90% |
| | | | 55 | 4,12 | 2,82 | 68,45% |
| | Fiscalía General del Estado | | 56 | 0,21 | 0,15 | 72,18% |
| | | | 55 | 118,42 | 83,93 | 70,87% |
| | | | 01 | 23,81 | 16,59 | 69,68% |
| | Superintendencia de Bancos | 01 | 6,84 | 4,96 | 72,50% | |
| | Secretaría Técnica de Gestión Inmobiliaria del Sector Público | | 01 | 7,16 | 5,14 | 71,70% |
| | | | 57 | 30,60 | 20,74 | 67,78% |
| | Parlamento Andino (Oficina Nacional) | 01 | 1,61 | 1,15 | 71,64% | |
| | Conferencia Plurinacional e Intercultural de Soberanía Alimentaria | 01 | 0,19 | 0,13 | 71,50% | |
| | Universidad Estatal de Milagro | 01 | 8,26 | 5,90 | 71,50% | |
| | Consejo de la Judicatura* | | 56 | 277,19 | 197,19 | 71,14% |
| | | | 01 | 36,99 | 25,43 | 68,74% |
| 55 | | | 37,87 | 24,25 | 64,02% | |

| Gabinete Sectorial | Entidad | Programa | Codificado | Devengado | Ejecución % |
|--------------------|---|----------|------------|-----------|-------------|
| | | 20 | - | - | - |
| | Superintendencia de Compañías Valores y Seguros | 01 | 10,05 | 7,14 | 71,01% |
| | Superintendencia de Competencia Económica | 55 | 2,95 | 2,09 | 70,82% |
| | | 01 | 2,38 | 1,59 | 66,68% |
| | Defensoría del Pueblo | 55 | 7,18 | 5,08 | 70,83% |
| | | 01 | 4,33 | 2,89 | 66,86% |
| | Corte Constitucional | 55 | 6,25 | 4,43 | 70,80% |
| | | 01 | 3,24 | 2,27 | 70,10% |
| | Consejo de Participación Ciudadana y Control Social | 01 | 4,16 | 2,94 | 70,74% |
| | Defensoría Pública | 55 | 27,76 | 19,61 | 70,64% |
| | | 01 | 6,84 | 4,81 | 70,33% |
| | Universidad Técnica de Cotopaxi | 01 | 4,23 | 2,94 | 69,51% |
| | Instituto Nacional de Estadística y Censos | 01 | 3,83 | 2,66 | 69,47% |
| | | 55 | 8,82 | 5,97 | 67,71% |
| | Universidad Técnica de Manabí | 01 | 11,35 | 7,84 | 69,12% |
| | Escuela Superior Politécnica del Litoral | 01 | 10,67 | 7,36 | 68,96% |
| | Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de Manabí Manuel Félix López | 01 | 4,01 | 2,76 | 68,80% |
| | Consejo Nacional de Competencias | 01 | 0,53 | 0,36 | 68,53% |
| | | 55 | 0,53 | 0,36 | 68,43% |
| | Corporación del Seguro de Depósitos | 01 | 1,64 | 1,13 | 68,49% |
| | Superintendencia de Ordenamiento Territorial Uso y Gestión del Suelo | 01 | 2,49 | 1,70 | 68,40% |
| | Consejo Nacional de Discapacidades | 01 | 0,91 | 0,62 | 68,36% |
| | Vicepresidencia de la República | 01 | 3,29 | 2,22 | 67,42% |
| | Consejo de Desarrollo y Promoción de la Información y Comunicación | 01 | 1,71 | 1,15 | 67,31% |
| | | 55 | 1,23 | 0,82 | 66,81% |
| | Tribunal Contencioso Electoral | 55 | 1,47 | 0,98 | 66,85% |
| | | 01 | 1,60 | 1,05 | 66,01% |
| | | 56 | 1,08 | 0,43 | 39,60% |
| | Procuraduría General del Estado | 01 | 5,83 | 3,90 | 66,84% |
| | Universidad de Investigación de Tecnología Experimental YACHAY | 01 | 4,84 | 3,22 | 66,50% |
| | Consejo Nacional para la Igualdad de Movilidad Humana | 01 | 0,36 | 0,24 | 65,84% |
| | Consejo Nacional Electoral | 01 | 32,11 | 21,13 | 65,82% |
| | Consejo Nacional para la Igualdad de Género | 01 | 0,44 | 0,29 | 65,25% |
| | Consejo de Educación Superior | 01 | 3,59 | 2,33 | 65,07% |
| | Secretaría Técnica del Comité de Coordinación de la Función de Transparencia y Control Social | 01 | 0,28 | 0,18 | 64,63% |
| | Universidad Técnica de Babahoyo | 01 | 9,82 | 6,23 | 63,42% |
| | Universidad Regional Amazónica IKIAM | 01 | 3,26 | 2,07 | 63,35% |
| | Junta Nacional de Defensa del Artesano | 01 | 1,62 | 1,04 | 64,34% |
| | Universidad Nacional de Loja | 01 | 12,91 | 7,99 | 61,86% |
| | Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional | 01 | 0,67 | 0,41 | 61,85% |
| | Contraloría General del Estado | 01 | 16,17 | 9,99 | 61,81% |
| | Escuela Superior Politécnica del Chimborazo | 01 | 16,54 | 10,10 | 61,07% |
| | Universidad de Guayaquil | 01 | 47,17 | 28,76 | 60,96% |
| | Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior | 01 | 3,22 | 1,96 | 60,70% |
| | Casa de Montalvo | 01 | 0,13 | 0,08 | 60,42% |

| Gabinete Sectorial | Entidad | Programa | Codificado | Devengado | Ejecución % |
|-------------------------------|--|----------|------------|-----------|-------------|
| | Universidad Técnica Estatal de Quevedo | 01 | 5,43 | 3,24 | 59,75% |
| | Superintendencia de Economía Popular Solidaria | 01 | 6,57 | 3,86 | 58,74% |
| | Sección Nacional del Ecuador del Instituto Panamericano de Geografía e Historia | 01 | 0,10 | 0,06 | 58,63% |
| | Escuela Politécnica Nacional | 01 | 18,11 | 10,49 | 57,92% |
| | Consejo Nacional de Salud | 01 | 0,36 | 0,21 | 57,05% |
| | Presidencia de la República | 01 | 28,60 | 16,24 | 56,77% |
| | Universidad Nacional de Chimborazo | 01 | 10,85 | 6,11 | 56,28% |
| | Universidad Nacional de Educación | 01 | 6,85 | 3,78 | 55,28% |
| | Universidad Intercultural de Las Nacionalidades y Pueblos Indígenas AMAWTAY WASI | 01 | 0,33 | 0,18 | 55,14% |
| | Casa Militar Presidencial | 01 | 4,53 | 2,47 | 54,58% |
| | Universidad Estatal Península de Santa Elena | 01 | 5,33 | 2,85 | 53,46% |
| | Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE | 01 | 20,02 | 10,61 | 53,00% |
| | Universidad Técnica de Ambato | 01 | 15,06 | 7,92 | 52,63% |
| | Universidad Politécnica Estatal del Carchi | 01 | 4,49 | 2,28 | 50,92% |
| | Universidad Estatal del Sur de Manabí | 01 | 10,38 | 5,23 | 50,39% |
| | Instituto de Altos Estudios Nacionales | 01 | 5,31 | 2,50 | 47,16% |
| | Secretaría Técnica de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica | 01 | 2,63 | 1,22 | 46,57% |
| | | 55 | - | - | - |
| | Universidad Estatal de Bolívar | 01 | 8,45 | 3,28 | 38,86% |
| | Universidad de Cuenca | 01 | 30,40 | 9,96 | 32,75% |
| Universidad Estatal Amazónica | 01 | 7,16 | 2,03 | 28,32% | |
| Seguridad | Centro de Inteligencia Estratégica | 01 | 64,92 | 52,49 | 80,86% |
| | Dirección General de Aviación Civil | 01 | 6,91 | 5,05 | 73,12% |
| | Ministerio de Defensa Nacional | 01 | 118,51 | 85,29 | 71,97% |
| | Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos | 01 | 5,64 | 4,00 | 70,91% |
| | Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana | 01 | 39,88 | 27,23 | 68,29% |
| | Servicio Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses* | 01 | 6,40 | 4,18 | 65,33% |
| | | 55 | - | - | - |
| | Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 | 01 | 14,53 | 9,18 | 63,17% |
| | Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores | 01 | 11,72 | 7,31 | 62,37% |
| | Instituto Geográfico Militar | 01 | 11,48 | 3,96 | 34,47% |
| Policía Nacional | 01 | 124,74 | 37,63 | 30,17% | |
| Desarrollo de Inversiones | Autoridad Portuaria de Manta | 01 | 1,91 | 1,43 | 74,80% |
| | Autoridad Portuaria de Esmeraldas | 01 | 2,03 | 1,51 | 74,25% |
| | Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables | 01 | 3,89 | 2,75 | 70,78% |
| | Ministerio de Energía y Minas | 01 | 4,44 | 3,13 | 70,59% |
| | Ministerio de Transporte y Obras Públicas | 01 | 34,98 | 24,67 | 70,52% |
| | Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar | 01 | 0,85 | 0,57 | 67,69% |
| | Instituto de Investigación Geológico y Energético | 01 | 1,74 | 1,18 | 67,64% |
| | Comisión de Tránsito del Ecuador | 01 | 4,98 | 3,35 | 67,37% |
| | Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial | 01 | 29,57 | 18,98 | 64,20% |
| | Autoridad Portuaria de Guayaquil | 01 | 6,36 | 3,79 | 59,56% |
| | Operador Nacional de Electricidad | 01 | 3,35 | 1,56 | 46,68% |
| | Servicio Público para pago de Accidentes de Tránsito | 01 | 2,68 | 0,62 | 23,25% |
| | Instituto Nacional de Patrimonio Cultural | 01 | 2,43 | 1,77 | 72,73% |



| Gabinete Sectorial | Entidad | Programa | Codificado | Devengado | Ejecución % |
|--|--|----------|------------|-----------|-------------|
| Desarrollo del Talento | Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional | 01 | 6,89 | 4,79 | 69,48% |
| | Secretaría de Educación Intercultural Bilingüe y La Etnoeducación | 01 | 3,93 | 2,73 | 69,42% |
| | Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión | 01 | 8,92 | 6,02 | 67,49% |
| | Ministerio del Trabajo | 01 | 26,69 | 17,67 | 66,22% |
| | Instituto Nacional de Evaluación Educativa | 01 | 1,11 | 0,73 | 66,11% |
| | Secretaría Nacional de Educación Superior Ciencia Tecnología e Innovación | 01 | 10,09 | 6,52 | 64,61% |
| | Ministerio del Deporte | 01 | 4,85 | 3,05 | 62,92% |
| | Ministerio de Cultura y Patrimonio | 01 | 7,77 | 4,48 | 57,62% |
| | Servicio Nacional de Derechos Intelectuales | 01 | 0,75 | 0,36 | 47,98% |
| | Ministerio de Educación | 01 | 502,08 | 171,91 | 34,24% |
| Desarrollo Territorial | Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones | 56 | 2,40 | 1,74 | 72,57% |
| | | 01 | 6,80 | 4,74 | 69,65% |
| | | 55 | 27,62 | 2,81 | 10,18% |
| | Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información | 56 | 1,00 | 0,70 | 70,19% |
| | | 01 | 5,42 | 3,16 | 58,35% |
| | Dirección Nacional de Registros Públicos | 01 | 2,80 | 1,77 | 63,12% |
| Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación | 01 | 27,09 | 15,07 | 55,61% | |
| Desarrollo Productivo | Secretaría Técnica de Asentamientos Humanos Irregulares | 01 | 0,49 | 0,35 | 72,33% |
| | Servicio de Acreditación Ecuatoriano | 01 | 0,51 | 0,37 | 72,09% |
| | Parque Nacional Galápagos | 01 | 17,03 | 12,19 | 71,61% |
| | Ministerio de Turismo | 01 | 8,27 | 5,75 | 69,45% |
| | Agencia de Regulación y Control de la Bioseguridad y Cuarentena para Galápagos | 01 | 1,85 | 1,28 | 69,13% |
| | Instituto Ecuatoriano de Normalización | 01 | 2,40 | 1,66 | 69,09% |
| | Instituto Público de Investigación de Acuicultura y Pesca | 01 | 0,70 | 0,48 | 69,07% |
| | Ministerio de Producción Comercio Exterior Inversiones y Pesca | 01 | 10,85 | 7,47 | 68,83% |
| | Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda | 01 | 6,51 | 4,46 | 68,51% |
| | Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarias | 01 | 15,40 | 10,50 | 68,17% |
| | Ministerio de Agricultura y Ganadería | 01 | 25,04 | 16,62 | 66,40% |
| | Agencia de Regulación y Control Fito y Zoonosanitario | 01 | 13,13 | 8,55 | 65,10% |
| | Agencia de Regulación y Control del Agua | 01 | 1,34 | 0,85 | 62,98% |
| | Instituto Nacional de Biodiversidad | 01 | 1,45 | 0,81 | 55,73% |
| Desarrollo Social | Secretaría Técnica Ecuador Crece Sin Desnutrición Infantil | 01 | 3,72 | 2,63 | 70,65% |
| | Unidad del Registro Social | 01 | 1,88 | 1,32 | 70,34% |
| | Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria | 01 | 3,75 | 2,46 | 65,53% |
| | Ministerio de Inclusión Económica y Social | 01 | 53,28 | 29,52 | 55,40% |
| Económico y Financiero | Servicio Nacional de Contratación Pública | 55 | 2,55 | 1,77 | 69,43% |
| | | 01 | 2,61 | 1,74 | 66,50% |
| | Servicio Nacional de Aduana del Ecuador | 01 | 38,58 | 26,36 | 68,32% |
| | Servicio de Rentas Internas | 01 | 95,59 | 64,81 | 67,80% |
| | Ministerio de Economía y Finanzas | 01 | 7,54 | 4,87 | 64,50% |
| | Unidad de Análisis Financiero y Económico | 01 | 1,54 | 0,98 | 63,80% |
| | Junta de Política y Regulación Financiera | 01 | 0,49 | 0,28 | 56,39% |
| 55 | | 1,26 | 0,65 | 52,03% | |

| Gabinete Sectorial | Entidad | Programa | Codificado | Devengado | Ejecución % |
|--------------------|---|----------|-----------------|-----------------|---------------|
| Salud | Agencia Nacional De Regulación Control y Vigilancia Sanitaria | 01 | 4,71 | 3,21 | 68,21% |
| | Agencia de Aseguramiento de la Calidad de Servicios de Salud y Medicina Prepagada | 01 | 1,54 | 0,99 | 64,27% |
| | Instituto Nacional de Donación y Trasplantes de Órganos Tejidos y Células | 01 | 1,44 | 0,96 | 66,63% |
| Total | | | 2.554,82 | 1.475,33 | 57,75% |

Nota: * (-) Entidad con programas presupuestarios alineados al Objetivo del PND, sin presupuesto de gasto corriente, aplicación del financiamiento y gasto de capital no atado a proyectos que son parte de la estructura programática.

Fuente: Secretaría Nacional de Planificación, Módulo Seguimiento a la Planificación Institucional del SipeIP-Submódulo de planes institucionales corte 30 de septiembre de 2023. Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF – Ministerio de Economía y Finanzas - Ejecución Presupuestaria, se excluye el sectorial Tesoro Nacional, que son entidades virtuales manejadas por MEF, corte 30 de septiembre de 2023.

Elaborado: Dirección de Seguimiento a la Planificación y Política Pública.

Objetivo 15: Fomentar la ética pública, la transparencia y la lucha contra la corrupción

Este objetivo se enfoca en que el sector público deje de ser visto como corrupto y llegue a una imagen positiva de servicio eficiente a la sociedad; en tal sentido, el Gobierno abierto, como modelo de gestión, representa una oportunidad para crear las instituciones formales e informales, que permitan la participación ciudadana plena en todos los procesos de formulación e implementación de políticas públicas y de esa forma consolidar el control social y lucha contra la corrupción.

A este objetivo se encuentran alineadas 9 entidades a través de 13 programas presupuestarios con un presupuesto codificado de USD 285,18 millones y un monto devengado de USD 178,12 millones, lo que representa una ejecución presupuestaria del 62,46%. A continuación, se detalla la ejecución presupuestaria correspondiente al tercer trimestre por institución:

**Tabla 25. Ejecución presupuestaria de las entidades alineadas al objetivo 15
 (millones de dólares)**

| Gabinete Sectorial | Entidad | Programa | Codificado | Devengado | Ejecución % |
|--|---|----------|---------------|---------------|---------------|
| Desarrollo Territorial | Dirección Nacional de Registros Públicos | 55 | 1,74 | 1,16 | 66,98% |
| | | 56 | 3,45 | 2,37 | 68,82% |
| | Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación* | 55 | 61,97 | 33,87 | 54,66% |
| | | 20 | - | - | - |
| Económico y Financiero | Servicio Nacional de Contratación Pública | 56 | 1,74 | 1,17 | 66,85% |
| | Unidad de Análisis Financiero y Económico | 55 | 1,52 | 1,01 | 66,45% |
| Sin Gabinete | Contraloría General del Estado | 55 | 63,99 | 44,47 | 69,49% |
| | | 56 | 3,55 | 2,44 | 68,60% |
| | Consejo de Participación Ciudadana y Control Social | 55 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 56 | 126,50 | 83,35 | 65,89% |
| | Consejo Nacional Electoral* | 55 | - | - | - |
| | | 56 | - | - | - |
| Procuraduría General del Estado | 55 | 20,64 | 8,27 | 40,06% | |
| Instituto de Altos Estudios Nacionales | 84 | 0,08 | 0,01 | 10,70% | |
| Total | | | 285,18 | 178,12 | 62,46% |

Nota: * (-) Entidad con programas presupuestarios alineados al Objetivo del PND, sin presupuesto de gasto corriente, aplicación del financiamiento y gasto de capital no atado a proyectos que son parte de la estructura programática.

Fuente: Secretaría Nacional de Planificación, Módulo Seguimiento a la Planificación Institucional del SipeIP-Submódulo de planes institucionales corte 30 de septiembre de 2023. Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF – Ministerio de Economía y Finanzas - Ejecución Presupuestaria, se excluye el sectorial Tesoro Nacional, que son entidades virtuales manejadas por MEF, corte 30 de septiembre de 2023.

Elaborado: Dirección de Seguimiento a la Planificación y Política Pública.

Objetivo 16: Promover la integración regional, la inserción estratégica del país en el mundo y garantizar los derechos de las personas en situación de movilidad humana

Este objetivo se enfoca en fortalecer la inserción estratégica internacional, mediante la cooperación, la situación de los migrantes y las relaciones comerciales, lo que permitirá la diversificación internacional, en función de los intereses nacionales, salvaguardando la soberanía, la paz y los derechos humanos, teniendo entre sus prioridades: el fortalecimiento de vínculos con el mundo y sus países vecinos; la movilidad humana de ecuatorianos en el exterior y de los extranjeros en el país, en síntesis es abordar temáticas de relaciones exteriores, bilaterales cooperación internacional no reembolsable (financiera y técnica) y la situación de movilidad humana.

A este objetivo se encuentran alineadas 4 entidades a través de 5 programas presupuestarios con un presupuesto codificado de USD 52,12 millones y un monto devengado de USD 39,57 millones, lo que representa una ejecución presupuestaria del 75,95%. A continuación, se detalla la ejecución presupuestaria correspondiente al tercer trimestre por institución:

Tabla 26. Ejecución presupuestaria de las entidades alineadas al objetivo 16
(millones de dólares)

| Gabinete Sectorial | Entidad | Programa | Codificado | Devengado | Ejecución % |
|--------------------|---|----------|--------------|--------------|---------------|
| Sin Gabinete | Sección Nacional del Ecuador del Instituto Panamericano de Geografía e Historia | 86 | 0,23 | 0,18 | 79,79% |
| | Parlamento Andino (Oficina Nacional) | 55 | 0,21 | 0,16 | 77,66% |
| | Consejo Nacional para la Igualdad de Movilidad Humana | 55 | 0,15 | 0,10 | 69,61% |
| Seguridad | Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana | 63 | 50,87 | 38,71 | 76,11% |
| | | 64 | 0,66 | 0,41 | 62,67% |
| Total | | | 52,12 | 39,57 | 75,95% |

Fuente: Secretaría Nacional de Planificación, Módulo Seguimiento a la Planificación Institucional del SIPeIP-Submódulo de planes institucionales corte 30 de septiembre de 2023. Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF – Ministerio de Economía y Finanzas - Ejecución Presupuestaria, se excluye el sectorial Tesoro Nacional, que son entidades virtuales manejadas por MEF, corte 30 de septiembre de 2023.

Elaborado: Dirección de Seguimiento a la Planificación y Política Pública.

2.4. Análisis de cumplimiento de metas de la planificación institucional

De un total de 157 entidades que forman parte del Presupuesto General del Estado -PGE-, el análisis del seguimiento a la ejecución física del PGE, con corte al 30 de septiembre 2023, contempla el reporte de 56 entidades, que presentan indicadores mensuales y trimestrales que son sujetos de seguimiento y que han cumplido con las “Directrices para el Proceso de Sistematización de Planes Institucionales 2023”, no obstante la entidad Autoridad Portuaria de Esmeraldas⁹ no cumplió con la totalidad del reporte de resultados de indicadores de seguimiento para este periodo. La revisión del comportamiento de los indicadores y el porcentaje de cumplimiento de las metas versus su programación permite identificar las categorías de cumplimiento y su semaforización¹⁰, producto de lo cual, se determinan alertas a ser consideradas por las entidades para la mejora en la gestión institucional.

A continuación, se detalla la tabla con los ejes y objetivos del PND 2021-2025, en la que se refleja el número de entidades, objetivos institucionales e indicadores vinculados a estos:

⁹ Notificación realizada por el ente rector de la planificación nacional mediante Oficio Nro. SNP-SGP-SS-2023-0456-OF de fecha 16 de octubre de 2023, a la Autoridad Portuaria de Esmeraldas.

¹⁰ En el numeral 2.1. Metodología de seguimiento a planes institucionales del presente informe, se detalla la fórmula de cálculo y los umbrales y categorías de semaforización.

Tabla 27. Alineación de entidades a objetivos del PND 2021-2025

| Eje | Eje Objetivos PND 2021-2025 | Entidades (No.) | Objetivos Institucionales (No.) | Indicadores Mensuales/ Trimestrales (No.) |
|----------------------|---|-----------------|---------------------------------|---|
| Económico | 1. Incrementar y fomentar, de manera inclusiva, las oportunidades de empleo y las condiciones laborales. | 2 | 3 | 11 |
| | 2. Impulsar un sistema económico con reglas claras que fomente el comercio exterior, turismo, atracción de inversiones y modernización del sistema financiero nacional. | 8 | 19 | 34 |
| | 3. Fomentar la productividad y competitividad en los sectores agrícola, industrial, acuícola y pesquero, bajo el enfoque de la economía circular. | 6 | 15 | 52 |
| | 4. Garantizar la gestión de las finanzas públicas de manera sostenible y transparente. | 3 | 6 | 18 |
| Social | 5. Proteger a las familias, garantizar sus derechos y servicios, erradicar la pobreza y promover la inclusión social. | 5 | 9 | 16 |
| | 6. Garantizar el derecho a la salud integral, gratuita y de calidad. | 6 | 12 | 38 |
| | 7. Potenciar las capacidades de la ciudadanía y promover una educación innovadora, inclusiva y de calidad en todos los niveles. | 5 | 7 | 9 |
| | 8. Generar nuevas oportunidades y bienestar para las zonas rurales, con énfasis en pueblos y nacionalidades. | 1 | 1 | 1 |
| Seguridad Integral | 9. Garantizar la seguridad ciudadana, orden público y gestión de riesgos. | 8 | 17 | 37 |
| | 10. Garantizar la soberanía nacional, integridad territorial y seguridad del estado. | 1 | 2 | 4 |
| Transición Ecológica | 11. Conservar, restaurar, proteger y hacer un uso sostenible de los recursos naturales. | 3 | 3 | 7 |
| | 12. Fomentar modelos de desarrollo sostenibles aplicando medidas de adaptación y mitigación al cambio climático. | 3 | 5 | 10 |
| | 13. Promover la gestión integral de los recursos hídricos. | 1 | 2 | 3 |
| Institucional | 14. Fortalecer las capacidades del estado con énfasis en la administración de justicia y eficiencia en los procesos de regulación y control, con independencia y autonomía. | 12 | 21 | 37 |
| | 15. Fomentar la ética pública, la transparencia y la lucha contra la corrupción. | 7 | 12 | 19 |
| | 16. Promover la integración regional, la inserción estratégica del país en el mundo y garantizar los derechos de las personas en situación de movilidad humana. | - | - | - |
| Total | | | 134 | 296 |

Nota: La cantidad de entidades está en función de la alineación de los objetivos estratégicos institucionales, los mismos que pueden estar presentes en uno o varios objetivos del PND.

Fuente: Secretaría Nacional de Planificación, Módulo Seguimiento a la Planificación Institucional del SIPeIP-Submódulo de planes institucionales corte 30 de septiembre de 2023. Herramienta de Gobiernos por Resultados GPR corte 30 de septiembre de 2023.

Elaborado: Dirección de Seguimiento a la Planificación y Política Pública

Objetivo 1: Incrementar y fomentar, de manera inclusiva, las oportunidades de empleo y las condiciones laborales

De acuerdo con el comportamiento de los indicadores que contribuyen a este objetivo, a continuación, se presenta el detalle del cumplimiento por cada entidad responsable, considerando los umbrales de semaforización establecidos.

Indicadores estratégicos

Al objetivo 1 del Plan Nacional de Desarrollo, se alinean 2 entidades a través de 3 objetivos institucionales con un total de 11 indicadores estratégicos, representando 13 periodos analizados, de los cuales el 61,54% presentan un avance esperado, 7,69% cuentan con un avance cercano al esperado y 30,77% mostraron un avance menor al esperado, como se muestra a continuación:

Tabla 28. Cumplimiento de indicadores continuos alineados al objetivo Nro. 1 del PND

| Gabinete Sectorial | Entidad | Comportamiento | Número Indicadores (A) | Periodicidad de Indicador (B) | Periodos Analizados C=(AxB) | Categorías de Cumplimiento | | |
|------------------------|--|----------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------------|----------------------------|--------------|---------------|
| | | | | | | 3 | 0 | 0 |
| Desarrollo del Talento | Ministerio de Trabajo | Continuo | 3 | Trimestral | 3 | 3 | 0 | 0 |
| | Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional | Continuo | 4 | Mensual | 4 | 0 | 1 | 3 |
| | | | 3 | Trimestral | 3 | 2 | 0 | 1 |
| | | Discreto | 1 | Trimestral | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Total | | | 11 | | 13 | 8 | 1 | 4 |
| Porcentaje | | | | | | 61,54% | 7,69% | 30,77% |

Fuente: Secretaría Nacional de Planificación, Módulo Seguimiento a la Planificación Institucional del SIPeIP-Submódulo de planes institucionales corte 30 de septiembre de 2023. Herramienta Gobierno por Resultados GPR corte 30 de septiembre de 2023.

Elaborado: Dirección de Seguimiento a la Planificación y Política Pública.

Adicionalmente, en el periodo enero a septiembre 2023 por parte de las entidades se reportan los siguientes logros:

Ministerio del Trabajo:

- ✓ Se suscribió un Convenio de Cooperación Interinstitucional con CODESPA para promover la inclusión laboral de las personas con discapacidad visual.
- ✓ Se vincularon bajo relación de dependencia a 87.221 mujeres; 133.995 jóvenes de 18 a 29 años; y, 7.950 personas que pertenecen a grupos de atención prioritaria, datos incluyen la línea base.
- ✓ 222.321 personas se colocaron en una oportunidad laboral a través del Servicio Público de Empleo, valor que incluye línea base.

Objetivo 2: Impulsar un sistema económico con reglas claras que fomente el comercio exterior, turismo, atracción de inversiones y modernización del sistema financiero nacional

De acuerdo con el comportamiento de los indicadores que contribuyen a este objetivo, a continuación, se presenta el detalle del cumplimiento por cada entidad responsable, considerando los umbrales de semaforización establecidos.

Indicadores estratégicos

Al objetivo 2 del Plan Nacional de Desarrollo, se alinean 8 entidades, a través de 19 objetivos institucionales con un total de 34 indicadores estratégicos, representando 108 periodos analizados, de los cuales el 75,00% presentan un avance esperado, 3,70% cuentan con un avance cercano al esperado, 14,81% mostraron un avance menor al esperado, y 6,48% corresponde a indicadores que no registraron resultados, como se muestra a continuación:

Tabla 29. Cumplimiento de indicadores continuos alineados al objetivo Nro. 2 del PND

| Gabinete Sectorial | Entidad | Comportamiento | Numero Indicadores (A) | Periodicidad de Indicador (B) | Periodos Analizados C=(AxB) | Categorías de Cumplimiento | | | |
|---------------------------|---|----------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------------|----------------------------|--------------|---------------|--------------|
| | | | | | | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Desarrollo de Inversiones | Autoridad Portuaria de Esmeraldas* | Continuo | 1 | Mensual | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | | Discreto | 2 | Mensual | 18 | 1 | 2 | 9 | 6 |
| | Autoridad Portuaria de Guayaquil | Continuo | 5 | Mensual | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| | Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar | Discreto | 5 | Mensual | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 |
| | Ministerio de Transporte y Obras Públicas | Continuo | 3 | Trimestral | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| | | Discreto | 6 | Trimestral | 18 | 16 | 0 | 2 | 0 |
| Desarrollo Productivo | Ministerio de Turismo | Continuo | 1 | Mensual | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 1 | Trimestral | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca. | Continuo | 3 | Trimestral | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| | | Discreto | 3 | Trimestral | 9 | 5 | 0 | 4 | 0 |
| | Servicio de Acreditación Ecuatoriano | Continuo | 2 | Mensual | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Seguridad | Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana | Continuo | 2 | Trimestral | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Total | | | 34 | | 108 | 81 | 4 | 16 | 7 |
| Porcentaje | | | | | | 75,00% | 3,70% | 14,81% | 6,48% |

Fuente: Secretaría Nacional de Planificación, Módulo Seguimiento a la Planificación Institucional del SIPeIP-Submódulo de planes institucionales corte 30 de septiembre de 2023. Herramienta Gobierno por Resultados GPR corte 30 de septiembre de 2023.

Elaborado: Dirección de Seguimiento a la Planificación y Política Pública.

Nota*: En el objetivo 2, la Autoridad Portuaria de Esmeraldas - no registró el resultado de tres indicadores, en el periodo de julio – septiembre 2023.

Adicionalmente, en el periodo enero a septiembre 2023 por parte de las entidades reportan los siguientes logros:

Ministerio de Turismo:

- ✓ 1.060.534 personas registradas por llegadas internacionales por concepto de turismo receptor.
- ✓ 6 mesas de seguridad turística en las siguientes provincias: Bolívar, Santa Elena-Santa Elena, Azuay-Cuenca, Cotopaxi-Pujilí, Galápagos-San Cristóbal, Esmeraldas-Esmeraldas.

Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana:

- ✓ 13 acciones para atraer inversiones, tales como encuentros con empresarios y cámara de comercio en Panamá, México; difusión de proyectos, talleres de políticas y entorno favorable de negocios para inversión en el país con Egipto, Israel, Japón, China y Austria; y 9 acciones para incrementar las exportaciones y diversificar la oferta exportable.

Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca:

- ✓ USD 1.234,90 millones como monto de inversión comprometido por proyectos privados que aspiran suscribir contratos de inversión con el Estado y el compromiso de generar 5.097 nuevas plazas de empleo en el país.
- ✓ 6,43 millones de toneladas de exportaciones de productos tradicionales alcanzados al tercer trimestre del 2023, lo que significó un crecimiento del 5,33%, en comparación con el mismo período 2022.

Ministerio de Transporte y Obras Públicas:

- ✓ Se presentaron informes de supervisión para el control y cumplimiento de los contratos de delegación al sector privado, con datos de inversión en mantenimiento periódico y rutinario, las cuales se han cumplido de manera satisfactoria para cinco (5) corredores, conforme el siguiente cuadro:

| Delegaciones Sector Privado Supervisadas | | |
|--|---|--------|
| Concesionario | Corredor | Km |
| PANAVIAL S. A | Rumichaca – Riobamba | 473,35 |
| CVIALCO | Guayaquil - Salinas (Chongón Santa Elena) | 162,00 |
| COSAD25 | Santo Domingo - Buena Fe | 113,00 |
| CONSUR R7H | Río Siete- Huaquillas | 105,00 |
| INTERVÍAS | Naranjal – Tenguel | 45,57 |

Fuente: Seguimiento a la ejecución del Plan Estratégico Institucional. Período: Al Tercer Trimestre 2023- GPR – MTOP.

- ✓ Se finalizaron los contratos de fiscalización referentes a:
 - La construcción del hospital básico de Pedernales de 30 camas en el cantón Pedernales provincia de Manabí.
 - La unidad educativa tipo mayor: Ventanas (Zapotal Viejo), ubicado en la parroquia Zapotal, cantón Ventanas, provincia de los Ríos.
 - Se encuentra en ejecución la Fiscalización para la culminación de la construcción de la unidad educativa estandarizada del milenio tipología mayor “González Suárez”, ubicada en la parroquia Gonzáles, cantón Otavalo, provincia de Imbabura.

Servicio de Acreditación Ecuatoriano:

- ✓ 2.536 acreditaciones realizadas por campo de Organismos de Evaluación de la Conformidad, distribuidos de la siguiente manera: Laboratorios, Certificación e Inspección.

Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar:

- ✓ 77,42% de reducción de permanencia de los buques en muelles, en este periodo los buques que arriban al puerto son en un 70% portacontenedores, manteniendo la disponibilidad de los muelles para la operatividad de los mismos, cuya permanencia promedio es de 12 horas.
- ✓ Reducción del tiempo de espera de buques en fondeadero, con un promedio de 1 hora de espera para las naves que arriban al Terminal, reflejando una eficaz atención en las operaciones de carga y descarga de las naves atracadas en muelle, debido a que en su mayoría las naves ingresan directamente al muelle ya que no existe congestión de buques en el Terminal Marítimo.

- ✓ 29 naves arribaron al terminal portuario, las cuales movilizaron un total de 184.712 TM de carga, incluyendo el movimiento del concentrado de cobre, cuya exportación asciende a un promedio mensual de 30.000 TM.

Objetivo 3: Fomentar la productividad y competitividad en los sectores agrícola, industrial, acuícola y pesquero, bajo el enfoque de la economía circular

De acuerdo con el comportamiento de los indicadores que contribuyen a este objetivo, a continuación, se presenta el detalle del cumplimiento por cada entidad responsable, considerando los umbrales de semaforización establecidos.

Indicadores estratégicos

Al objetivo 3 del Plan Nacional de Desarrollo, se alinean 6 entidades, a través de 15 objetivos institucionales con un total de 52 indicadores estratégicos, representando 56 periodos analizados, de los cuales el 66,07% tienen un avance esperado, el 19,64% cuentan con un avance cercano al esperado y el 14,29% mostraron un avance menor al esperado, como se muestra a continuación:

Tabla 30. Cumplimiento de indicadores continuos alineados al objetivo Nro. 3 del PND

| Gabinete Sectorial | Entidad | Comportamiento | Número Indicadores (A) | Periodicidad de Indicador (B) | Periodos Analizados C=(AxB) | Categorías de Cumplimiento | | |
|-----------------------|---|----------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------|---------------|
| Desarrollo Productivo | Agencia de Regulación y Control Fito y Zoonosanitario | Continuo | 6 | Trimestral | 6 | 4 | 1 | 1 |
| | Servicio Ecuatoriano de Normalización | Continuo | 1 | Mensual | 1 | 1 | 0 | 0 |
| | | | 7 | Trimestral | 7 | 7 | 0 | 0 |
| | | Discreto | 1 | Trimestral | 3 | 3 | 0 | 0 |
| | Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias | Continuo | 8 | Trimestral | 8 | 4 | 4 | 0 |
| | Ministerio de Agricultura y Ganadería | Continuo | 8 | Mensual | 8 | 4 | 0 | 4 |
| | | | 6 | Trimestral | 6 | 4 | 2 | 0 |
| | | Discreto | 1 | Trimestral | 3 | 3 | 0 | 0 |
| | Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca. | Continuo | 3 | Mensual | 3 | 1 | 0 | 2 |
| | | | 7 | Trimestral | 7 | 5 | 1 | 1 |
| Desarrollo Social | Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria | Continuo | 2 | Mensual | 2 | 1 | 1 | 0 |
| | | | 2 | Trimestral | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Total | | | 52 | | 56 | 37 | 11 | 8 |
| Porcentaje | | | | | | 66,07% | 19,64% | 14,29% |

Fuente: Secretaría Nacional de Planificación, Módulo Seguimiento a la Planificación Institucional del SIPeIP-Submódulo de planes institucionales corte 30 de septiembre de 2023. Herramienta Gobierno por Resultados GPR corte 30 de septiembre de 2023.

Elaborado: Dirección de Seguimiento a la Planificación y Política Pública.

Adicionalmente, en el periodo enero a septiembre 2023 por parte de las entidades reportan los siguientes logros relevantes:

Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca:

- ✓ 209.518 certificados sanitarios emitidos para la exportación de productos acuícolas y pesqueros.
- ✓ 639.307 documentos de trazabilidad de productos pesqueros emitidos (Certificados de Monitoreo y Control de Desembarque, Guías de Movilización de Pesca Incidental de Tiburón y Guía de Movilización de Productos de productos pesqueros).
- ✓ 2 organismos de Evaluación designados: (1) Organismo de Validación y Verificación (OVV) "UNMUNDO-ENERGÍA Y COMBUSTIBLES S.A.S mediante Resolución Nro. MPCEIP-SC-2023-0034-R; y, (2) Organismo de Certificación ASIAMBUSINESS DEL ECUADOR S.A mediante Resolución Nro. MPCEIP-SC-2023-0036-R; con esto se impulsa al desarrollo de la infraestructura de calidad en el país para el cumplimiento de estándares dentro del marco de la Política Nacional de la Calidad.

Ministerio de Telecomunicaciones y de La Sociedad de la Información:

- ✓ Campaña de sensibilización de la iniciativa "Ciclo de Formación Emprendedor Digital" a través de redes sociales del MINTEL y redes sociales de los facilitadores del proyecto "Puntos Digitales Gratuitos".
- ✓ 7.928 emprendedores, artesanos y MIPYME mejoraron sus habilidades digitales en el uso de TIC específicos para el fomento de la economía digital a través de iniciativas como ciclos de formación, brigadas digitales, etc.
- ✓ A través del proyecto "Puntos Digitales Gratuitos", se continúa fomentando las competencias digitales de la ciudadanía mediante los diferentes cursos que se dan en los espacios tecnológicos, como son: ciberseguridad, marketing digital, tienda digital, lenguajes digitales, entre otros.

Ministerio de Agricultura y Ganadería:

- ✓ 766 licencias de Aprovechamiento Forestal emitidas, con una superficie de 7.267,23 hectáreas de plantación y un volumen de producción de 940.446,76 metros cúbicos de madera comercial.
- ✓ 55.906 títulos de predios pequeños y medianos productores inscritos en el registro de la propiedad han sido regularizados al mes de septiembre.
- ✓ 1.687 organizaciones que aplican metodologías y herramientas para la gestión asociativa.

Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria:

- ✓ 22.483 actores de la EPS han participado en procesos de fortalecimiento organizativo, administrativo y/o técnico que alcanzaron resultados satisfactorios en su evaluación de conocimientos adquiridos.
- ✓ 339 organizaciones y unidades económicas productivas de la EPS articuladas al financiamiento y/o cofinanciamiento registradas.
- ✓ USD 179,46 millones de monto en ventas realizadas por las organizaciones de la EPS y Unidades Económicas Populares -UEP-, articuladas a mercados: nacional e internacional con apoyo del IEPS. (monto acumulado desde el año 2022 hasta el mes de septiembre 2023).
- ✓ 272 planes de negocio solidario asesorados a las organizaciones y unidades económicas productivas de la EPS.

Objetivo 4: Garantizar la gestión de las finanzas públicas de manera sostenible y transparente

De acuerdo con el comportamiento de los indicadores que contribuyen a este objetivo, a continuación, se presenta el detalle del cumplimiento por cada entidad responsable, considerando los umbrales de semaforización establecidos.

Indicadores estratégicos

Al objetivo 4 del Plan Nacional de Desarrollo, se alinean 3 entidades, a través de 6 objetivos institucionales con un total de 18 indicadores estratégicos, representando 36 periodos analizados, de los cuales 86,11% presentan un avance esperado, el 5,56% con un avance cercano al esperado, y el 8,33% mostraron un avance menor al esperado, como se muestra en la tabla.

Tabla 31. Cumplimiento de indicadores continuos alineados al objetivo Nro. 4 del PND

| Gabinete Sectorial | Entidad | Comportamiento | Número Indicadores (A) | Periodicidad de Indicador (B) | Periodos Analizados C=(AxB) | Categorías de Cumplimiento | | |
|------------------------|--|----------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------------|----------------------------|--------------|--------------|
| | | | | | | 2 | 0 | 0 |
| Económico y Financiero | Ministerio de Economía y Finanzas | Continuo | 2 | Mensual | 2 | 2 | 0 | 0 |
| | | | 2 | Trimestral | 2 | 1 | 1 | 0 |
| | Servicio de Rentas Internas | Continuo | 1 | Mensual | 1 | 0 | 1 | 0 |
| | | | 2 | Trimestral | 2 | 2 | 0 | 0 |
| | | | 4 | Trimestral | 12 | 10 | 0 | 2 |
| Sin Gabinete | Corporación del Seguro de Depósitos, Fondo de Liquidez y Fondo de Seguros Privados | Continuo | 2 | Trimestral | 2 | 2 | 0 | 0 |
| | | Discreto | 5 | Trimestral | 15 | 14 | 0 | 1 |
| Total | | | 18 | | 36 | 31 | 2 | 3 |
| Porcentaje | | | | | | 86,11 % | 5,56% | 8,33% |

Fuente: Secretaría Nacional de Planificación, Módulo Seguimiento a la Planificación Institucional del SIPeIP-Submódulo de planes institucionales corte 30 de septiembre de 2023. Herramienta Gobierno por Resultados GPR corte 30 de septiembre de 2023.

Elaborado: Dirección de Seguimiento a la Planificación y Política Pública.

Adicionalmente, en el periodo enero a septiembre 2023 por parte de las entidades reportan los siguientes logros:

Ministerio de Economía y Finanzas:

- ✓ 75% de la implementación de nuevas funcionalidades del Sistema Nacional de las Finanzas Públicas – SINFIP: General Portal Cognos; Tesorería: Movimiento de disponibilidades; Contabilidad: Reportes Contables; Nómina; Reformas; IESS; Administración de cuentas corrientes; Programación Financiera; Base Fiscal; Certificación Plurianual; Legalización Reprogramaciones Financieras; Integración MEF-MSP; Conciliación Bancaria; Ajustes Coberturas Institucional AYC; Carga de Estados Financieros en formato PDF.
- ✓ 98,35% de pagos efectuados en relación de los autorizados conforme a la priorización y disponibilidad de la Caja Fiscal.

Corporación del Seguro de Depósitos, Fondo de Liquidez y Fondo de Seguros Privados:

- ✓ 74,4% de beneficiarios han cancelado el Seguro de Depósito.
- ✓ 3,6 días hábiles promedio utilizados para la atención del pago de seguro de depósitos de bases de datos originales y modificadas emitidas.
- ✓ 10 títulos de crédito de entidades financieras del sector financiero privado y popular y solidario extintas emitidas y se notificó por medios digitales un título de crédito derivado de liquidación forzosa.

Servicio de Rentas Internas:

- ✓ USD 13.502 millones de recaudación de impuestos, lo que permitió alcanzar un 96% de cumplimiento de la meta esperada hasta septiembre 2023 y un crecimiento de 2,5% (USD 326 millones adicionales), en relación con el año 2022 (USD 13.176 millones.)
- ✓ 128,05% de cumplimiento en la brecha de pago de las declaraciones en monto a nivel nacional. Entre enero y septiembre 2023, la brecha de pago sobre las declaraciones alcanzó el 0,59%.
- ✓ USD 705 millones generados del cumplimiento del rendimiento establecido en los procesos de control finalizados en las direcciones zonales de auditoría tributaria, gestión tributaria y el departamento de fiscalización de grandes contribuyentes.
- ✓ 120.976 correos persuasivos enviados, correspondiente a las obligaciones vencidas del mes de agosto del ICE Mensual, IVA Mensual, y Retenciones en la Fuente.

Objetivo 5: Proteger a las familias, garantizar sus derechos y servicios, erradicar la pobreza y promover la inclusión social

De acuerdo con el comportamiento de los indicadores que contribuyen a este objetivo, a continuación, se presenta el detalle del cumplimiento por cada entidad responsable, considerando los umbrales de semaforización establecidos.

Indicadores estratégicos

Al objetivo 5 del Plan Nacional de Desarrollo, se alinean 5 entidades, a través de 9 objetivos institucionales con un total de 16 indicadores estratégicos, representando 52 periodos analizados, de los cuales el 40,38% presentan un avance esperado, el 36,54% cuentan con un avance cercano al esperado y el 23,08% mostraron un avance menor al esperado, como se muestra a continuación:

Tabla 32. Cumplimiento de indicadores continuos alineados al objetivo Nro. 5 del PND

| Gabinete Sectorial | Entidad | Comportamiento | Número Indicadores (A) | Periodicidad de Indicador (B) | Periodos Analizados C=(AxB) | Categorías de Cumplimiento | | |
|------------------------|--|----------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------|---------------|
| Desarrollo Del Talento | Ministerio de Trabajo | Continuo | 2 | Mensual | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Desarrollo Productivo | Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda | Continuo | 1 | Trimestral | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Desarrollo Social | Ministerio de Inclusión Económica y Social | Continuo | 6 | Trimestral | 6 | 4 | 1 | 1 |
| | | Discreto | 4 | Mensual | 36 | 9 | 16 | 11 |
| | Unidad del Registro Social | Discreto | 2 | Trimestral | 6 | 6 | 0 | 0 |
| Sin Gabinete | Defensoría del Pueblo | Continuo | 1 | Trimestral | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Total | | | 16 | | 52 | 21 | 19 | 12 |
| Porcentaje | | | | | | 40,38% | 36,54% | 23,08% |

Fuente: Secretaría Nacional de Planificación, Módulo Seguimiento a la Planificación Institucional del SIPeIP-Submódulo de planes institucionales corte 30 de septiembre de 2023. Herramienta Gobierno por Resultados GPR corte 30 de septiembre de 2023.

Elaborado: Dirección de Seguimiento a la Planificación y Política Pública.

Adicionalmente, en el periodo enero a septiembre 2023 por parte de las entidades reportan los siguientes logros:

Ministerio de Inclusión Económica y Social:

- ✓ 108.676 personas adultas mayores en situación de pobreza, extrema pobreza y vulnerabilidad que acceden a servicios y centros de atención gerontológica en las 4 modalidades (atención domiciliaria, centros gerontológicos residenciales, centros gerontológicos de atención diurna y espacios activos de socialización y encuentro).
- ✓ 33.490 personas que acceden a las modalidades de atención para personas con discapacidad del MIES registradas.
- ✓ 251.105 niñas y niños de 0 a 3 años de edad y mujeres gestantes que participaron en los servicios de desarrollo infantil integral a nivel nacional.
- ✓ 34 adopciones y 172 niñas, niños y adolescentes con declaratoria de adoptabilidad que se encuentran en espera de la asignación de una familia en el Comité de Asignación Familiar – CAF-, registrados en el periodo de (julio – septiembre 2023).
- ✓ 9.016 emprendimientos de usuarios que reciben el Crédito de Desarrollo Humano -CDH- y de los servicios MIES (ferias, catálogo virtual, ruedas de negocios, red de tiendas) vinculados al Sistema Nacional de Comercialización Inclusiva.
- ✓ USD 76,40 millones en Créditos de Desarrollo Humano - CDH- entregados para emprendimientos de usuarios de bonos y pensiones, que incluye el monto de USD 8,40 millones en CDH y asociativos registrados en el periodo de julio a septiembre 2023.
- ✓ 1.386.481 usuarios habilitados al pago de las transferencias monetarias no contributivas (Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable, Bono 1000 Días; Pensión Mis Mejores Años; Pensión Para Adultos Mayores; Pensión Toda Una Vida y Pensión Para Personas con Discapacidad).
- ✓ 557.466 usuarios del sistema de protección social integral han ingresado a la modalidad de pago seguro por medio de una cuenta financiera, fortaleciendo el sistema de pagos.

Ministerio del Trabajo:

- ✓ 435 inspecciones para la identificación de niñas, niños y adolescentes en situación de trabajo infantil y trabajo adolescente peligroso.
- ✓ 3.680 inspecciones de trabajo a nivel nacional con el objetivo de verificar el cumplimiento de obligaciones laborales.
- ✓ 482 inspecciones (planificadas, re inspecciones e inspecciones por denuncias) en seguridad en el trabajo y prevención de riesgos laborales.
- ✓ 576 talleres de sensibilización (valor que incluye línea base) realizados en temáticas de Derechos de Equidad con Inclusión al Trabajo, Acoso Laboral y Protocolo de Prevención y Atención de Casos de Discriminación.

Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda:

- ✓ Elaboración y actualización de la Norma Ecuatoriana de Construcción – NEC.

Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información:

- ✓ 9 parroquias rurales nuevas fueron incluidas al servicio móvil avanzado que corresponden a 2 de Azuay, 1 de Esmeraldas, 4 de Imbabura, 1 de Morona Santiago y 1 de Napo.
- ✓ 542 localidades fueron repotenciadas con tecnología 4G. Es importante indicar que, la repotenciación implica un cambio de tecnología (de 2G-3G a 4G).

- ✓ 23.874 adultos mayores adquirieron un plan del servicio móvil avanzado y 68.367 un plan para el servicio de acceso a Internet.

Unidad de Registro Social:

- ✓ 3.062.646 registros de hogares válidos actualizados en el registro de base de datos (BDD) con el 98,8% de cumplimiento sobre la meta planificada.

Objetivo 6: Garantizar el derecho a la salud integral, gratuita y de calidad

De acuerdo con el comportamiento de los indicadores que contribuyen a este objetivo, a continuación, se presenta el detalle del cumplimiento por cada entidad responsable, considerando los umbrales de semaforización establecidos.

Indicadores estratégicos

Al objetivo 6 del Plan Nacional de Desarrollo, se alinean 6 entidades, a través de 12 objetivos institucionales con un total de 38 indicadores, representando 64 periodos analizados, de los cuales el 84,38% presentan un avance esperado, el 9,38% cuentan con un avance cercano al esperado y el 6,25% cuentan con un avance menor al esperado, como se muestra a continuación:

Tabla 33. Cumplimiento de indicadores continuos alineados al objetivo Nro. 6 Del PND

| Gabinete Sectorial | Entidad | Comportamiento | Número Indicadores (A) | Periodicidad de Indicador (B) | Periodos Analizados C=(AxB) | Categorías de Cumplimiento | | |
|---|---|----------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------------|----------------------------|--------------|--------------|
| | | | | | | 3 | 0 | 0 |
| Desarrollo Social | Secretaría Técnica Ecuador Crece Sin Desnutrición Infantil | Continuo | 3 | Trimestral | 3 | 3 | 0 | 0 |
| | | Discreto | 1 | Trimestral | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Salud | Agencia de Aseguramiento de la Calidad de Servicios de Salud y Medicina Prepagada | Discreto | 12 | Trimestral | 12 | 7 | 4 | 1 |
| | Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria | Continuo | 1 | Mensual | 1 | 1 | 0 | 0 |
| | | Discreto | 6 | Trimestral | 18 | 16 | 2 | 0 |
| | Consejo Nacional de Salud | Discreto | 6 | Trimestral | 6 | 3 | 0 | 3 |
| Instituto Nacional de Donación y Trasplante de Órganos, Tejidos y Células | Continuo | 1 | Trimestral | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| | Discreto | 5 | Trimestral | 15 | 15 | 0 | 0 | |
| Sin Gabinete | Vicepresidencia de la República | Continuo | 2 | Trimestral | 2 | 2 | 0 | 0 |
| | | Discreto | 1 | Trimestral | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Total | | | 38 | | 64 | 54 | 6 | 4 |
| Porcentaje | | | | | | 84,38% | 9,38% | 6,25% |

Fuente: Secretaría Nacional de Planificación, Módulo Seguimiento a la Planificación Institucional del SIPeIP-Submódulo de planes institucionales corte 30 de septiembre de 2023. Herramienta Gobierno por Resultados GPR corte 30 de septiembre de 2023.

Elaborado: Dirección de Seguimiento a la Planificación y Política Pública.

Adicionalmente, en el periodo enero a septiembre 2023 por parte de las entidades reportan los siguientes logros:

Vicepresidencia de la República:

- ✓ Implementación de una agenda de representación que responderá a los objetivos de política pública prioritaria del Ecuador, con énfasis en el Fortalecimiento Quirúrgico Nacional como herramienta de la promoción de la Cobertura Universal de la Salud, a través del fortalecimiento de estrategias que permitan garantizar que la atención quirúrgica, obstétrica y anestésica sea accesible, segura, oportuna y asequible, así como también generar oportunidades de cooperación para la implementación del Plan de Fortalecimiento Quirúrgico Nacional.
- ✓ Consolidación de cooperación con la organización Global Surgery Foundation en estrategias de: cáncer cervical, fortalecimiento de los sistemas de trauma en Galápagos.
- ✓ Se realizó con la Organización Panamericana de Salud el análisis de estrategias regionales de sostenibilidad en las acciones de fortalecimiento de los sistemas quirúrgicos nacionales.

Agencia de Aseguramiento de la Calidad de Servicios de Salud y Medicina Prepagada:

- ✓ 76 tasas sobre los servicios que presta la entidad fueron implementadas, conforme dictamen favorable del MEF. A la fecha se han cobrado 54 tasas.
- ✓ 3.160 controles realizados a prestadores de servicios de salud habilitados.
- ✓ 1.858 procedimientos sancionatorios resueltos.
- ✓ 44 instrumentos técnicos oficializados.
- ✓ 23.070 inspecciones a Permisos de Funcionamiento ejecutadas.
- ✓ 1.027 solicitudes de Permisos para el ejercicio de terapias alternativas.
- ✓ 5.818 vigilancias realizadas a prestadores de servicios de salud no habilitados.
- ✓ 32 certificados de condiciones sanitarias.

Agencia Nacional de Regulación Control y Vigilancia Sanitaria:

- ✓ 1.916 controles a establecimientos sujetos a vigilancia y control sanitario a nivel nacional, cerrando el mes con un total anual de 17.648 de 21.651 controles planificados.
- ✓ 171 solicitudes de inscripción y modificación de medicamentos de riesgo bajo, fueron aprobadas en un tiempo igual o menor a 3 meses.
- ✓ 53 certificados de Liberación de Lote de Productos Biológicos emitidos.
- ✓ 5.400 certificados de notificación sanitaria de alimentos, suplementos, regímenes especiales y alimentos con cannabis no psicoactivo fueron emitidos.

Instituto Nacional de Donación y Transplantes de Órganos Tejidos y Células:

- ✓ 105 actividades de sensibilización fueron realizadas, llegando a 7.682 personas, de conformidad a lo establecido en la planificación realizada para el 2023, obteniendo un 100% de ejecución.
- ✓ Se evaluó el porcentaje de calidad de los tejidos procesados en el Banco Nacional de Tejidos y Células obteniendo un porcentaje de satisfacción de calidad de:
- ✓ Enero – marzo 2023: 98%.
- ✓ Abril – junio 2023: 98.3%.
- ✓ Julio – septiembre 2023: 99.20%.
- ✓ 350 córneas fueron provistas de 183 planificadas obteniendo un 191.26 % de cumplimiento, de las cuales 191 corresponden a donantes nacionales y 159 fueron trasplantes con córneas importadas.

- ✓ 11 documentos normativos entre manuales, formularios e Instrumentos de Evaluación fueron elaborados, entre los más importantes están:
 - Norma Técnica de donación de tejidos en vida.
 - Lineamientos ante la infección asociada a la covid-19 (virus sars cov-2) en los procesos de donación y trasplante.
 - Instructivo de donación en vida de tejidos.
 - Manual para la administración de la Lista de Espera Única Nacional.
 - Instructivo de acreditación y/o reacreditación para profesionales para ablación de órganos en donantes cadavéricos.
 - Instructivo de asignación corneal.
 - Norma técnica del proceso de procuración de tejido corneal de donantes cadavéricos
 - Instructivo para autorización de profesionales para ablación de tejido ocular.

Objetivo 7: Potenciar las capacidades de la ciudadanía y promover una educación innovadora, inclusiva y de calidad en todos los niveles

De acuerdo con el comportamiento de los indicadores que contribuyen a este objetivo, a continuación, se presenta el detalle del cumplimiento por cada entidad responsable, considerando los umbrales de semaforización establecidos.

Indicadores estratégicos

Al objetivo 7 del Plan Nacional de Desarrollo, se alinean 5 entidades, a través de 7 objetivos institucionales con un total de 9 indicadores estratégicos, representando 9 periodos analizados, de los cuales el 88,89% presentan un avance esperado y el 11,11% cuentan con un avance menor al esperado, como se muestra a continuación:

Tabla 34. Cumplimiento de indicadores continuos alineados al objetivo Nro. 7 del PND

| Gabinete Sectorial | Entidad | Comportamiento | Número Indicadores (A) | Periodicidad de Indicador (B) | Periodos Analizados C=(AxB) | Categorías de Cumplimiento | | |
|------------------------|--|----------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------------|----------------------------|--------------|---------------|
| Desarrollo del Talento | Ministerio del Deporte | Continuo | 2 | Trimestral | 2 | 1 | 0 | 1 |
| | Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación | Continuo | 1 | Trimestral | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Desarrollo Productivo | Instituto Nacional de Biodiversidad | Continuo | 1 | Trimestral | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Sin Gabinete | Universidad de Guayaquil | Continuo | 1 | Trimestral | 1 | 1 | 0 | 0 |
| | Universidad Técnica Estatal de Quevedo | Continuo | 4 | Trimestral | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Total | | | 9 | | 9 | 8 | 0 | 1 |
| Porcentaje | | | | | | 88,89% | 0,00% | 11,11% |

Fuente: Secretaría Nacional de Planificación, Módulo Seguimiento a la Planificación Institucional del SIPeIP-Submódulo de planes institucionales corte 30 de septiembre de 2023. Herramienta Gobierno por Resultados GPR corte 30 de septiembre de 2023.

Elaborado: Dirección de Seguimiento a la Planificación y Política Pública.

Adicionalmente, en el periodo enero a septiembre 2023, por parte de las entidades reportan los siguientes logros:

Ministerio del Deporte:

- ✓ 3 proyectos calificados a través de incentivo tributario para la optimización de 3 escenarios deportivos.
- ✓ 42 infraestructuras de escenarios deportivos optimizados.

Universidad Técnica Estatal de Quevedo:

- ✓ 59 proyectos de investigación ejecutados correspondientes a la novena convocatoria FOCICYT, además de tres proyectos con fondos externos, financiados por la Corporación Ecuatoriana para el Desarrollo de la Investigación y la Academia (CEDIA) así como por el Fondo de Investigación para la Agrobiodiversidad, Semillas y Agricultura Sustentable (FIASA) a través de los siguientes proyectos:
 1. Desarrollo de un prototipo de pesticida botánico validado en el cultivo de maíz.
 2. Elaboración y caracterización de materiales de cambio de fase obtenidos a partir de aceite de Sacha Inchi nano mejorado con materias primas locales de bajo costo.
 3. Análisis de las dinámicas territoriales para el diseño de estrategias de incidencia política y comunitaria, que minimicen los conflictos y promuevan la conservación de la Biorregión Ecuador- Perú “Cuencas Sagradas”.

Objetivo 8: Generar nuevas oportunidades y bienestar para las zonas rurales, con énfasis en pueblos y nacionalidades

De acuerdo con el comportamiento de los indicadores que contribuyen a este objetivo, a continuación, se presenta el detalle del cumplimiento por cada entidad responsable, considerando los umbrales de semaforización establecidos.

Indicadores estratégicos

Al objetivo 8 del Plan Nacional de Desarrollo, se alinea 1 entidad, a través de 1 objetivo institucional con un total de 1 indicador estratégico, representando 1 periodo analizado, de los cuales 100,00% cuenta con un avance menor al esperado, como se muestra a continuación:

Tabla 35. Cumplimiento de indicadores continuos alineados al objetivo Nro. 8 del PND

| Gabinete Sectorial | Entidad | Comportamiento | Número Indicadores (A) | Periodicidad de Indicador (B) | Periodos Analizados C=(AxB) | Categorías de Cumplimiento | | |
|---------------------------|-------------------------------|----------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------------|----------------------------|--------------|----------------|
| | | | | | | Verde | Amarillo | Rojo |
| Desarrollo de Inversiones | Ministerio de Energía y Minas | Continuo | 1 | Trimestral | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Total | | | 1 | | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Porcentaje | | | | | | 0,00% | 0,00% | 100,00% |

Fuente: Secretaría Nacional de Planificación, Módulo Seguimiento a la Planificación Institucional del SIPeIP-Submódulo de planes institucionales corte 30 de septiembre de 2023. Herramienta Gobierno por Resultados GPR corte 30 de septiembre de 2023.

Elaborado: Dirección de Seguimiento a la Planificación y Política Pública.

Objetivo 9: Garantizar la seguridad ciudadana, orden público y gestión de riesgos

De acuerdo con el comportamiento de los indicadores que contribuyen a este objetivo, a continuación, se presenta el detalle del cumplimiento de los mismos por cada entidad responsable, considerando los umbrales de semaforización establecidos.

Indicadores estratégicos

Al objetivo 9 del Plan Nacional de Desarrollo, se alinean 8 entidades, a través de 17 objetivos institucionales con un total de 37 indicadores, representando 53 periodos analizados, de los cuales el 56,60% presentan un avance esperado, el 24,53% cuentan con un avance cercano al esperado, y el 18,87% mostraron un avance menor al esperado, como se muestra a continuación:

Tabla 36. Cumplimiento de indicadores continuos alineados al objetivo Nro. 9 del PND

| Gabinete Sectorial | Entidad | Comportamiento | Número Indicadores (A) | Periodicidad de Indicador (B) | Periodos Analizados C=(AxB) | Categorías de Cumplimiento | | |
|---------------------------|--|----------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------|---------------|
| Desarrollo de Inversiones | Agencia Nacional de Tránsito | Discreto | 2 | Trimestral | 6 | 0 | 5 | 1 |
| | Comisión de Tránsito del Ecuador | Continuo | 6 | Mensual | 6 | 5 | 1 | 0 |
| | | Discreto | 1 | Trimestral | 3 | 3 | 0 | 0 |
| | Ministerio de Transporte y Obras Públicas | Continuo | 1 | Trimestral | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Seguridad | Dirección General de Aviación Civil | Continuo | 2 | Mensual | 2 | 2 | 0 | 0 |
| | | | 3 | Trimestral | 3 | 1 | 2 | 0 |
| | Servicio Integrado de Seguridad | Continuo | 1 | Trimestral | 1 | 1 | 0 | 0 |
| | | | 5 | Trimestral | 15 | 8 | 4 | 3 |
| | Policía Nacional | Continuo | 8 | Mensual | 8 | 2 | 1 | 5 |
| | | | 1 | Trimestral | 1 | 1 | 0 | 0 |
| | | | 3 | Trimestral | 3 | 2 | 0 | 1 |
| | Secretaría de Gestión de Riesgos | Continuo | 1 | Mensual | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | | | Trimestral | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| Sin Gabinete | Consejo de Desarrollo y Promoción de la Información y Comunicación | Continuo | 1 | Trimestral | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Total | | | 37 | | 53 | 30 | 13 | 10 |
| Porcentaje | | | | | | 56,60% | 24,53% | 18,87% |

Fuente: Secretaría Nacional de Planificación, Módulo Seguimiento a la Planificación Institucional del SIPEIP-Submódulo de planes institucionales corte 30 de septiembre de 2023. Herramienta Gobierno por Resultados GPR corte 30 de septiembre de 2023.

Elaborado: Dirección de Seguimiento a la Planificación y Política Pública.

Adicionalmente, en el periodo enero a septiembre 2023 por parte de las entidades reportan los siguientes logros relevantes:

Policía Nacional:

- ✓ 39 por cada 100 servidores policiales con evaluación médica y psicológica.

Consejo de Desarrollo y Promoción de la Información y Comunicación:

- ✓ 6 reportes de articulación interinstitucional para protección a trabajadores de la Comunicación.

Dirección General de Aviación Civil:

- ✓ 10 peticiones atendidas relacionadas con permisos de operación otorgados por la Dirección General de Aviación Civil, que están sujetas al Reglamento de Permisos de Operación para Servicios de Trabajos Aéreos, Actividades Conexas y Servicios Aéreos Privados

Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial:

- ✓ 89,5% de satisfacción de la percepción de la calidad del servicio de escuelas de conducción profesionales y no profesionales.
- ✓ 78,79% de satisfacción de la percepción de la calidad del servicio de transporte terrestre público.
- ✓ 44,44% de avance en la implementación en el modelo de gestión de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial.

Servicio Integrado de Seguridad ECU 911

- ✓ 2.584.433 de emergencias fueron coordinadas, de las cuales 69,82% corresponden a Seguridad Ciudadana, 11,71% a Gestión Sanitaria, 10,26% a Tránsito y Movilidad, 4,8% a Servicios Municipales, 1,71% Gestión de Siniestros, 1,21% a Servicio Militar y 0,48% a Gestión de Riesgos.
- ✓ 49.541 eventos T1 (preventivos) fueron detectados, además, 188.399 eventos T2 (en desarrollo), 61.003 eventos T3 (con apoyo de las instancias competentes), a través de las cámaras de video vigilancia, y 473 eventos ND (no definidos).
- ✓ Se diseñó la estrategia “Devolución de las llamadas, por parte de personal de Policía Nacional”, para mejorar la calidad del servicio de Seguridad Ciudadana, juntamente con la Dirección de Servicios, Procesos y Calidad.
- ✓ 5.412 cámaras para seguridad ciudadana fueron instaladas, a esto se incluye las cámaras del MINEDUC, GADS, etc.
- ✓ 66.566 controles de calidad a los procesos operativos a nivel nacional fueron realizados y se dividieron de la siguiente manera: 17.712 controles de calidad al proceso de recepción de llamadas procedentes; 18.346 controles al proceso de llamadas no procedentes; 10.311 controles al proceso de video vigilancia; 17.096 controles al proceso de despacho y 3.101 controles de unidades en sitio.
- ✓ Se elaboró el Plan Operativo “ENOS 2023” NO. 2023-002-STO-SIS-ECU-911, FENÓMENO EL NIÑO – OSCILACIÓN DEL SUR (ENOS), con la finalidad de enfrentar los efectos del ENOS mediante actividades planificadas, articuladas y coordinadas, así como las acciones preparatorias para fortalecer la capacidad de respuesta ante los impactos provocados por el ENOS y la capacidad de respuesta a las emergencias a través de la continuidad del servicio.
- ✓ Se elaboró un plan de acción respecto a la “Estrategia para el fortalecimiento de la seguridad ciudadana y convivencia social pacífica en las Instituciones de Educación Superior (IES) – Universidad Segura”, en la fase de intervención prioritaria mediante los Centros Operativos a nivel nacional para la Secretaría Técnica Ecuador “Crece sin desnutrición infantil”, a través del apoyo visual y atención y coordinación de emergencias.

Comisión de Tránsito del Ecuador:

- ✓ Reducción del 7,74% en accidentabilidad y 1,61% en morbilidad en comparación al año 2022 (período enero - septiembre 2023).
- ✓ 8.337 operativos, de los cuales resultaron 107 personas detenidas, 1.264 automotores y 556 motos retenidas.
- ✓ 539 accidentes de tránsito y 136 emergencias médicas fueron atendidos bajo participación del grupo especializado de la Unidad de Rescate y Emergencia Médica -UREM-, de los cuales se rescataron 803 personas heridas y 91 personas fallecidas.
- ✓ 28.433 diligencias periciales realizadas, las cuales comprenden: investigaciones, reconocimientos del lugar de los hechos, reconstrucciones de escenas, avalúos de vehículos, inspecciones técnicas ocular, análisis de audio y video; así como también el levantamiento de 1.087 cadáveres, sobre las jurisdicciones que tiene la CTE y aquellas solicitadas por la Fiscalía.
- ✓ 3.312 capacitaciones en Educación Vial, dirigidos a personas de instituciones públicas, privadas, operadoras de transporte y estudiantes.

Objetivo 10: Garantizar la soberanía nacional, integridad territorial y seguridad del Estado

De acuerdo con el comportamiento de los indicadores que contribuyen a este objetivo, a continuación, se presenta el detalle del cumplimiento por cada entidad responsable, considerando los umbrales de semaforización establecidos.

Indicadores estratégicos

Al objetivo 10 del Plan Nacional de Desarrollo, se alinea 1 entidad, a través de 2 objetivos institucionales con un total de 4 indicadores, representando 4 periodos analizados, de los cuales el 75,00% presentan un avance esperado y el 25,00% cuentan con un avance cercano al esperado, como se muestra a continuación:

Tabla 37. Cumplimiento de indicadores continuos alineados al objetivo Nro. 10 del PND

| Gabinete Sectorial | Entidad | Comportamiento | Número Indicadores (A) | Periodicidad de Indicador (B) | Periodos Analizados C=(AxB) | Categorías de Cumplimiento | | |
|--------------------|------------------------------|----------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------|--------------|
| | | | | | | 3 | 1 | 0 |
| Seguridad | Instituto Geográfico Militar | Continuo | 4 | Trimestral | 4 | 3 | 1 | 0 |
| Total | | | 4 | | 4 | 3 | 1 | 0 |
| Porcentaje | | | | | | 75,00% | 25,00% | 0,00% |

Fuente: Secretaría Nacional de Planificación, Módulo Seguimiento a la Planificación Institucional del SIPeIP-Submódulo de planes institucionales corte 30 de septiembre de 2023. Herramienta Gobierno por Resultados GPR corte 30 de septiembre de 2023.

Elaborado: Dirección de Seguimiento a la Planificación y Política Pública.

Adicionalmente, en el periodo enero a septiembre 2023 por parte de las entidades reportan los siguientes logros:

Ministerio de Telecomunicaciones y de La Sociedad de la Información:

- ✓ 273 funcionarios de la Corte Nacional de Justicia, MINEDUC, EPN, IAEN, CONQUITO y MIES fueron capacitados a través de los “Talleres de Ciberhigiene y buenas prácticas de ciberseguridad”, del 16 al 19 de enero de 2023.

- ✓ 36 funcionarios y autoridades de las instituciones que pertenecen al Comité Nacional de Ciberseguridad (MIDENA, MREMH, MDG, MDI, CIES, MINTEL, Presidencia), fueron capacitadas con talleres en formato de ejercicio de gestión de crisis cibernéticas, a nivel técnico para fortalecer la ciberseguridad a nivel país. Los talleres fueron: “Ejercicio de Gestión de Crisis Cibernéticas” y “High-level Cybersecurity Table -Top Exercise”.
- ✓ 76 certificados de aprobación fueron generados por el Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información (MINTEL) con apoyo del organismo internacional CYBER4DEV, luego de la Presentación de la Plataforma “Cyber Hygiene e-Learning platform” a los OSI’S de las Instituciones de la APC (Administración Pública Central).

Instituto Geográfico Militar:

- ✓ Se generó 2,8584% de la base de datos a escala 1:25.000 de fotografía aérea o imágenes de satélite, cubriéndose parcialmente los siguientes sectores: Cartografía generalizada (1.843 km²) y cartografía restituída (2.764 km²) de los sectores de: San Antonio, Zumbahua, Colimes, Sinsao, Guayusa, Boyacá, El Porvenir, San Isidro, Cochapamba, El Limón, Zapotal y Gahujion.
- ✓ 24 mapas temáticos de cartografía electoral provincial enviado para planificación de operaciones militares en apoyo al Proceso Electoral 2023.
- ✓ Se generaron especificaciones técnicas para la elaboración de planos de evacuación de los habitantes de la Ciudad de Latacunga en razón de posible erupción del Volcán Cotopaxi en coordinación con la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos.
- ✓ Revisión de Atlas de Espacios Expuestos a las Amenazas del Fenómeno del Niño.

Objetivo 11: Conservar, restaurar, proteger y hacer un uso sostenible de los recursos naturales.

De acuerdo con el comportamiento de los indicadores que contribuyen a este objetivo, a continuación, se presenta el detalle del cumplimiento por cada entidad responsable, considerando los umbrales de semaforización establecidos.

Indicadores estratégicos

Al objetivo 11 del Plan Nacional de Desarrollo, se alinean 3 entidades, a través de 3 objetivos institucionales con un total de 7 indicadores estratégicos, representando 15 periodos analizados, de los cuales el 86,67% presentan un avance esperado y el 13,33% cuentan con un avance cercano al esperado, como se muestra a continuación:

Tabla 38. Cumplimiento de indicadores continuos alineados al objetivo Nro. 11 del PND

| Gabinete Sectorial | Entidad | Comportamiento | Número Indicadores (A) | Periodicidad de Indicador (B) | Periodos Analizados C=(AxB) | Categorías de Cumplimiento | | |
|---------------------------|--|----------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------|--------------|
| Desarrollo de Inversiones | Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales no Renovables | Discreto | 4 | Trimestral | 12 | 10 | 2 | 0 |
| Desarrollo Productivo | Agencia de Regulación y Control de la Bioseguridad y Cuarentena para Galápagos | Continuo | 2 | Trimestral | 2 | 2 | 0 | 0 |
| | Instituto Nacional de Biodiversidad | Continuo | 1 | Trimestral | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Total | | | 7 | | 15 | 13 | 2 | 0 |
| Porcentaje | | | | | | 86,67% | 13,33% | 0,00% |

Fuente: Secretaría Nacional de Planificación, Módulo Seguimiento a la Planificación Institucional del SIPeIP-Submódulo de planes institucionales corte 30 de septiembre de 2023. Herramienta Gobierno por Resultados GPR corte 30 de septiembre de 2023.

Elaborado: Dirección de Seguimiento a la Planificación y Política Pública.

Adicionalmente, en el periodo enero a septiembre 2023 por parte de las entidades reportan los siguientes logros:

Agencia de Regulación y Control de la Bioseguridad y Cuarentena para Galápagos:

- ✓ 13,49% del índice de ingreso de especies introducidas a las islas Galápagos alcanzado, que contempla la aplicación de normativa vigente, procedimientos de inspección de carga – equipaje - medios de transporte, cuarentena, inocuidad alimentaria y vigilancia, estableciendo con este índice que el riesgo de introducción intencional o accidental de especies exógenas a las islas Galápagos es bajo y manejable.

Instituto Nacional de Biodiversidad:

- ✓ 3 colecciones científicas actualizadas: 1) Nueva versión del manual de colecciones de zoología, 2) Protocolo de egreso de especímenes a las colecciones del INABIO, y 3) Depuración de la colección de entomología y la identificación y asociación de tejidos.
- ✓ 3.097 visitantes asistieron a exposiciones itinerantes en varias instituciones educativas y espacios públicos en las ciudades de Santo Domingo y en Milagro, además se realizaron encuestas de satisfacción obteniendo un 93,3% de satisfacción con el objeto de optimizar el servicio brindado en áreas de exhibición.

Objetivo 12: Fomentar modelos de desarrollo sostenibles aplicando medidas de adaptación y mitigación al Cambio Climático

De acuerdo con el comportamiento de los indicadores que contribuyen a este objetivo, a continuación, se presenta el detalle del cumplimiento por cada entidad responsable, considerando los umbrales de semaforización establecidos.

Indicadores estratégicos

Al objetivo 12 del Plan Nacional de Desarrollo, se alinean 3 entidades, a través de 5 objetivos institucionales con un total de 10 indicadores estratégicos, representando 28 periodos analizados, de los cuales el 96,43%, presentan un avance esperado y el 3,57% cuentan con un avance cercano al esperado, como se muestra a continuación:

Tabla 39. Cumplimiento de indicadores continuos alineados al objetivo Nro. 12 del PND

| Gabinete Sectorial | Entidad | Comportamiento | Número Indicadores (A) | Periodicidad de Indicador (B) | Periodos Analizados C=(AxB) | Categorías de Cumplimiento | | |
|---------------------------|---------------------------------------|----------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------------|----------------------------|--------------|--------------|
| | | | | | | 1 | 0 | 0 |
| Desarrollo de Inversiones | Autoridad Portuaria de Manta | Continuo | 1 | Trimestral | 1 | 1 | 0 | 0 |
| | Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar | Discreto | 1 | Mensual | 9 | 8 | 1 | 0 |
| | Operador Nacional de Electricidad | Continuo | 3 | Trimestral | 3 | 3 | 0 | 0 |
| | | Discreto | 5 | Trimestral | 15 | 15 | 0 | 0 |
| Total | | | 10 | | 28 | 27 | 1 | 0 |
| Porcentaje | | | | | | 96,43% | 3,57% | 0,00% |

Fuente: Secretaría Nacional de Planificación, Módulo Seguimiento a la Planificación Institucional del SIPeIP-Submódulo de planes institucionales corte 30 de septiembre de 2023. Herramienta Gobierno por Resultados GPR corte 30 de septiembre de 2023.

Elaborado: Dirección de Seguimiento a la Planificación y Política Pública.

Adicionalmente, en el periodo enero a septiembre 2023 por parte de las entidades reportan los siguientes logros:

Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar:

- ✓ 965 Kg. de desechos sólidos se recolectaron y evacuaron con corte a septiembre del 2023, reflejando el cumplimiento del 99,90 %, de la meta.

Objetivo 13: Promover la gestión integral de los recursos hídricos

De acuerdo con el comportamiento de los indicadores que contribuyen a este objetivo, a continuación, se presenta el detalle del cumplimiento por cada entidad responsable, considerando los umbrales de semaforización establecidos.

Indicadores estratégicos

Al objetivo 13 del Plan Nacional de Desarrollo, se alinea 1 entidad, a través de 2 objetivos institucionales con un total de 3 indicadores estratégicos, representando 7 periodos analizados, de los cuales el 85,71%, presentan un avance esperado y el 14,29% mostraron un avance menor al esperado, como se muestra a continuación:

Tabla 40. Cumplimiento de indicadores continuos alineados al objetivo Nro. 12 del PND

| Gabinete Sectorial | Entidad | Comportamiento | Número Indicadores (A) | Periodicidad de Indicador (B) | Periodos Analizados C=(AxB) | Categorías de Cumplimiento | | |
|-----------------------|--|----------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------------|----------------------------|--------------|---------------|
| | | | | | | 1 | 0 | 0 |
| Desarrollo Productivo | Agencia de Regulación y Control del Agua | Continuo | 1 | Trimestra I | 1 | 1 | 0 | 0 |
| | | Discreto | 2 | Trimestra I | 6 | 5 | 0 | 1 |
| Total | | | 3 | | 7 | 6 | 0 | 1 |
| Porcentaje | | | | | | 85,71% | 0,00% | 14,29% |

Fuente: Secretaría Nacional de Planificación, Módulo Seguimiento a la Planificación Institucional del SIPeIP-Submódulo de planes institucionales corte 30 de septiembre de 2023. Herramienta Gobierno por Resultados GPR corte 30 de septiembre de 2023.

Elaborado: Dirección de Seguimiento a la Planificación y Política Pública.

Adicionalmente, en el periodo enero a septiembre 2023 por parte de las entidades reportan los siguientes logros:

Agencia de Regulación y Control del Agua:

- ✓ 5.075.492 personas beneficiadas, con el abastecimiento y mejora de la calidad del recurso hídrico ejecutado a través del Plan de Control de la Agencia de Regulación y Control del Agua, efectuado a 38 GAD, en el tercer trimestre.

Objetivo 14: Fortalecer las capacidades del Estado con énfasis en la administración de justicia y eficiencia en los procesos de regulación y control, con independencia y autonomía

De acuerdo con el comportamiento de los indicadores que contribuyen a este objetivo, a continuación, se presenta el detalle del cumplimiento por cada entidad responsable, considerando los umbrales de semaforización establecidos.

Indicadores estratégicos

Al objetivo 14 del Plan Nacional de Desarrollo, se alinean 12 entidades, a través de 21 objetivos institucionales con un total de 37 indicadores estratégicos, representando 65 periodos analizados, de los cuales el 80,00% presentan un avance esperado, el 3,08% cuentan con un avance cercano al esperado, y el 16,92% mostraron un avance menor al esperado, como se muestra a continuación:

Tabla 41. Cumplimiento de indicadores continuos alineados al objetivo Nro. 14 del PND

| Gabinete Sectorial | Entidad | Comportamiento | Número Indicadores (A) | Periodicidad de Indicador (B) | Periodos Analizados C=(Ax B) | Categorías de Cumplimiento | | |
|--------------------------------------|---|----------------|------------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------------|--------------|---------------|
| Desarrollo De Inversiones | Ministerio de Energía y Minas | Discreto | 1 | Trimestral | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Desarrollo Del Talento | Ministerio de Trabajo | Continuo | 1 | Mensual | 1 | 1 | 0 | 0 |
| | | | 4 | Trimestral | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Desarrollo Territorial | Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones | Continuo | 2 | Mensual | 2 | 1 | 0 | 1 |
| | | | 2 | Trimestral | 2 | 2 | 0 | 0 |
| | Dirección General de Registro Civil Identificación y Cedulación | Continuo | 2 | Mensual | 2 | 2 | 0 | 0 |
| | Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información | Continuo | 1 | Mensual | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Económico y Financiero | Servicio Nacional de Contratación Pública | Discreto | 1 | Trimestral | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Seguridad | Dirección General de Aviación Civil | Continuo | 1 | Trimestral | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Sin Gabinete | Consejo De Desarrollo Y Promoción De La Información Y Comunicación | Discreto | 2 | Trimestral | 2 | 0 | 0 | 2 |
| | Defensoría del Pueblo | Continuo | 2 | Mensual | 2 | 0 | 1 | 1 |
| | | | 2 | Trimestral | 2 | 2 | 0 | 0 |
| | Instituto Nacional de Estadística y Censos | Continuo | 4 | Trimestral | 4 | 4 | 0 | 0 |
| | Secretaría Técnica de Gestión Inmobiliaria del Sector Público | Discreto | 11 | Trimestral | 33 | 26 | 1 | 6 |
| Secretaría Nacional de Planificación | Discreto | 1 | Trimestral | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| Total | | | 37 | | 65 | 52 | 2 | 11 |
| Porcentaje | | | | | | 80,00% | 3,08% | 16,92% |

Fuente: Secretaría Nacional de Planificación, Módulo Seguimiento a la Planificación Institucional del SIPeIP-Submódulo de planes institucionales corte 30 de septiembre de 2023. Herramienta Gobierno por Resultados GPR corte 30 de septiembre de 2023.

Elaborado: Dirección de Seguimiento a la Planificación y Política Pública.

Adicionalmente, en el periodo enero a septiembre 2023 por parte de las entidades reportan los siguientes logros:

Instituto Nacional de Estadística y Censos:

- ✓ 43,75% de avance en el marco del diseño/implementación de instrumentos de planificación estadística nacional.
- ✓ 45% de avance acumulado en el marco del Plan de fortalecimiento estadístico para el Sistema Estadístico Nacional (SEN).
- ✓ 44,85% de avance acumulado a nivel de estadísticas sociales, económicas y agropecuarias en el marco de la automatización de operaciones estadísticas.
- ✓ 14 talleres técnicos ejecutados con actores externos (Escuela Politécnica Nacional – EPN; MIES, Secretaría Técnica Ecuador Crece Sin Desnutrición Infantil y Banco Mundial) en el marco de incrementar el acceso a estadísticas oficiales de manera oportuna y transparente.

Ministerio del Trabajo:

- ✓ 133 entidades evaluadas, que se postularon a uno de los niveles de madurez del Modelo Ecuatoriano de Calidad y Excelencia.
- ✓ 25 entidades fueron asesoradas y/o capacitadas en temas de calidad y excelencia, mejora continua en la prestación de los servicios públicos, y atención ciudadana.

Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información:

- ✓ 160 trámites simplificados en entidades de diferentes funciones del Estado y municipios del país., gracias a 110 planes de simplificación de trámites.
- ✓ 1000 conjuntos de datos publicados en el portal de datos abiertos <https://datosabiertos.gob.ec/> gracias a la capacitación y acompañamiento a entidades de la Administración Central.

Secretaría Técnica de Gestión Inmobiliaria del Sector Público:

- ✓ 290 informes técnicos y/o certificados avalúos de bienes inmuebles, esta actividad se cumplió en doce provincias.
- ✓ USD 221.587,61 en concepto de ahorro para el Estado, que proviene de la ejecución de trabajos de mantenimiento realizados por el personal de cuadrilla efectuados a escala nacional.

Defensoría del Pueblo:

- ✓ 3.716 casos atendidos de 9.638 casos ingresados.
- ✓ 101.863 casos cerrados de 133.389 casos ingresados.
- ✓ 242 acciones estratégicas para el mejoramiento del ejercicio de derechos, en situaciones sistemáticas, generalizadas y de relevancia social.

Consejo de Desarrollo y Promoción de la Información y Comunicación:

- ✓ 10 cursos virtuales de capacitación a trabajadores de la comunicación beneficiando a 675 personas ligadas con el sector.

Dirección General de Aviación Civil:

- ✓ 133 certificaciones emitidas en el marco de la Certificación y Habilitación del personal de Seguridad de la Aviación, beneficiando a: guardias, agentes, supervisores, jefes e Instructores.

Dirección General de Registro Civil Identificación y Cedulación:

- ✓ 99,9% de estabilización en la disponibilidad de infraestructura como, plataformas de software, redes, comunicaciones y aplicaciones.

Objetivo 15: Fomentar la ética pública, la transparencia y la lucha contra la corrupción

De acuerdo con el comportamiento de los indicadores que contribuyen a este objetivo, a continuación, se presenta el detalle del cumplimiento por cada entidad responsable, considerando los umbrales de semaforización establecidos.

Indicadores estratégicos

Al objetivo 15 del Plan Nacional de Desarrollo, se alinean 7 entidades, a través de 12 objetivos institucionales con un total de 19 indicadores estratégicos, representando 43 periodos analizados, de los cuales el 81,40% presentan un avance esperado, el 9,30% cuentan con un avance cercano al esperado, y el 9,30% mostraron un avance menor al esperado, como se muestra a continuación:

Tabla 42. Cumplimiento de indicadores continuos alineados al objetivo Nro. 15 del PND

| Gabinete Sectorial | Entidad | Comportamiento | Número Indicadores (A) | Periodicidad de Indicador (B) | Periodos Analizados C=(AxB) | Categorías de Cumplimiento | | |
|------------------------|---|----------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------------|----------------------------|--------------|--------------|
| Desarrollo Del Talento | Ministerio del Deporte | Continuo | 1 | Trimestral | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Desarrollo Territorial | Dirección General de Registro Civil Identificación y Cedulación | Continuo | 5 | Mensual | 5 | 3 | 1 | 1 |
| | | | 1 | Trimestral | 1 | 0 | 0 | 1 |
| | Dirección Nacional de Registros Públicos | Discreto | 3 | Trimestral | 9 | 7 | 1 | 1 |
| | | Discreto | 4 | Trimestral | 12 | 12 | 0 | 0 |
| Económico y Financiero | Servicio Nacional de Contratación Pública | Discreto | 1 | Mensual | 9 | 8 | 1 | 0 |
| Sin Gabinete | Consejo Nacional Electoral | Discreto | 2 | Mensual | 2 | 1 | 0 | 1 |
| | Defensoría Del Pueblo | Continuo | 1 | Trimestral | 1 | 1 | 0 | 0 |
| | Secretaría Nacional de Planificación | Discreto | 1 | Trimestral | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Total | | | 19 | | 43 | 35 | 4 | 4 |
| Porcentaje | | | | | | 81,40% | 9,30% | 9,30% |

Fuente: Secretaría Nacional de Planificación, Módulo Seguimiento a la Planificación Institucional del SIPeIP-Submódulo de planes institucionales corte 30 de septiembre de 2023. Herramienta Gobierno por Resultados GPR corte 30 de septiembre de 2023.

Elaborado: Dirección de Seguimiento a la Planificación y Política Pública.

Adicionalmente, en el periodo enero a septiembre 2023 por parte de las entidades reportan los siguientes logros:

Consejo Nacional Electoral:

- ✓ 3.008 ataques informáticos fueron resueltos y los servicios de infraestructura tecnológica y comunicaciones estuvieron disponibles.

Dirección General de Registro Civil Identificación y Cedulación:

- ✓ 196.570 inscripciones de nacimiento a nivel nacional.
- ✓ 430.587 inscripciones de niños nacidos hasta después de 180 días después de su nacimiento.
- ✓ 419.750 ciudadanos cedulados por primera vez en el sistema biométrico.
- ✓ 742.650 pasaportes emitidos.
- ✓ 29.648 firmas electrónicas entregadas.
- ✓ 593.356 solicitudes de actas registrales atendidas.

Objetivo 16: Promover la integración regional, la inserción estratégica del país en el mundo y garantizar los derechos de las personas en situación de movilidad humana

Dentro del periodo de análisis enero-septiembre de 2023, no existen entidades con programación trimestral que estén alineadas a este objetivo.

CAPITULO III

SEGUIMIENTO DEL PLAN ANUAL DE INVERSIONES – PAI 2023

3.1 Metodología aplicada

La metodología aplicada en el proceso de seguimiento se sustenta en la programación física y presupuestaria que realizan las entidades responsables de la ejecución de los estudios, programas y proyectos de inversión que conforman el Plan Anual de Inversiones. Asimismo, las entidades ejecutoras reportan el avance de las metas físicas por componente de manera trimestral. La herramienta tecnológica utilizada en el proceso de seguimiento es el Módulo de Seguimiento a la Planificación Institucional, del Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública – SIPeIP. La información correspondiente a la ejecución presupuestaria, se lo obtiene del Sistema e-SIGEF, administrado por el Ministerio de Economía y Finanzas.

Dado que existe una vinculación entre la planificación y el presupuesto, es necesario conocer el presupuesto ejecutado (devengado más anticipo) por cada proyecto de inversión con relación al presupuesto programado¹¹; para tal efecto, se dispone de la base de datos del Sistema Integrado de Gestión Financiera (e-SIGEF) que incluye todas las fuentes de financiamiento y la deuda pública correspondiente al Programa de Preservación de Capital del ejercicio 2023 de responsabilidad del Ministerio de Economía y Finanzas (se excluye capital no atado a proyectos).

Con la información consolidada, que ha sido reportada por las entidades en el Módulo Seguimiento del SIPeIP, se elabora una base de datos, que incluye cada uno de los campos que se generan en el mencionado módulo, posteriormente se incluye la información correspondiente a la ejecución presupuestaria obtenida del sistema e-SIGEF. La base de datos registra la alineación que realizaron las entidades de los estudios, programas y proyectos de inversión con respecto a los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 2021-2025, lo cual permite realizar un análisis comparativo del porcentaje de avance de metas físicas y porcentaje de ejecución presupuestaria, con relación a los objetivos nacionales.

Adicionalmente, en el Anexo 1 del presente informe se detalla la alineación de los estudios programas y proyectos de inversión a las metas del Plan Nacional de Desarrollo y consecuentemente a las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), considerando que, en el proceso de formulación del Plan Nacional de Desarrollo se aplicó la metodología de alineación del PND 2021-2025 a los ODS de la Agenda 2030, desarrollada por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

Es importante resaltar que, las instituciones ejecutoras son las responsables de la veracidad y la calidad de la información que constituye la base para la elaboración del presente informe.

Categorías de cumplimiento o semaforización

Para el análisis del avance físico y presupuestario de los estudios, programas y/o proyectos de inversión se establecen categorías de cumplimiento o semaforización de cumplimiento de metas, con base en umbrales de valoración, permitiendo que las instituciones contrasten el desempeño observado con relación a lo programado.

¹¹ El presupuesto programado corresponde a la información remitida de manera oficial por las entidades que ejecutan estudios, programas y proyectos de inversión que conforman el Plan Anual de Inversiones que se financian con recursos de Gasto No Permanente.

La semaforización del cumplimiento de metas permitirá a las instituciones ejecutoras generar acciones preventivas o correctivas, que permitan mejorar la ejecución de los estudios, programas y proyectos de inversión.

Categorías de cumplimiento de metas físicas

La semaforización del avance físico de los estudios, programas y proyectos de inversión se basa en la relación entre el reporte de los resultados físicos alcanzados y la programación para el periodo de análisis. Las categorías de cumplimiento de las metas físicas establecidas son¹²:

Tabla 43. Semaforización metas físicas

| Categoría | Umbral | Categorías de cumplimiento |
|-----------|---------------|---|
| ● | ≥ 100% | Alto cumplimiento de metas ejecutadas respecto a las metas programadas |
| ● | ≥90% y < 100% | Parcial cumplimiento de metas ejecutadas respecto a las metas programadas |
| ● | < 90% | Bajo cumplimiento de metas ejecutadas respecto a las metas programadas |

Fuente: Secretaría Nacional de Planificación

Categorías de cumplimiento de ejecución presupuestaria

El análisis presupuestario de los proyectos de inversión contempla el presupuesto codificado y ejecutado (devengado + anticipo) con corte al 30 de septiembre de 2023. Se incluye grupo de gasto 96 (Amortización de la Deuda Pública¹³) correspondiente al Programa de Preservación de Capital período 2023, cuya entidad responsable es el Ministerio de Economía y Finanzas.

La semaforización de la ejecución presupuestaria de los estudios, programas y proyectos de inversión corresponde a la relación entre presupuesto ejecutado (devengado más anticipo) y la programación de ejecución presupuestaria trimestral. Las categorías de cumplimiento de ejecución presupuestaria establecidas son¹⁴:

Tabla 44. Semaforización de ejecución presupuestaria

| Categoría | Umbral | Categorías de cumplimiento |
|-----------|---------------|---|
| ● | ≥ 100% | Alto cumplimiento de metas ejecutadas respecto a las metas programadas |
| ● | ≥90% y < 100% | Parcial cumplimiento de metas ejecutadas respecto al presupuesto programado |
| ● | < 90% | Bajo cumplimiento de metas ejecutadas respecto al presupuesto programado |

Fuente: Secretaría Nacional de Planificación

¹² Para definir la semaforización o categorías de cumplimientos de metas físicas en el presente informe se tomó como referencia los umbrales establecidos en la Norma Técnica de Gobierno por Resultados emitida mediante Acuerdo Nro. SNP-SNP-2022-0006-A, el 13 de febrero de 2022.

¹³ Amortización de Deuda Pública: Recursos para la amortización de obligaciones por la colocación de títulos - valores emitidos por entidades del sector público y por la contratación de préstamos externos e internos.

¹⁴ Para definir la semaforización o categorías de cumplimientos de metas físicas en el presente informe se tomó como referencia los umbrales establecidos en la Norma Técnica de Gobierno por Resultados emitida mediante Acuerdo Nro. SNP-SNP-2022-0006-A, emitido el 13 de febrero de 2022.

3.2. Estructura y ejecución del Plan Anual de Inversiones – PAI 2023

El Plan Anual de Inversiones (PAI) 2023 con corte al 30 de septiembre de 2023 está conformado por 561 proyectos de inversión, ejecutados por 87 entidades del sector público.

De conformidad a lo establecido en el artículo 60 de Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, y el artículo 47 del Reglamento al Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, de los 561 proyectos que conforman el PAI, la Secretaría Nacional de Planificación emitió dictamen de prioridad a 285 proyectos (278 cuentan con dictamen de prioridad, de los cuales, 2 se encuentran sin dictamen vigente y 1 sin alineación al PND 2021-2025; de los 285 proyectos 4 se encuentra sin dictamen de prioridad, mismos que no tienen presupuesto codificado). Por otro lado, de 270 proyectos sus dictámenes de prioridad son emitidos por la máxima autoridad de las Universidades y Escuelas Politécnicas.

Adicionalmente, la Secretaría Técnica de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica cuenta con un total de 5 proyectos, y el Consejo de Gobierno de Régimen Especial de Galápagos cuenta con 1 proyecto, cuyos dictámenes de prioridad son emitidos por las propias entidades en el marco de sus competencias, de acuerdo a lo que establece la normativa legal vigente.

Tabla 45. Estructura del PAI de acuerdo con la emisión del dictamen de prioridad (millones de dólares)

| Estructura Dictamen de Prioridad | Nro. Proyectos | Presupuesto Codificado | Anticipo | Presupuesto Devengado | Presupuesto Ejecutado | % Participación Presupuesto Codificado |
|---|----------------|------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|--|
| | | (a) | (b) | (c) | (d=b+c) | |
| Secretaría Nacional de Planificación | 285 | 6.606,81 | 112,73 | 3.679,07 | 3.791,80 | 96,07% |
| Universidades y Escuelas Politécnicas | 270 | 191,49 | 9,74 | 41,01 | 50,75 | 2,78% |
| Secretaría Técnica de La Circunscripción Territorial Especial Amazónica | 5 | 65,32 | 0,16 | 42,42 | 42,58 | 0,95% |
| Consejo de Gobierno de Régimen Especial de Galápagos | 1 | 13,38 | 1,17 | 1,75 | 2,92 | 0,19% |
| Total | 561 | 6.876,99 | 123,80 | 3.764,26 | 3.888,06 | 100,00% |

Fuente: Módulo Seguimiento a la Planificación Institucional del Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública – SIPeIP, Secretaría Nacional de Planificación. Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF, Ministerio de Economía y Finanzas - Ejecución Presupuestaria. Corte 30 de septiembre de 2023.

Por otra parte, 556 de los 561 proyectos de inversión cuentan con registro de alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2021-2025 en el módulo de seguimiento del SIPeIP. Los 5 proyectos restantes, que no presentan alineación, corresponden a proyectos sin presupuesto codificado, por lo tanto, estos no son sujetos de seguimiento.

De los 556 proyectos que cuentan con alineación al PND 2021-2025 en el módulo de seguimiento del SIPeIP, 378 proyectos cuentan con programación de metas físicas para el tercer trimestre de 2023, mientras que, 178 proyectos no tienen programación para el mencionado periodo.

En cuanto a la estructura presupuestaria, de los 561 proyectos que conforman el Plan Anual de Inversiones 2023 al tercer trimestre, 11 proyectos no registran presupuesto codificado al 30 de septiembre 2023.

**Tabla 46. Detalle de proyectos
 (millones de dólares)**


| Detalle proyecto | Nro. Proyectos | Presupuesto Codificado | Anticipo | Presupuesto Devengado | Presupuesto Ejecutado |
|--|----------------|------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| | | (a) | (b) | (c) | (d=b+c) |
| Proyectos con Programación de Ejecución de Metas – 3er Trimestre 2023(*) | 378 | 6.344,17 | 95,65 | 3.651,30 | 3.746,95 |
| Proyectos sin Programación de Ejecución de Metas – 2do Trimestre 2023 | 173 | 532,82 | 28,15 | 112,96 | 141,11 |
| Proyectos sin presupuesto codificado al 30 de septiembre del 2023 | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 561 | 6.876,99 | 123,80 | 3.764,26 | 3.888,06 |

(*) De los 378 proyectos que programaron su ejecución de metas en el III trimestre 4 proyectos (CUP 175200000.0000.387614; 50500000.0000.388027; 91480000.0000.3888416; 91730000.0000.388125), no registran monto codificado al 30 de septiembre 2023.

Fuente: Módulo Seguimiento a la Planificación Institucional del Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública – SIpEIP, Secretaría Nacional de Planificación. Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF, Ministerio de Economía y Finanzas - Ejecución Presupuestaria. Corte 30 de septiembre 2023.

Al 30 de septiembre de 2023, el Plan Anual de Inversiones cuenta con un valor codificado de USD 6.876,99 millones (incluye amortización de Deuda Pública por USD 4.421,13 millones del programa de preservación de capital), mientras que, el presupuesto ejecutado (presupuesto devengado más anticipo) fue de USD 3.888,06 millones (incluye amortización de deuda pública por USD 2.919,43 millones), lo que representa una ejecución del 56,51%¹⁵.

**Gráfico 5. Ejecución del Plan Anual de Inversiones
 (millones de dólares)**



Fuente: Módulo Seguimiento a la Planificación Institucional del Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública – SIpEIP, Secretaría Nacional de Planificación. Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF, Ministerio de Economía y Finanzas - Ejecución Presupuestaria. Corte 30 de septiembre de 2023.

Considerando los ejes del Plan Nacional de Desarrollo 2021-2025, el eje Social cuenta con la mayor cantidad de proyectos (320 de 561 proyectos) y con una participación presupuestaria del 12,90% (presupuesto codificado). A continuación, se detalla el número de proyectos y el presupuesto de acuerdo con la alineación por cada eje y objetivo del plan.

¹⁵ Se incluye grupo de gasto 96 (Amortización de la Deuda Pública), del “Programa de preservación de capital periodo 2023”, cuya entidad responsable es el Ministerio de Economía y Finanzas. El presupuesto codificado y devengado del programa al 30 de septiembre de 2023 es de USD 4.600,27 millones y USD 2.990,46 millones; respectivamente.

Tabla 47. Presupuesto del Plan Anual de Inversiones (gasto no permanente) por ejes y objetivos del Plan Nacional de Desarrollo
(millones de dólares)

| Eje PND 2021-2025 | Nro. Objetivo PND 2021-2025 | Nro. Proyectos | Presupuesto Codificado | Anticipo | Presupuesto Devengado | Presupuesto Ejecutado |
|--|-----------------------------|----------------|------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | (a) | (b) | (c) | (d=b+c) |
| Eje 1. Económico | 1 | 4 | 11,16 | 0,23 | 0,39 | 0,62 |
| | 2 | 49 | 235,85 | 11,41 | 82,33 | 93,73 |
| | 3 | 35 | 163,63 | 4,11 | 84,07 | 88,18 |
| | 4 | 9 | 4.635,91 | 0,04 | 2.991,00 | 2.991,04 |
| Subtotal Eje 1. | | 97 | 5.046,55 | 15,79 | 3.157,79 | 3.173,58 |
| Eje 2. Social | 5 | 29 | 272,16 | 2,53 | 163,71 | 166,24 |
| | 6 | 29 | 235,76 | 11,11 | 85,95 | 97,06 |
| | 7 | 256 | 370,67 | 22,32 | 99,60 | 121,92 |
| | 8 | 6 | 8,29 | 0,04 | 2,91 | 2,96 |
| Subtotal Eje 2. | | 320 | 886,87 | 35,99 | 352,18 | 388,17 |
| Eje 3. Seguridad | 9 | 19 | 185,04 | 19,68 | 46,43 | 66,10 |
| | 10 | 17 | 319,17 | 47,33 | 8,84 | 56,17 |
| Subtotal Eje 3. | | 36 | 504,21 | 67,01 | 55,27 | 122,28 |
| Eje 4. Transición Ecológica | 11 | 8 | 12,49 | 0,03 | 6,40 | 6,42 |
| | 12 | 20 | 80,80 | 0,31 | 23,38 | 23,69 |
| | 13 | 3 | 9,36 | 0,00 | 3,38 | 3,38 |
| Subtotal Eje 4. | | 31 | 102,65 | 0,34 | 33,15 | 33,49 |
| Eje 5. Institucional | 14 | 58 | 300,51 | 4,12 | 157,23 | 161,34 |
| | 15 | 12 | 12,36 | 0,55 | 2,49 | 3,04 |
| | 16 | 2 | 23,84 | 0,00 | 6,15 | 6,15 |
| Subtotal Eje 5. | | 72 | 336,70 | 4,67 | 165,87 | 170,54 |
| Proyectos sin presupuesto codificado al 3er Trimestre 2023 | (en blanco) | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal Proyectos sin presupuesto | | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | | 561 | 6.876,99 | 123,80 | 3.764,26 | 3.888,06 |

Fuente: Módulo Seguimiento del Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública – SIPeIP, Secretaría Nacional de Planificación. Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF, Ministerio de Economía y Finanzas - Ejecución Presupuestaria. Corte 30 de septiembre 2023.

3.3. Análisis por objetivos del Plan Nacional de Desarrollo

Objetivo 1: Incrementar y fomentar, de manera inclusiva, las oportunidades de empleo y las condiciones laborales

Este objetivo se enfoca en la generación de empleo con la existencia de una economía de libre mercado con tres fundamentos importantes que son: 1) sistema de precios, 2) competencia y, 3) defensa de la propiedad privada. Esta es la mejor forma de crear oportunidades para todos y mejorar la calidad de vida de los ecuatorianos, considerando las diversidades de género, intergeneracional, pueblos y nacionalidades y grupos de atención prioritaria.

En lo que se refiere al emprendimiento, se precisa eliminar trámites innecesarios, propiciar capacitación y acceso a condiciones óptimas de financiamiento, tomando en cuenta la interrelación que debe existir entre la academia, la empresa y los diferentes niveles de gobierno.

3.3.1 Análisis Presupuestario

Al objetivo 1 se encuentran alineado 4 proyectos con corte al 30 de septiembre del 2023, registrándose un presupuesto codificado de USD 11,16 millones, con una ejecución presupuestaria del 5,55%.

A nivel de los Gabinetes Sectoriales establecidos, al Gabinete Sectorial de Desarrollo del Talento Humano es el que mayor porcentaje de participación presenta respecto al presupuesto codificado con USD 7,27 millones (65,17% de participación), seguido del Gabinete Sectorial de Desarrollo Social con USD 3,89 millones (34,83% de participación).

A continuación, se presenta la ejecución presupuestaria correspondiente al tercer trimestre de 2023 a nivel de Gabinete Sectorial.

Tabla 48. Ejecución presupuestaria de los proyectos de inversión por gabinete alineados al objetivo 1 (millones de dólares)

| Gabinete Sectorial | Nro. Entidades | Nro. de Proyectos | Presupuesto Codificado | Anticipo | Presupuesto Devengado | Presupuesto Ejecutado | % Ejecución |
|------------------------|----------------|-------------------|------------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| | | | (a) | (b) | (c) | (d=b+c) | (d/a) |
| Desarrollo del Talento | 3 | 3 | 7,27 | 0,00 | 0,31 | 0,31 | 4,31% |
| Desarrollo Social | 1 | 1 | 3,89 | 0,23 | 0,08 | 0,31 | 7,87% |
| Total | 4 | 4 | 11,16 | 0,23 | 0,39 | 0,62 | 5,55% |

Fuente: Módulo Seguimiento a la Planificación Institucional del Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública – SIPeIP, Secretaría Nacional de Planificación. Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF, Ministerio de Economía y Finanzas - Ejecución Presupuestaria. Corte 30 de septiembre de 2023.

A nivel de entidades, el Ministerio de Trabajo MDT concentra el 35,24% del presupuesto codificado, seguido del Instituto Nacional de Económica Popular y Solidaria – IEPS con el 34,83%. A continuación, se presenta la ejecución presupuestaria de los proyectos alineados al objetivo 1.

Tabla 49. Ejecución presupuestaria de los proyectos de inversión por entidad alineados al objetivo 1 (millones de dólares)

| Entidad | Gabinete Sectorial | Nro. de Proyectos | Presupuesto Codificado | Anticipo | Presupuesto Devengado | Presupuesto Ejecutado | % Ejecución |
|---|------------------------|-------------------|------------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| | | | (a) | (b) | (c) | (d=b+c) | (d/a) |
| Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria - IEPS | Desarrollo Social | 1 | 3,89 | 0,23 | 0,08 | 0,31 | 7,87% |
| Ministerio del Trabajo | Desarrollo del Talento | 1 | 3,93 | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 0,59% |
| Ministerio de Cultura y Patrimonio | Desarrollo del Talento | 1 | 3,25 | 0,00 | 0,29 | 0,29 | 8,93% |
| Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión | Desarrollo del Talento | 1 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Total | | 4 | 11,16 | 0,23 | 0,39 | 0,62 | 5,55% |

Fuente: Módulo Seguimiento a la Planificación Institucional del Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública – SIPeIP, Secretaría Nacional de Planificación. Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF, Ministerio de Economía y Finanzas - Ejecución Presupuestaria. Corte 30 de septiembre de 2023.

3.3.2 Análisis del cumplimiento de metas de los proyectos de inversión

Al objetivo 1 del plan se encuentran alineados 4 proyectos de inversión, de los cuales el que corresponde a la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, no tienen programación de metas físicas, si tiene programación presupuestaria y sin ejecución presupuestaria; mientras que

las Entidades restantes, tienen bajo cumplimiento de metas físicas y ejecución presupuestaria, esta información corresponde al tercer trimestre de 2023.

Objetivo 2: Impulsar un sistema económico con reglas claras que fomente el comercio exterior, turismo, atracción de inversiones y modernización del sistema financiero nacional

Este objetivo se enfoca en incrementar el nivel de bienestar de las personas, considerando los recursos naturales como punto de partida conjugada con habilidades profundas (especialización del comercio exterior, turismo, inversiones y financiero), mejor tecnología y aprovechamiento de las economías a escala, dando como resultado efectos positivos que cuentan con aumentos de la productividad, competitividad e innovación, reducción de precios y costos de producción, una mayor optimización de los recursos; y, mejoras en el bienestar y calidad de vida.

3.3.1 Análisis Presupuestario

Al objetivo 2 se encuentran alineados 49 proyectos con corte al 30 de septiembre de 2023, registrándose un presupuesto codificado de USD 235,85 millones y una ejecución de USD 93,73 millones (39,74% ejecutado).

A nivel de los Gabinetes Sectoriales establecidos, el Gabinete Sectorial de Desarrollo de Inversiones es el que mayor porcentaje de participación presenta en cuanto al presupuesto codificado, con USD 214,67 millones (91,02% de participación), seguido por el Gabinete Productivo con USD 10,64 millones (4,51% de participación); sin Gabinete y el Gabinete Sectorial de Desarrollo del Talento y con USD 8,67 y USD 1,88 millones, respectivamente (3,67% y 0,80% de participación).

A continuación, se presenta la ejecución presupuestaria correspondiente al tercer trimestre de 2023 a nivel de Gabinete Sectorial.

Tabla 50. Ejecución presupuestaria de los proyectos de inversión por gabinete alineados al objetivo 2 (millones de dólares)

| Gabinete Sectorial | Nro. Entidades | Nro. de Proyectos | Presupuesto Codificado | Anticipo | Presupuesto Devengado | Presupuesto Ejecutado | % Ejecución |
|---------------------------|----------------|-------------------|------------------------|--------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| | | | (a) | (b) | (c) | (d=b+c) | (d/a) |
| Desarrollo de Inversiones | 2 | 37 | 214,67 | 10,40 | 76,02 | 86,43 | 40,26% |
| Desarrollo Productivo | 2 | 6 | 10,64 | 0,89 | 5,05 | 5,94 | 55,89% |
| Sin Gabinete | 2 | 2 | 8,67 | 0,03 | 0,81 | 0,84 | 9,69% |
| Desarrollo del Talento | 1 | 4 | 1,88 | 0,09 | 0,44 | 0,52 | 27,86% |
| Total | 7 | 49 | 235,85 | 11,41 | 82,33 | 93,73 | 39,74% |

Fuente: Módulo Seguimiento a la Planificación Institucional del Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública – SIPeIP, Secretaría Nacional de Planificación. Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF, Ministerio de Economía y Finanzas - Ejecución Presupuestaria. Corte 30 de septiembre de 2023.

A nivel de entidades, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, concentra el 86,82% del presupuesto codificado. A continuación, se presenta la ejecución presupuestaria de los proyectos alineados al objetivo 2.

**Tabla 51. Ejecución presupuestaria de los proyectos de inversión por entidad alineados al objetivo 2
 (millones de dólares)**

| Entidad | Gabinete Sectorial | Nro. de Proyectos | Presupuesto Codificado | Anticipo | Presupuesto Devengado | Presupuesto Ejecutado | % Ejecución |
|--|---------------------------|-------------------|------------------------|--------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| | | | (a) | (b) | (c) | (d=b+c) | (d/a) |
| Ministerio de Transporte y Obras Públicas | Desarrollo de Inversiones | 36 | 204,77 | 10,40 | 75,15 | 85,55 | 41,78% |
| Instituto de Investigación Geológico y Energético - IIGE | Desarrollo de Inversiones | 1 | 9,90 | 0,00 | 0,88 | 0,88 | 8,88% |
| Ministerio de Turismo | Desarrollo Productivo | 4 | 8,13 | 0,67 | 4,42 | 5,09 | 62,59% |
| Superintendencia de Compañías | Sin Gabinete | 1 | 7,45 | 0,03 | 0,00 | 0,03 | 0,40% |
| Ministerio de Producción Comercio Exterior Inversiones y Pesca | Desarrollo Productivo | 2 | 2,50 | 0,22 | 0,63 | 0,85 | 34,12% |
| Ministerio de Cultura y Patrimonio | Desarrollo del Talento | 4 | 1,88 | 0,08 | 0,44 | 0,52 | 27,86% |
| Instituto Nacional de Estadística y Censos- INEC | Sin Gabinete | 1 | 1,22 | 0,00 | 0,81 | 0,81 | 66,56% |
| Total | | 49 | 235,85 | 11,41 | 82,33 | 93,73 | 39,74% |


Fuente: Módulo Seguimiento a la Planificación Institucional del Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública – SIPeIP, Secretaría Nacional de Planificación. Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF, Ministerio de Economía y Finanzas - Ejecución Presupuestaria. Corte 30 de septiembre de 2023.

3.3.2 Análisis del cumplimiento de metas de los proyectos de inversión

Al objetivo 2 del plan se encuentran alineados 49 proyectos de inversión, de los cuales, 32 proyectos tienen programación de metas físicas para el tercer trimestre de 2023; 17 proyectos no cuentan con metas físicas programadas para el citado periodo.

De los 32 proyectos que cuentan con programación de metas físicas al tercer trimestre de 2023, el Gabinete Sectorial de Desarrollo de Inversiones registra el mayor número de proyectos con programación de metas, cuya participación es de 68,75% (22 proyectos) y una ejecución promedio de metas físicas del 60,04%. El Gabinete Sectorial de Desarrollo Productivo tiene una participación de 15,63% (5 proyectos) con una ejecución promedio de metas físicas del 77,83%. El Gabinete Sectorial de Desarrollo del Talento tiene una participación de 9,38% (3 proyectos) y una ejecución promedio de metas físicas del 68,90%, finalmente instituciones sin Gabinete, tiene una ejecución promedio de metas físicas del 59,30% con una participación del 6,25% (2 proyectos), de acuerdo al siguiente detalle:

Gráfico 6. Porcentaje promedio de ejecución de metas y participación presupuestaria de proyectos por gabinete sectorial alineados al objetivo 2.

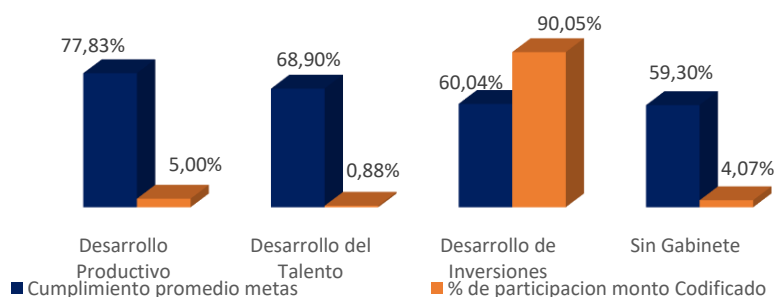

Fuente: Módulo Seguimiento a la Planificación Institucional del Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública – SIPeIP, Secretaría Nacional de Planificación. Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF, Ministerio de Economía y Finanzas - Ejecución Presupuestaria. Corte 30 de septiembre de 2023.

Cumplimiento de metas de los proyectos de inversión por entidad

El Ministerio de Transporte y Obras Públicas, concentran el 86,82% del presupuesto codificado (USD 204,77 millones de un total de USD 235,85 millones de presupuesto codificado), con una participación en proyectos del 73,47% (36 proyectos de 49 proyectos) alineados al objetivo 2, de los cuales 22 proyectos cuentan con programación de metas físicas para el tercer trimestre de 2023.

Tabla 52. Proyectos del Ministerio de Transporte y Obras Públicas con programación de metas físicas alineados al objetivo 2

| CUP Proyecto | % Programación metas física III Trimestre | % Ejecución meta física III Trimestre | % Cumplimiento metas físicas | % Programación Presupuestaria III Trimestre | % Ejecución III Trimestre | % Cumplimiento ejecución presupuestaria | |
|-----------------------|---|---------------------------------------|------------------------------|---|---------------------------|---|---|
| | (a) | (b) | c(b/a) | (d) | (e) | f(d/c) | |
| 175200000.0000.374666 | 4,11% | 1,75% | 42,58% | 78,39% | 20,62% | 26,30% | ● |
| 175200000.0000.387265 | 18,75% | 20,80% | 100,00% | 90,46% | 50,36% | 55,67% | ● |
| 175200000.0000.387636 | 43,96% | 42,20% | 96,00% | 100,00% | 70,92% | 70,92% | ● |
| 175200000.0000.383591 | 13,45% | 13,45% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | ● |
| 175200000.0000.388535 | 49,07% | 5,72% | 11,66% | 81,00% | 0,32% | 0,40% | ● |
| 175200000.0000.381287 | 9,63% | 8,79% | 91,28% | 100,00% | 85,48% | 85,48% | ● |
| 175200000.0000.387972 | 70,00% | 0,00% | 0,00% | 79,62% | 0,00% | 0,00% | ● |
| 175200000.0000.387344 | 29,70% | 29,70% | 100,00% | 100,00% | 41,17% | 41,17% | ● |
| 175200000.0000.387612 | 26,32% | 26,32% | 100,00% | 62,09% | 38,37% | 61,80% | ● |
| 175200000.0000.388574 | 58,17% | 0,00% | 0,00% | 83,00% | 49,96% | 60,19% | ● |
| 175200000.0000.387930 | 87,81% | 2,85% | 3,25% | 88,06% | 34,51% | 39,19% | ● |
| 175200000.0000.383589 | 100,00% | 50,00% | 50,00% | 100,00% | 59,50% | 59,50% | ● |
| 175200000.0000.387709 | 96,43% | 74,11% | 76,85% | 87,51% | 74,57% | 85,21% | ● |
| 175200000.0000.387638 | 33,48% | 36,70% | 100,00% | 81,70% | 61,62% | 75,42% | ● |
| 175200000.0000.383124 | 43,77% | 37,43% | 85,52% | 100,00% | 73,55% | 73,55% | ● |
| 175200000.0000.387728 | 82,00% | 0,00% | 0,00% | 83,81% | 0,00% | 0,00% | ● |
| 175200000.0000.387609 | 95,08% | 0,00% | 0,00% | 78,77% | 0,00% | 0,00% | ● |
| 175200000.0000.388951 | 41,86% | 35,02% | 83,66% | 0,00% | 44,64% | Ejecución presupuestaria sin programación | Ejecución presupuestaria sin programación |
| 175200000.0000.387588 | 0,27% | 1,11% | 100,00% | 100,00% | 88,47% | 88,47% | ● |
| 175200000.0000.388555 | 100,00% | 80,00% | 80,00% | 100,00% | 28,89% | 28,89% | ● |
| 175200000.0000.387928 | 5,00% | 5,00% | 100,00% | 0,00% | 99,45% | Ejecución presupuestaria sin programación | Ejecución presupuestaria sin programación |
| 175200000.0000.387614 | 36,51% | 0,00% | 0,00% | 80,15% | 0,00% | 0,00% | ● |

Semaforización ejecución presupuestaria al tercer trimestre: ● Mayor o igual al 100%; ● 99,99% - 90,00%; ● 89,99% - 0%.

Semaforización ejecución metas al tercer trimestre: ● Mayor o igual al 100%; ● 99,99% - 90,00%; ● 89,99% - 0%.

Fuente: Módulo Seguimiento a la Planificación Institucional del Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública – SIPeIP, Secretaría Nacional de Planificación. Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF, Ministerio de Economía y Finanzas - Ejecución Presupuestaria. Corte 30 de septiembre de 2023.

Objetivo 3: Fomentar la productividad y competitividad en los sectores agrícola, industrial, acuícola y pesquero, bajo el enfoque de la economía circular

Este objetivo se enfoca en la dinámica productiva que incluye actividades económicas a nivel agrícola, acuícola, pequero y de infraestructura, con un esquema que brinde igualdad de oportunidades para todos, para ello se impulsaran modelos de asociatividad productiva y comercial para mejorar las ganancias de los productores, incrementar la tecnificación, crear oportunidades y promover el progreso económico de estos sectores.

3.3.1 Análisis Presupuestario

Al objetivo 3, se encuentran alineados 35 proyectos para el tercer trimestre de 2023, registrándose un presupuesto codificado de USD 163,63 millones y una ejecución de USD 88,18 millones (53,89% ejecutado).

A nivel de Gabinetes Sectoriales establecidos, el Gabinete Sectorial de Desarrollo Productivo es el que mayor porcentaje de participación tiene en cuanto al presupuesto codificado, con USD 155,21 millones (94,85% de participación), seguido del Gabinete Sectorial de Desarrollo de Inversiones con USD 6,93 millones (4,28% de participación); el sector Sin Gabinete con USD 0,87 millones, respectivamente (0,53% de participación) y el sector Gabinete Sectorial de Desarrollo Social con 0,62 millones, respectivamente (0,38% de participación).

A continuación, se presenta la ejecución presupuestaria correspondiente al tercer trimestre de año 2023 a nivel de Gabinete Sectorial.

Tabla 53. Ejecución presupuestaria de los proyectos de inversión alineados al objetivo 3 (millones de dólares)

| Gabinete Sectorial | Nro. Entidades | Nro. de Proyectos | Presupuesto Codificado | Anticipo | Presupuesto Devengado | Presupuesto Ejecutado | % Ejecución |
|---------------------------|----------------|-------------------|------------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| | | | (a) | (b) | (c) | (d=b+c) | (d/a) |
| Desarrollo Productivo | 4 | 30 | 155,21 | 0,98 | 83,80 | 84,78 | 54,62% |
| Desarrollo de Inversiones | 2 | 2 | 6,93 | 2,77 | 0,03 | 2,80 | 40,47% |
| Sin Gabinete | 2 | 2 | 0,87 | 0,24 | 0,07 | 0,31 | 35,31% |
| Desarrollo Social | 1 | 1 | 0,62 | 0,12 | 0,18 | 0,29 | 47,70% |
| Total | 9 | 35 | 163,63 | 4,11 | 84,07 | 88,18 | 53,89% |

Fuente: Módulo Seguimiento a la Planificación Institucional del Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública – SIPeIP, Secretaría Nacional de Planificación. Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF, Ministerio de Economía y Finanzas - Ejecución Presupuestaria. Corte 30 de septiembre de 2023.

A nivel de entidades, el Ministerio de Agricultura y Ganadería y el Ministerio de Producción Comercio Exterior Inversiones y Pesca concentran el 84,57% del presupuesto codificado. A continuación, se presenta la ejecución presupuestaria de las entidades que tienen proyectos alineados al objetivo 3.

Tabla 54. Ejecución presupuestaria de los proyectos de inversión por entidad alineados al objetivo 3 (millones de dólares)

| Entidad | Gabinete Sectorial | Nro. de Proyectos | Presupuesto Codificado | Anticipo | Presupuesto Devengado | Presupuesto Ejecutado | % Ejecución |
|--|-----------------------|-------------------|------------------------|----------|-----------------------|-----------------------|-------------|
| | | | (a) | (b) | (c) | (d=b+c) | (d/a) |
| Ministerio de Agricultura y Ganadería | Desarrollo Productivo | 18 | 117,45 | 0,78 | 64,50 | 65,28 | 55,58% |
| Ministerio de Producción Comercio Exterior Inversiones y Pesca | Desarrollo Productivo | 5 | 20,93 | 0,02 | 9,42 | 9,44 | 45,09% |

| Entidad | Gabinete Sectorial | Nro. de Proyectos | Presupuesto Codificado | Anticipo | Presupuesto Devengado | Presupuesto Ejecutado | % Ejecución |
|--|---------------------------|-------------------|------------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| | | | (a) | (b) | (c) | (d=b+c) | (d/a) |
| Agencia de Regulación y Control Fito y Zoonosanitario | Desarrollo Productivo | 5 | 15,89 | 0,00 | 9,54 | 9,54 | 60,01% |
| Ministerio de Transporte y Obras Públicas | Desarrollo de Inversiones | 1 | 6,77 | 2,73 | 0,00 | 2,73 | 40,31% |
| Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarias INIAP | Desarrollo Productivo | 2 | 0,94 | 0,18 | 0,34 | 0,52 | 55,67% |
| Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de Manabí | Sin Gabinete | 1 | 0,70 | 0,24 | 0,00 | 0,24 | 34,65% |
| Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria | Desarrollo Social | 1 | 0,62 | 0,12 | 0,18 | 0,29 | 47,70% |
| Universidad Intercultural de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas Amawtay Wasi | Sin Gabinete | 1 | 0,17 | 0,00 | 0,07 | 0,07 | 37,95% |
| Instituto de Investigación Geológico y Energético - IIGE | Desarrollo de Inversiones | 1 | 0,16 | 0,04 | 0,03 | 0,07 | 47,07% |
| Total | | 35 | 163,63 | 4,11 | 84,07 | 88,18 | 53,89% |

Fuente: Módulo Seguimiento a la Planificación Institucional del Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública – SIPeIP, Secretaría Nacional de Planificación. Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF, Ministerio de Economía y Finanzas - Ejecución Presupuestaria. Corte 30 de septiembre de 2023.


3.3.2 Análisis del cumplimiento de metas de los proyectos de inversión

Al objetivo 3 del plan se encuentran alineados 35 proyectos de inversión, de los cuales 30 proyectos tienen programación de metas físicas para el tercer trimestre de 2023; y 5 proyectos no cuentan con metas físicas programadas para el mencionado periodo.

De los 30 proyectos que cuentan con programación de metas físicas el tercer trimestre de 2023, el Gabinete Sectorial de Desarrollo Productivo registra el mayor número de proyectos con programación de metas, cuya participación es de 86,67% (26 proyectos) y una ejecución promedio de metas físicas del 71,53%. El Gabinete Sectorial de Desarrollo de Inversiones tiene una participación de 6,67% (2 proyectos) y una ejecución promedio de metas físicas del 81,46%.

Los 30 proyectos que cuentan con programación de metas presentan un presupuesto codificado de USD 150,45 millones, siendo el Gabinete Sectorial de Desarrollo Productivo el que mayor porcentaje de participación de presupuesto codificado presenta, con 94,52% (USD 142,21 millones), de acuerdo con el siguiente detalle:

Gráfico 7. Porcentaje promedio de ejecución de metas y participación presupuestaria de proyectos por gabinete sectorial alineados al objetivo 3.

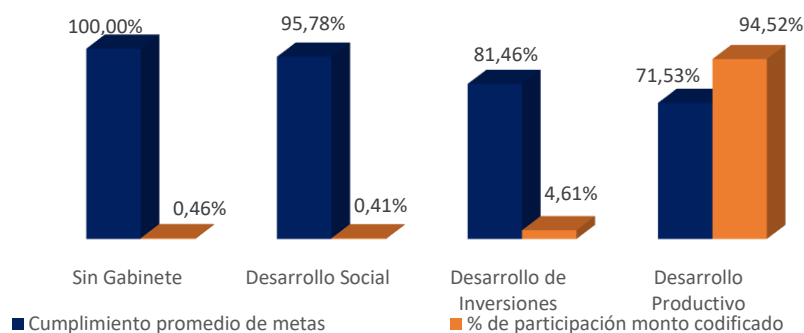

Fuente: Módulo Seguimiento a la Planificación Institucional del Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública – SIPeIP, Secretaría Nacional de Planificación. Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF, Ministerio de Economía y Finanzas - Ejecución Presupuestaria. Corte 30 de septiembre de 2023.

Cumplimiento de metas de los proyectos de inversión por entidad

El Ministerio de Agricultura y Ganadería y el Ministerio de Producción Comercio Exterior Inversiones y Pesca concentran el 84,57% del presupuesto codificado (USD 138,38 millones de un total de 163,63 millones de presupuesto codificado), con una participación en proyectos del 65,71% (23 proyectos de 35 proyectos) alineados al objetivo 3, de los cuales 30 proyectos cuentan con programación de metas físicas para el tercer trimestre de 2023.

A continuación, se realiza un análisis de los proyectos de las entidades antes mencionadas correspondiente al tercer trimestre de 2023, teniendo en cuenta para el efecto, la ejecución presupuestaria, la programación de avance físico y su cumplimiento.

Ministerio de Agricultura y Ganadería

El Ministerio de Agricultura y Ganadería cuenta con 18 proyectos alineados al objetivo 3, al 30 de septiembre de 2023, con un total de presupuesto codificado de USD 117,45 millones, de los cuales 15 proyectos tienen programación de metas físicas al tercer trimestre de 2023 y su presupuesto codificado es de USD 106,67 millones.

Tabla 55. Proyectos Ministerio de Agricultura y Ganadería con programación de metas físicas alineados al objetivo 3

| CUP Proyecto | % Programación metas física III Trimestre | % Ejecución meta física III Trimestre | % Cumplimiento metas físicas | | % Programación Presupuestaria III Trimestre | % Ejecución III Trimestre | % Cumplimiento ejecución presupuestaria | |
|-----------------------|---|---------------------------------------|------------------------------|---|---|---------------------------|---|---|
| | (a) | (b) | c (b/a) | | (d) | (e) | f (d/c) | |
| 133600000.0000.387404 | 18,05% | 22,82% | 100,00% | ● | 50,04% | 47,78% | 95,49% | ● |
| 133600000.0000.387173 | 21,22% | 25,27% | 100,00% | ● | 68,19% | 67,85% | 99,50% | ● |
| 133600000.0000.388029 | 45,01% | 44,90% | 99,76% | ● | 99,73% | 99,64% | 99,91% | ● |
| 133600000.0000.375447 | 1,13% | 0,67% | 59,29% | ● | 61,62% | 27,37% | 44,42% | ● |
| 133600000.0000.388049 | 10,54% | 12,67% | 100,00% | ● | 97,22% | 96,70% | 99,47% | ● |
| 133600000.0000.387182 | 17,18% | 16,83% | 97,96% | ● | 73,76% | 70,54% | 95,64% | ● |
| 133600000.0000.387090 | 16,17% | 5,16% | 31,91% | ● | 83,25% | 52,88% | 63,52% | ● |
| 133600000.0000.388126 | 3,39% | 1,67% | 49,26% | ● | 51,61% | 43,72% | 84,71% | ● |
| 133600000.0000.387089 | 3,79% | 0,00% | 0,00% | ● | 51,56% | 7,25% | 14,06% | ● |
| 133600000.0000.387097 | 4,87% | 5,37% | 100,00% | ● | 69,46% | 41,41% | 59,62% | ● |
| 133600000.0000.388280 | 43,50% | 10,40% | 23,91% | ● | 19,86% | 14,68% | 73,92% | ● |
| 133600000.0000.387098 | 11,50% | 8,78% | 76,35% | ● | 89,02% | 61,54% | 69,13% | ● |
| 133600000.0000.387116 | 6,60% | 5,30% | 80,30% | ● | 77,00% | 55,48% | 72,05% | ● |
| 133600000.0000.388675 | 15,78% | 0,00% | 0,00% | ● | 98,97% | 19,16% | 19,36% | ● |
| 133600000.0000.388298 | 4,93% | 1,88% | 38,13% | ● | 66,57% | 63,97% | 96,09% | ● |

Semaforización ejecución presupuestaria al tercer trimestre: ● Mayor o igual al 100%; ● 99,99% - 90,00%; ● 89,99% - 0%.

Semaforización ejecución metas al tercer trimestre: ● Mayor o igual al 100%; ● 99,99% - 90,00%; ● 89,99% - 0%.

Fuente: Módulo Seguimiento a la Planificación Institucional del Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública – SIPeIP, Secretaría Nacional de Planificación. Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF, Ministerio de Economía y Finanzas - Ejecución Presupuestaria. Corte 30 de septiembre de 2023.

Ministerio de Producción Comercio Exterior Inversiones y Pesca

El Ministerio de Producción Comercio Exterior Inversiones y Pesca cuenta con 5 proyectos alineados al objetivo 3, al 30 de septiembre de 2023, con un total de presupuesto codificado de USD 20,93

millones, de los cuales los 4 proyectos registran programación de metas físicas y su presupuesto codificado es de USD 18,71.

Tabla 56. Proyecto del Ministerio de Producción Comercio Exterior Inversiones y Pesca con programación de metas físicas alineados al objetivo 3

| CUP Proyecto | % Programación metas física III Trimestre | % Ejecución meta física III Trimestre | % Cumplimiento metas físicas | % Programación Presupuestaria III Trimestre | % Ejecución III Trimestre | % Cumplimiento ejecución presupuestaria |
|------------------------|---|---------------------------------------|------------------------------|---|---------------------------|---|
| | (a) | (b) | c (b/a) | (d) | (e) | f (d/c) |
| 152180000..0000.388434 | 15,58% | 0,00% | 0,00% | 76,69% | 18,61% | 24,27% |
| 152180000.0000.387428 | 23,19% | 23,18% | 99,96% | 33,77% | 41,94% | 124,18% |
| 152180000.0000.387697 | 12,87% | 11,83% | 91,92% | 86,95% | 52,68% | 60,58% |
| 152180000.0000.388396 | 72,63% | 65,68% | 90,43% | 69,23% | 56,19% | 81,17% |

Semaforización ejecución presupuestaria al tercer trimestre: ● Mayor o igual al 100%; ● 99,99% - 90,00%; ● 89,99% - 0%.

Semaforización ejecución metas al tercer trimestre: ● Mayor o igual al 100%; ● 99,99% - 90,00%; ● 89,99% - 0%.

Fuente: Módulo Seguimiento a la Planificación Institucional del Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública – SIpEIP, Secretaría Nacional de Planificación. Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF, Ministerio de Economía y Finanzas - Ejecución Presupuestaria. Corte 30 de septiembre de 2023.

Objetivo 4: Garantizar la gestión de las finanzas públicas de manera sostenible y transparente

Este objetivo se enfoca en las decisiones políticas, teniendo en cuenta que el sector público funciona como el sector privado bajo condiciones de escasez e incertidumbre, los políticos ofrecen medios para enfrentar esta escasez distribuyendo el ingreso y la riqueza con el afán de promover el bienestar en general, fundamentándose en la implementación de una política de gasto público que priorice la inversión en capital humano, educación, salud e infraestructura y que sea sostenible en el largo plazo.

3.3.1 Análisis Presupuestario

Al objetivo 4, se encuentran alineados 9 proyectos para el tercer trimestre de 2023, registrándose un presupuesto codificado de USD 4.635,91 millones y una ejecución de USD 2.991,04 millones (64,52% ejecutado). A nivel de los Gabinetes Sectoriales establecidos, el Gabinete Sectorial Económico y Financiero es el que concentra la totalidad del presupuesto codificado, con USD 4.635,91 millones (100,00%). A continuación, se presenta la ejecución presupuestaria correspondiente al tercer trimestre de 2023 a nivel de Gabinete Sectorial.

Tabla 57. Ejecución presupuestaria de los proyectos de inversión por gabinete alineados al objetivo 4 (millones de dólares)

| Gabinete Sectorial | Nro. Entidades | Nro. de Proyectos | Presupuesto Codificado | Anticipo | Presupuesto Devengado | Presupuesto Ejecutado | % Ejecución |
|------------------------|----------------|-------------------|------------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| | | | (a) | (b) | (c) | (d=b+c) | (d/a) |
| Económico y Financiero | 3 | 9 | 4.635,91 | 0,04 | 2.991,00 | 2.192,04 | 64,52% |
| Total | 3 | 9 | 4.635,91 | 0,04 | 2.991,00 | 2.192,04 | 64,52% |

Fuente: Módulo Seguimiento a la Planificación Institucional del Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública – SIpEIP, Secretaría Nacional de Planificación. Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF, Ministerio de Economía y Finanzas - Ejecución Presupuestaria. Corte 30 de septiembre de 2023.

A nivel de entidades, el Ministerio de Economía y Finanzas concentran el 99,48% del presupuesto codificado. A continuación, se presenta la ejecución presupuestaria teniendo en cuenta las entidades que tienen proyectos alineados al objetivo 4.

**Tabla 58. Ejecución presupuestaria de los proyectos de inversión por entidad alineados al objetivo 4
 (millones de dólares)**

| Entidad | Gabinete Sectorial | Nro. de Proyectos | Presupuesto Codificado | Anticipo | Presupuesto Devengado | Presupuesto Ejecutado | % Ejecución |
|--|------------------------|-------------------|------------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| | | | (a) | (b) | (c) | (d=b+c) | (d/a) |
| Ministerio de Economía y Finanzas | Económico y Financiero | 6 | 4.611,85 | 0,04 | 2.990,87 | 2.990,91 | 64,85% |
| Servicio Nacional de Aduana del Ecuador - SENA | Económico y Financiero | 1 | 16,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Servicio de Rentas Internas -SRI | Económico y Financiero | 2 | 7,70 | 0,00 | 0,13 | 0,13 | 1,68% |
| Total | | 9 | 4.635,91 | 0,04 | 2.991,00 | 2.991,04 | 64,52% |


Fuente: Módulo Seguimiento a la Planificación Institucional del Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública – SIPeIP, Secretaría Nacional de Planificación. Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF, Ministerio de Economía y Finanzas - Ejecución Presupuestaria. Corte 30 de septiembre de 2023.

3.3.2 Análisis del cumplimiento de metas de los proyectos de inversión

Al objetivo 4 del plan se encuentran alineados 9 proyectos de inversión, de estos 5 proyectos registran programación de metas físicas para el tercer trimestre de 2023; y 4 proyectos no cuentan con metas físicas programadas para el mencionado periodo.

Los 5 proyectos que cuentan con programación de metas físicas para el tercer trimestre de 2023 correspondientes al Gabinete Sectorial Económico y Financiero, presentan una ejecución promedio de metas físicas es del 80,27% y un presupuesto codificado de USD 4.616,66 millones, de acuerdo con el siguiente detalle.

Gráfico 8. Porcentaje promedio de ejecución de metas y participación presupuestaria de proyectos por gabinete sectorial alineados al objetivo 4.

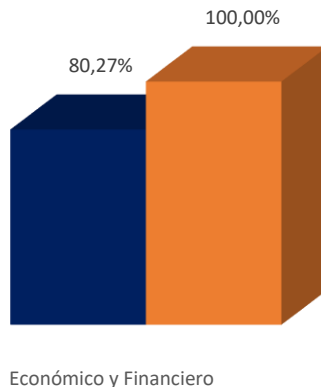

■ Cumplimiento promedio de metas ■ % de participación monto codificado

Fuente: Módulo Seguimiento a la Planificación Institucional del Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública – SIPeIP, Secretaría Nacional de Planificación. Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF, Ministerio de Economía y Finanzas - Ejecución Presupuestaria. Corte 30 de septiembre de 2023.

Cumplimiento de metas de los proyectos de inversión por entidad

El Ministerio de Economía y Finanzas concentra el 99,48% del presupuesto codificado (USD 4.611,85 millones de un total de USD 4.635,91 millones de presupuesto codificado), con una participación en proyectos del 66,67% (6 proyectos de 9) alineados al objetivo 4, de los cuales 4 proyectos registran programación de metas físicas para el tercer trimestre del 2023 y su presupuesto codificado es de USD 4.609,04 millones.

Tabla 59. Proyectos del Ministerio de Economía y Finanzas con programación de metas físicas alineados al objetivo 4

| CUP Proyecto | % Programación metas física III Trimestre | % Ejecución meta física III Trimestre | % Cumplimiento metas físicas | % Programación Presupuestaria III Trimestre | % Ejecución III Trimestre | % Cumplimiento ejecución presupuestaria | |
|----------------------|---|---------------------------------------|------------------------------|---|---------------------------|---|---|
| | (a) | (b) | c (b/a) | (d) | (e) | f (d/c) | |
| 81300000.0000.383697 | 9,44% | 6,84% | 72,46% | 59,54% | 2,92% | 4,90% | ● |
| 81300000.0000.384365 | 9,24% | 9,48% | 100,00% | 87,85% | 25,54% | 29,07% | ● |
| 81300000.0000.384584 | 36,53% | 19,53% | 53,46% | 38,79% | 0,00% | 0,00% | ● |
| 81300000.0000.388174 | 47,02% | 73,51% | 100,00% | 70,00% | 65,01% | 92,88% | ● |

Semaforización ejecución presupuestaria al tercer trimestre: ● Mayor o igual al 100%; ● 99,99% - 90,00%; ● 89,99% - 0%.

Semaforización ejecución metas al tercer trimestre: ● Mayor o igual al 100%; ● 99,99% - 90,00%; ● 89,99% - 0%.

Fuente: Módulo Seguimiento a la Planificación Institucional del Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública – SIPEIP, Secretaría Nacional de Planificación. Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF, Ministerio de Economía y Finanzas - Ejecución Presupuestaria. Corte 30 de septiembre de 2023.

Objetivo 5: Proteger a las familias, garantizar sus derechos y servicios, erradicar la pobreza y promover la inclusión social

Este objetivo se enfoca en la protección de las familias, la erradicación de la pobreza y la garantía sin discriminación de los derechos consagrados en la Constitución de la República de Ecuador; priorizando la creación de oportunidades para una sociedad más justa que respete la dignidad de las personas y haga frente a las condiciones de pobreza y violencia, siendo la seguridad social un derecho irrenunciable de todas las personas y cuya garantía es un deber del Estado.

En contexto de la pandemia COVID-19, este objetivo resalta la importancia de avanzar hacia la universalización de la conectividad y el acceso a las tecnologías digitales, cuya carencia puede limitar el ejercicio de otros derechos tales como la salud, la educación o el trabajo.

3.3.1 Análisis Presupuestario

Al objetivo 5, se encuentran alineados 29 proyectos para el tercer trimestre de 2023, registrándose un presupuesto codificado de USD 272,16 millones y una ejecución de USD 166,24 millones (61,08% ejecutado).

A nivel de los Gabinetes Sectoriales establecidos, el Gabinete Sectorial de Desarrollo Social es el que mayor porcentaje de participación tiene en cuanto al presupuesto codificado, con USD 97,49 millones que representa el 35,82% de participación sobre el presupuesto codificado total, seguido del Sector Sin Gabinete con USD 93,24 millones que representa el 34,26%, el Gabinete Sectorial de Desarrollo Productivo con USD 66,61 millones (24,48% de participación), el Gabinete Sectorial de Desarrollo Territorial con USD 11,43 millones (4,20% de participación) y el Gabinete Sectorial del Desarrollo del Talento con USD 3,39 millones (1,24% de participación).

A continuación, se presenta la ejecución presupuestaria correspondiente al tercer trimestre de 2023 a nivel de Gabinete Sectorial.

Tabla 60. Ejecución presupuestaria de los proyectos de inversión por gabinete alineados al objetivo 5 (millones de dólares)

| Gabinete Sectorial | Nro. Entidades | Nro. de Proyectos | Presupuesto Codificado | Anticipo | Presupuesto Devengado | Presupuesto Ejecutado | % Ejecución |
|--------------------|----------------|-------------------|------------------------|----------|-----------------------|-----------------------|-------------|
| | | | (a) | (b) | (c) | (d=b+c) | e (d/a) |
| Desarrollo Social | 3 | 15 | 97,49 | 2,20 | 50,26 | 52,47 | 53,81% |

| Gabinete Sectorial | Nro. Entidades | Nro. de Proyectos | Presupuesto Codificado | Anticipo | Presupuesto Devengado | Presupuesto Ejecutado | % Ejecución |
|------------------------|----------------|-------------------|------------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| | | | (a) | (b) | (c) | (d=b+c) | e (d/a) |
| Sin Gabinete | 2 | 5 | 93,24 | 0,05 | 62,51 | 62,56 | 67,10% |
| Desarrollo Productivo | 1 | 4 | 66,61 | 0,22 | 40,32 | 40,55 | 60,87% |
| Desarrollo Territorial | 1 | 2 | 11,43 | 0,06 | 7,75 | 7,81 | 68,34% |
| Desarrollo del Talento | 2 | 3 | 3,39 | 0,00 | 2,86 | 2,86 | 84,49% |
| Total | 9 | 29 | 272,16 | 2,53 | 163,71 | 166,24 | 61,08% |

Fuente: Módulo Seguimiento a la Planificación Institucional del Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública – SIPeIP, Secretaría Nacional de Planificación. Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF, Ministerio de Economía y Finanzas - Ejecución Presupuestaria. Corte 30 de septiembre de 2023.

A nivel de entidades, el Ministerio de Inclusión Económica y Social, el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, la Secretaría Técnica de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica, y el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos concentran el 89,07% del presupuesto codificado. A continuación, se presenta la ejecución presupuestaria teniendo en cuenta las entidades que tienen proyectos alineados al objetivo 5.

Tabla 61. Ejecución presupuestaria de los proyectos de inversión por entidad alineados al objetivo 5 (millones de dólares)

| Entidad | Gabinete Sectorial | Nro. de Proyectos | Presupuesto Codificado | Anticipo | Presupuesto Devengado | Presupuesto Ejecutado | % Ejecución |
|--|------------------------|-------------------|------------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| | | | (a) | (b) | (c) | (d=b+c) | (d/a) |
| Ministerio de Inclusión Económica y Social | Desarrollo Social | 11 | 82,56 | 1,42 | 46,72 | 48,15 | 58,32% |
| Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda | Desarrollo Productivo | 4 | 66,61 | 0,22 | 40,32 | 40,55 | 60,87% |
| Secretaría Técnica de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica - STCA | Sin Gabinete | 3 | 64,20 | 0,05 | 42,02 | 42,07 | 65,52% |
| Instituto Nacional de Estadística y Censos-INEC | Sin Gabinete | 2 | 29,03 | 0,00 | 20,49 | 20,49 | 70,58% |
| Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información MINTEL | Desarrollo Territorial | 2 | 11,43 | 0,06 | 7,75 | 7,81 | 68,34% |
| Unidad del Registro Social | Desarrollo Social | 2 | 7,57 | 0,00 | 0,99 | 0,99 | 13,07% |
| Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos | Desarrollo Social | 2 | 7,36 | 0,78 | 2,55 | 3,33 | 45,21% |
| Ministerio de Educación | Desarrollo del Talento | 1 | 1,95 | 0,00 | 1,93 | 1,93 | 98,82% |
| Ministerio del Trabajo | Desarrollo del Talento | 2 | 1,43 | 0,00 | 0,93 | 0,93 | 64,92% |
| Total | | 29 | 272,16 | 2,53 | 163,71 | 166,24 | 61,08% |

Fuente: Módulo Seguimiento a la Planificación Institucional del Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública – SIPeIP, Secretaría Nacional de Planificación. Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF, Ministerio de Economía y Finanzas - Ejecución Presupuestaria. Corte 30 de septiembre de 2023.


3.3.2 Análisis del cumplimiento de metas de los proyectos de inversión

Al objetivo 5 del plan se encuentran alineados 29 proyectos de inversión, de los cuales, 21 proyectos tienen programación de metas físicas para el tercer trimestre de 2023; y 8 proyectos no cuentan con metas físicas programadas para el mencionado periodo.

De los 21 proyectos que cuentan con programación de metas físicas para el tercer trimestre de 2023, se identifica que el Gabinete Sectorial de Desarrollo Social cuenta con el mayor número de proyectos con programación de metas, cuya participación es del 42,86% (9 proyectos) y alcanzó una ejecución promedio de metas físicas del 83,82%, el sector Sin Gabinete tiene una participación 23,81% (5 proyectos) y alcanzó una ejecución promedio de metas físicas del 53,37%, el Gabinete Sectorial de Desarrollo Productivo tiene una participación 19,05% (4 proyectos) y presenta una ejecución promedio de metas físicas del 62,94%;) y el Gabinete de Desarrollo Territorial tiene una participación del 9,52% (2 proyectos) y una ejecución promedio de metas físicas del 66,96%.

Los 21 proyectos que cuentan con programación de metas físicas para el tercer trimestre de 2023 presentan un presupuesto codificado de USD 238,74 millones, siendo las instituciones Sin Gabinete el que registra la mayor participación de presupuesto codificado 39,05% (USD 93,24 millones), de acuerdo con el siguiente detalle:

Gráfico 9. Porcentaje promedio de ejecución de metas y participación presupuestaria de proyectos por gabinete sectorial alineados al objetivo 5.

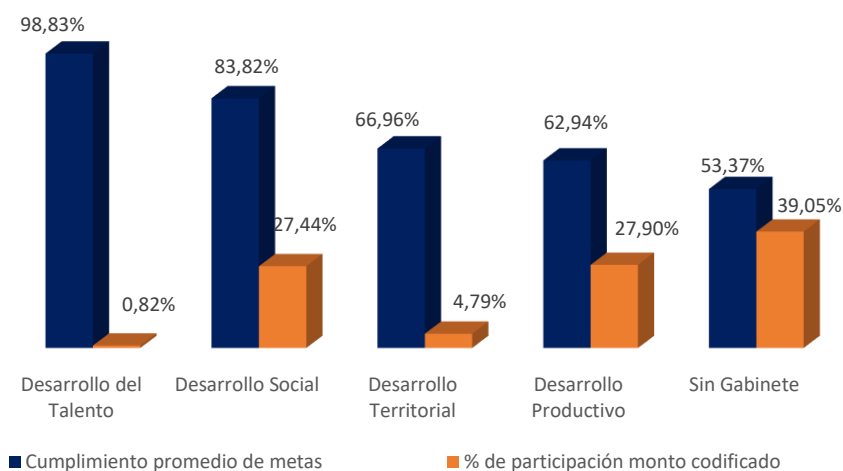

Fuente: Módulo Seguimiento a la Planificación Institucional del Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública – SIPeIP, Secretaría Nacional de Planificación. Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF, Ministerio de Economía y Finanzas - Ejecución Presupuestaria. Corte 30 de septiembre de 2023.

Cumplimiento de metas de los proyectos de inversión por entidad

El Ministerio de Inclusión Económica y Social, el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, la Secretaría Técnica de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica, y el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, concentran el 89,07% del presupuesto codificado (USD 242,41 millones de un total de USD 272,16 millones de presupuesto codificado), con una participación en proyectos del 68,97% (20 proyectos de 29) alineados al objetivo 5, de los cuales 15 proyectos cuentan con programación de metas físicas para el tercer trimestre de 2023.

A continuación, se realiza un análisis de los proyectos de las entidades antes mencionadas correspondiente al tercer trimestre de 2023, teniendo en cuenta para el efecto, la ejecución presupuestaria, la programación de avance físico y su cumplimiento.

Ministerio de Inclusión Económica y Social

El Ministerio de Inclusión Económica y Social cuenta con 11 proyectos alineados al objetivo 5, con un total de presupuesto codificado de USD 82,56 millones, de los cuales 6 tienen programación de metas físicas al tercer trimestre de 2023:

Tabla 62. Proyectos Ministerio de Inclusión Económica y Social con programación de metas físicas alineados al objetivo 5

| CUP Proyecto | % Programación metas física III Trimestre | % Ejecución meta física III Trimestre | % Cumplimiento metas físicas | | % Programación Presupuestaria III Trimestre | % Ejecución III Trimestre | % Cumplimiento ejecución presupuestaria | |
|-----------------------|---|---------------------------------------|------------------------------|---|---|---------------------------|---|---|
| | (a) | (b) | c (b/a) | | (d) | (e) | f (d/c) | |
| 102800000.0000.384446 | 7,05% | 5,77% | 81,84% | ● | 97,64% | 42,89% | 43,93% | ● |
| 102800000.0000.387124 | 13,96% | 12,79% | 91,62% | ● | 69,69% | 58,04% | 83,28% | ● |
| 102800000.0000.387151 | 22,96% | 20,89% | 90,98% | ● | 91,96% | 66,11% | 71,89% | ● |
| 102800000.0000.387167 | 17,29% | 17,18% | 99,36% | ● | 97,64% | 73,62% | 75,40% | ● |
| 102800000.0000.387169 | 20,51% | 20,51% | 100,00% | ● | 84,63% | 60,86% | 71,91% | ● |
| 102800000.0000.387547 | 14,23% | 4,41% | 30,99% | ● | 67,72% | 24,94% | 36,83% | ● |

Semaforización ejecución presupuestaria al tercer trimestre: ● Mayor o igual al 100%; ● 99,99% - 90,00%; ● 89,99% - 0%.

Semaforización ejecución metas al tercer trimestre: ● Mayor o igual al 100%; ● 99,99% - 90,00%; ● 89,99% - 0%.

Fuente: Módulo Seguimiento a la Planificación Institucional del Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública – SIPeIP, Secretaría Nacional de Planificación. Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF, Ministerio de Economía y Finanzas - Ejecución Presupuestaria. Corte 30 de septiembre de 2023.

Secretaría Técnica de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica

La Secretaría Técnica de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica con 3 proyectos alineados al objetivo 5, con un total de presupuesto codificado de USD 64,24 millones, mismos que tienen programación de metas físicas al tercer trimestre de 2023.

Tabla 63. Proyectos de la Secretaría Técnica de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica con programación de metas físicas alineados al objetivo 5

| CUP Proyecto | % Programación metas física III Trimestre | % Ejecución meta física III Trimestre | % Cumplimiento metas físicas | | % Programación Presupuestaria III Trimestre | % Ejecución III Trimestre | % Cumplimiento ejecución presupuestaria | |
|----------------------|---|---------------------------------------|------------------------------|---|---|---------------------------|---|---|
| | (a) | (b) | c (b/a) | | (d) | (e) | f (d/c) | |
| 32540000.0000.384924 | 0,04% | 0,01% | 25,00% | ● | 86,82% | 10,03% | 11,55% | ● |
| 32540000.0000.386244 | 6,24% | 2,50% | 40,06% | ● | 100,00% | 50,00% | 50,00% | ● |
| 32540000.0000.388031 | 26,79% | 7,84% | 29,26% | ● | 75,50% | 99,01% | 131,14% | ● |

Semaforización ejecución presupuestaria al tercer trimestre: ● Mayor o igual al 100%; ● 99,99% - 90,00%; ● 89,99% - 0%.

Semaforización ejecución metas al tercer trimestre: ● Mayor o igual al 100%; ● 99,99% - 90,00%; ● 89,99% - 0%.

Fuente: Módulo Seguimiento a la Planificación Institucional del Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública – SIPeIP, Secretaría Nacional de Planificación. Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF, Ministerio de Economía y Finanzas - Ejecución Presupuestaria. Corte 30 de septiembre de 2023.

Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda

El Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda cuenta con 4 proyectos alineados al objetivo 5, con un total de presupuesto codificado de USD 66,61 millones, de los cuales 4 proyectos tienen programación de metas físicas al tercer trimestre de 2023.

Tabla 64. Proyectos Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda con programación de metas físicas alineados al objetivo 5

| CUP Proyecto | % Programación metas física III Trimestre | % Ejecución meta física III Trimestre | % Cumplimiento metas físicas | | % Programación Presupuestaria III Trimestre | % Ejecución III Trimestre | % Cumplimiento ejecución presupuestaria | |
|-----------------------|---|---------------------------------------|------------------------------|---|---|---------------------------|---|---|
| | (a) | (b) | c (b/a) | | (d) | (e) | f (d/c) | |
| 185500000.0000.383624 | 3,09% | 3,08% | 99,68% | ● | 72,56% | 23,96% | 33,02% | ● |
| 185500000.0000.383651 | 1,62% | 2,31% | 100,00% | ● | 99,40% | 93,03% | 93,59% | ● |
| 185500000.0000.384629 | 4,00% | 1,91% | 47,75% | ● | 93,01% | 34,72% | 37,33% | ● |
| 185500000.0000.388060 | 11,80% | 0,51% | 4,32% | ● | 62,08% | 34,44% | 55,48% | ● |

Semaforización ejecución presupuestaria al tercer trimestre: ● Mayor o igual al 100%; ● 99,99% - 90,00%; ● 89,99% - 0%.

Semaforización ejecución metas al tercer trimestre: ● Mayor o igual al 100%; ● 99,99% - 90,00%; ● 89,99% - 0%.

Fuente: Módulo Seguimiento a la Planificación Institucional del Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública – SIPeIP, Secretaría Nacional de Planificación. Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF, Ministerio de Economía y Finanzas - Ejecución Presupuestaria. Corte 30 de septiembre de 2023.

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos cuenta con 2 proyectos alineados al objetivo 5, con un total de presupuesto codificado de USD 29,03 millones, los cuales tienen programación de metas físicas al tercer trimestre de 2023.

Tabla 65. Proyectos Instituto Nacional de Estadísticas y Censos con programación de metas físicas alineados al objetivo 5

| CUP Proyecto | % Programación metas física III Trimestre | % Ejecución meta física III Trimestre | % Cumplimiento metas físicas | | % Programación Presupuestaria III Trimestre | % Ejecución III Trimestre | % Cumplimiento ejecución presupuestaria | |
|----------------------|---|---------------------------------------|------------------------------|---|---|---------------------------|---|---|
| | (a) | (b) | c (b/a) | | (d) | (e) | f (d/c) | |
| 31210000.0000.382700 | 9,10% | 6,60% | 72,53% | ● | 97,79% | 86,35% | 88,30% | ● |
| 31210000.0000.388017 | 5,68% | 5,73% | 100,00% | ● | 69,34% | 19,03% | 27,45% | ● |

Semaforización ejecución presupuestaria al tercer trimestre: ● Mayor o igual al 100%; ● 99,99% - 90,00%; ● 89,99% - 0%.

Semaforización ejecución metas al tercer trimestre: ● Mayor o igual al 100%; ● 99,99% - 90,00%; ● 89,99% - 0%.

Fuente: Módulo Seguimiento a la Planificación Institucional del Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública – SIPeIP, Secretaría Nacional de Planificación. Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF, Ministerio de Economía y Finanzas - Ejecución Presupuestaria. Corte 30 de septiembre de 2023.

Objetivo 6: Garantizar el derecho a la salud integral, gratuita y de calidad

Este objetivo se enfoca en una visión de salud integral, inclusiva y de calidad, a través de políticas públicas concernientes a: hábitos de vida saludable, salud sexual y reproductiva, superación de adicciones y acceso universal a vacunas, siendo prioritario la Estrategia Nacional de primera Infancia para la Prevención y Reducción de la Desnutrición Crónica Infantil: Ecuador Crece Sin Desnutrición Infantil, que tiene como finalidad disminuir de manera sostenible la desnutrición y/o malnutrición infantil.

Además, es necesario concebir a la salud como un derecho humano y abordarlo de manera integral enfatizando los vínculos entre lo físico y lo psicosocial, lo urbano y lo rural, en definitiva, el derecho a vivir en un ambiente sano que promueva el goce de todas las capacidades del individuo.

3.3.1 Análisis Presupuestario

Al objetivo 6, se encuentran alineados 29 proyectos para el tercer trimestre de 2023, registrándose un presupuesto codificado de USD 235,76 millones y una ejecución de USD 97,06 millones (41,17% ejecutado).

A nivel de los Gabinetes Sectoriales establecidos, el Gabinete Sectorial de Salud es el que mayor porcentaje de participación tiene en cuanto al presupuesto codificado, con USD 221,44 millones (93,93% de participación), seguido por el Gabinete Sectorial de Desarrollo Social con USD 7,48 millones (3,17% de participación). A continuación, se presenta la ejecución presupuestaria correspondiente al tercer trimestre de 2023 a nivel de Gabinete Sectorial.

Tabla 66. Ejecución presupuestaria de los proyectos de inversión por gabinete alineados al objetivo 6 (millones de dólares)

| Gabinete Sectorial | Nro. Entidades | Nro. de Proyectos | Presupuesto Codificado | Anticipo | Presupuesto Devengado | Presupuesto Ejecutado | % Ejecución |
|------------------------|----------------|-------------------|------------------------|--------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| | | | (a) | (b) | (c) | (d=b+c) | e (d/a) |
| Salud | 1 | 25 | 221,44 | 10,61 | 76,07 | 86,68 | 39,15% |
| Desarrollo Social | 1 | 1 | 7,48 | 0,49 | 5,72 | 6,21 | 83,01% |
| Desarrollo del Talento | 1 | 2 | 5,57 | 0,00 | 3,28 | 3,28 | 58,77% |
| Económico y Financiero | 1 | 1 | 1,26 | 0,00 | 0,89 | 0,89 | 70,22% |
| Total | 29 | 29 | 235,76 | 11,11 | 85,95 | 97,06 | 41,17% |

Fuente: Módulo Seguimiento a la Planificación Institucional del Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública – SIPeIP, Secretaría Nacional de Planificación. Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF, Ministerio de Economía y Finanzas - Ejecución Presupuestaria. Corte 30 de septiembre de 2023.

A nivel de entidades, el Ministerio de Salud Pública, concentra el 93,93% del presupuesto codificado. A continuación, se presenta la ejecución presupuestaria teniendo en cuenta las entidades que tienen proyectos alineados al objetivo 6.

Tabla 67. Ejecución presupuestaria de los proyectos de inversión por entidad alineados al objetivo 6 (millones de dólares)

| Entidad | Gabinete Sectorial | Nro. de Proyectos | Presupuesto Codificado | Anticipo | Presupuesto Devengado | Presupuesto Ejecutado | % Ejecución |
|--|------------------------|-------------------|------------------------|--------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| | | | (a) | (b) | (c) | (d=b+c) | (d/a) |
| Ministerio de Salud Pública | Salud | 25 | 221,44 | 10,61 | 76,07 | 86,68 | 39,15% |
| Secretaría Técnica Ecuador Crece Sin desnutrición Infantil | Desarrollo Social | 1 | 7,48 | 0,49 | 5,72 | 6,21 | 83,01% |
| Ministerio del Deporte | Desarrollo del Talento | 2 | 5,57 | 0,00 | 3,28 | 3,28 | 58,77% |
| Servicio de Contratación Pública - SERCOP | Económico y Financiero | 1 | 1,26 | 0,00 | 0,89 | 0,89 | 70,22% |
| Total | | 29 | 235,76 | 11,11 | 85,95 | 97,06 | 41,17% |

Fuente: Módulo Seguimiento a la Planificación Institucional del Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública – SIPeIP, Secretaría Nacional de Planificación. Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF, Ministerio de Economía y Finanzas - Ejecución Presupuestaria. Corte 30 de septiembre de 2023.


3.3.2 Análisis del cumplimiento de metas de los proyectos de inversión

Al objetivo 6 del plan se encuentran alineados 29 proyectos de inversión, de los cuales 21 proyectos tienen programación de metas físicas para el tercer trimestre de 2023; y 8 proyectos no cuentan con metas físicas programadas para el mencionado periodo.

De los 21 proyectos que cuentan con programación de metas físicas para el tercer trimestre de 2023, se identifica que el Gabinete Sectorial de Salud cuenta con el mayor número de proyectos con programación de metas, cuya participación es del 80,95% (17 proyectos) alcanzó una ejecución promedio de metas físicas del 76,70%. Los Gabinetes Sectoriales de Desarrollo del Talento, Económico y Financiero y Desarrollo Social tienen una participación 19,05% (4 proyectos de 21), y presentan una ejecución promedio de metas físicas del 18,75%; 62,63% y 100%, respectivamente.

Los 21 proyectos que cuentan con programación de metas físicas para el tercer trimestre de 2023, presentan un presupuesto codificado de USD 171,72 millones, siendo el Gabinete Sectorial de Salud el de mayor participación de presupuesto codificado, tiene 91,66% (USD 157,40 millones), de acuerdo con el siguiente detalle:

Gráfico 10. Porcentaje promedio de ejecución de metas y participación presupuestaria de proyectos por gabinete sectorial alineados al objetivo 6.

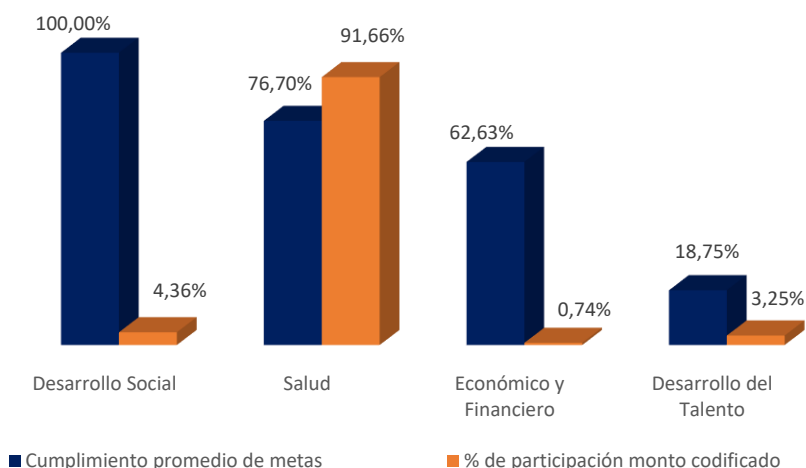

Fuente: Módulo Seguimiento a la Planificación Institucional del Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública – SIPeIP, Secretaría Nacional de Planificación. Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF, Ministerio de Economía y Finanzas - Ejecución Presupuestaria. Corte 30 de septiembre de 2023.

Cumplimiento de metas de los proyectos de inversión por entidad

El Ministerio de Salud Pública, concentran el 93,93% del presupuesto codificado (USD 221,44 millones de un total de USD 235,76 millones de presupuesto codificado), con una participación en proyectos del 86,21% (25 proyectos de 29) alineados al objetivo 6, de los cuales 17 proyectos de 25, cuentan con programación de metas físicas para el tercer trimestre del 2023.

Tabla 68. Proyectos Ministerio de Salud Pública con programación de metas físicas alineados al objetivo 6

| CUP Proyecto | % Programación metas física III Trimestre | % Ejecución meta física III Trimestre | % Cumplimiento metas físicas | | % Programación Presupuestaria III Trimestre | % Ejecución III Trimestre | % Cumplimiento ejecución presupuestaria | |
|-----------------------|---|---------------------------------------|------------------------------|---|---|---------------------------|---|---|
| | (a) | (b) | c (b/a) | | (d) | (e) | f (d/c) | |
| 123200000.0000.374537 | 0,28% | 0,28% | 100,00% | ● | 65,28% | 97,21% | 148,91% | ● |
| 123200000.0000.384104 | 3,60% | 3,60% | 100,00% | ● | 70,35% | 81,40% | 115,71% | ● |
| 123200000.0000.386684 | 0,10% | 0,10% | 100,00% | ● | 50,00% | 0,88% | 1,76% | ● |
| 123200000.0000.386804 | 1,86% | 1,86% | 100,00% | ● | 48,64% | 49,87% | 102,52% | ● |
| 123200000.0000.387091 | 16,50% | 11,58% | 70,18% | ● | 79,28% | 70,63% | 89,09% | ● |
| 123200000.0000.387092 | 90,00% | 90,00% | 100,00% | ● | 99,04% | 73,19% | 73,90% | ● |
| 123200000.0000.387093 | 10,79% | 10,61% | 98,33% | ● | 76,19% | 65,02% | 85,34% | ● |
| 123200000.0000.387181 | 2,66% | 1,50% | 56,39% | ● | 16,67% | 48,20% | 289,16% | ● |

| CUP Proyecto | % Programación metas física III Trimestre | % Ejecución meta física III Trimestre | % Cumplimiento metas físicas | | % Programación Presupuestaria III Trimestre | % Ejecución III Trimestre | % Cumplimiento ejecución presupuestaria |
|-----------------------|---|---------------------------------------|------------------------------|---|---|---------------------------|---|
| | (a) | (b) | c (b/a) | | (d) | (e) | f (d/c) |
| 123200000.0000.387186 | 9,41% | 0,00% | 0,00% | ● | 20,00% | 0,00% | 0,00% ● |
| 123200000.0000.387703 | 13,08% | 13,39% | 100,00% | ● | 70,00% | 24,39% | 34,84% ● |
| 123200000.0000.388030 | 34,93% | 32,44% | 92,87% | ● | 90,90% | 13,25% | 14,58% ● |
| 123200000.0000.388051 | 24,59% | 12,12% | 49,29% | ● | 76,37% | 25,22% | 33,02% ● |
| 123200000.0000.388122 | 54,92% | 52,85% | 96,23% | ● | 70,00% | 54,45% | 77,79% ● |
| 123200000.0000.388123 | 21,81% | 15,67% | 71,85% | ● | 100,00% | 55,79% | 55,79% ● |
| 123200000.0000.388137 | 3,83% | 0,00% | 0,00% | ● | 99,70% | 0,00% | 0,00% ● |
| 123200000.0000.388156 | 20,25% | 13,91% | 68,69% | ● | 83,61% | 27,05% | 32,35% ● |
| 123200000.616.6997 | 0,20% | 0,20% | 100,00% | ● | 100,00% | 87,61% | 87,61% ● |

Semaforización ejecución presupuestaria al tercer trimestre: ● Mayor o igual al 100%; ● 99,99% - 90,00%; ● 89,99% - 0%.

Semaforización ejecución metas al tercer trimestre: ● Mayor o igual al 100%; ● 99,99% - 90,00%; ● 89,99% - 0%.

Fuente: Módulo Seguimiento a la Planificación Institucional del Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública – SIPeIP, Secretaría Nacional de Planificación. Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF, Ministerio de Economía y Finanzas - Ejecución Presupuestaria. Corte 30 de septiembre de 2023.

Objetivo 7: Potenciar las capacidades de la ciudadanía y promover una educación innovadora, inclusiva y de calidad en todos los niveles

Este objetivo se enfoca en la promoción de una educación innovadora, inclusiva y de calidad en todos los niveles; un modelo educativo eficiente y transparente; mejoramiento de la investigación e innovación; libre de violencia, promoviendo la inclusión en las aulas y en todos los niveles de educación; fortalecimiento de la educación superior; perfeccionamiento del docente; y consecución de la excelencia deportiva.

3.3.1 Análisis Presupuestario

Al objetivo 7, se encuentran alineados 256 proyectos para el tercer trimestre de 2023, registrándose un presupuesto codificado de USD 370,67 millones y una ejecución de USD 121,92 millones (32,89% ejecutado).

A nivel de los Gabinetes Sectoriales establecidos, el Gabinete Sectorial de Desarrollo del Talento es el que mayor porcentaje de participación tiene en cuanto al presupuesto codificado, con USD 207,27 millones que representa el 55,92% de participación sobre el presupuesto codificado total, seguido por las instituciones Sin Gabinete con USD 163,40 millones (44,08% de participación).

A continuación, se presenta la ejecución presupuestaria correspondiente para al tercer trimestre de 2023 a nivel de Gabinete Sectorial.

Tabla 69. Ejecución presupuestaria de los proyectos de inversión por gabinete alineados al objetivo 7 (millones de dólares)

| Gabinete Sectorial | Nro. Entidades | Nro. de Proyectos | Presupuesto Codificado | Anticipo | Presupuesto Devengado | Presupuesto Ejecutado | % Ejecución |
|------------------------|----------------|-------------------|------------------------|--------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| | | | (a) | (b) | (c) | (d=b+c) | (d/a) |
| Desarrollo del Talento | 5 | 22 | 207,27 | 14,61 | 68,38 | 82,99 | 40,04% |
| Sin Gabinete | 31 | 234 | 163,40 | 7,71 | 31,22 | 38,93 | 23,82% |
| Total | 36 | 256 | 370,67 | 22,32 | 99,60 | 121,92 | 32,89% |

Fuente: Módulo Seguimiento a la Planificación Institucional del Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública – SIPeIP, Secretaría Nacional de Planificación. Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF, Ministerio de Economía y Finanzas - Ejecución Presupuestaria. Corte 30 de septiembre de 2023.

A nivel de entidades, el Ministerio de Educación, Secretaría de Educación Superior Ciencia Tecnología e Innovación, Ministerio del Deporte, Escuela Politécnica Nacional, Universidad Técnica de Ambato, Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE, Escuela Superior Politécnica del Litoral, Universidad Técnica Estatal de Quevedo, Universidad Nacional de Chimborazo, Universidad Regional Amazónica IKIAM, Escuela Superior Politécnica del Chimborazo, Universidad de Cuenca y Universidad Técnica del Norte, concentran el 81,63% del presupuesto codificado.

A continuación, se presenta la ejecución presupuestaria teniendo en cuenta las entidades que tienen proyectos alineados al objetivo 7.

Tabla 70. Ejecución presupuestaria de los proyectos de inversión por entidad alineados al objetivo 7
(millones de dólares)

| Entidad | Gabinete Sectorial | Nro. de Proyectos | Presupuesto Codificado | Anticipo | Presupuesto Devengado | Presupuesto Ejecutado | % Ejecución |
|--|------------------------|-------------------|------------------------|----------|-----------------------|-----------------------|-------------|
| | | | (a) | (b) | (c) | (d=b+c) | (d/a) |
| Ministerio de Educación | Desarrollo del Talento | 12 | 129,11 | 13,68 | 36,49 | 50,17 | 38,86% |
| Secretaría Nacional de Educación Superior Ciencia Tecnología e Innovación | Desarrollo del Talento | 6 | 56,77 | 0,93 | 17,48 | 18,41 | 32,44% |
| Ministerio del Deporte | Desarrollo del Talento | 2 | 15,75 | 0,00 | 11,63 | 11,63 | 73,86% |
| Escuela Politécnica Nacional | Sin Gabinete | 5 | 15,18 | 0,22 | 2,97 | 3,19 | 21,02% |
| Universidad Técnica de Ambato | Sin Gabinete | 13 | 13,95 | 0,42 | 4,40 | 4,81 | 34,48% |
| Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE | Sin Gabinete | 15 | 11,35 | 0,12 | 0,54 | 0,65 | 5,76% |
| Escuela Superior Politécnica del Litoral | Sin Gabinete | 2 | 11,14 | 0,33 | 2,90 | 3,23 | 28,96% |
| Universidad Técnica Estatal de Quevedo | Sin Gabinete | 2 | 9,53 | 0,25 | 0,05 | 0,29 | 3,07% |
| Universidad Nacional de Chimborazo | Sin Gabinete | 8 | 9,40 | 0,28 | 1,57 | 1,85 | 19,64% |
| Universidad Regional Amazónica IKIAM | Sin Gabinete | 7 | 8,92 | 0,60 | 0,71 | 1,32 | 14,75% |
| Escuela Superior Politécnica del Chimborazo | Sin Gabinete | 9 | 8,23 | 0,36 | 1,86 | 2,22 | 26,99% |
| Universidad de Cuenca | Sin Gabinete | 4 | 6,88 | 1,27 | 1,48 | 2,75 | 39,99% |
| Universidad Técnica del Norte | Sin Gabinete | 10 | 6,36 | 1,11 | 1,96 | 3,06 | 48,16% |
| Universidad Estatal Península de Santa Elena | Sin Gabinete | 31 | 6,22 | 0,06 | 0,27 | 0,32 | 5,20% |
| Universidad Intercultural de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas Amawtay Wasi | Sin Gabinete | 1 | 6,17 | 0,02 | 1,75 | 1,77 | 28,75% |
| Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí | Sin Gabinete | 1 | 5,68 | 1,52 | 1,54 | 3,06 | 53,87% |
| Universidad Politécnica Estatal del Carchi | Sin Gabinete | 2 | 5,54 | 0,24 | 1,13 | 1,37 | 24,75% |

| Entidad | Gabinete Sectorial | Nro. de Proyectos | Presupuesto Codificado | Anticipo | Presupuesto Devengado | Presupuesto Ejecutado | % Ejecución |
|---|------------------------|-------------------|------------------------|--------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| | | | (a) | (b) | (c) | (d=b+c) | (d/a) |
| Universidad Técnica de Manabí | Sin Gabinete | 13 | 5,31 | 0,00 | 1,47 | 1,47 | 27,74% |
| Universidad Técnica de Cotopaxi | Sin Gabinete | 2 | 5,12 | 0,00 | 0,62 | 0,62 | 12,05% |
| Instituto Nacional de Evaluación Educativa | Desarrollo del Talento | 1 | 4,71 | 0,00 | 2,68 | 2,68 | 56,88% |
| Universidad Técnica de Machala | Sin Gabinete | 6 | 3,96 | 0,00 | 0,29 | 0,29 | 7,33% |
| Universidad Central del Ecuador | Sin Gabinete | 4 | 3,68 | 0,58 | 1,04 | 1,62 | 44,04% |
| Universidad Técnica de Babahoyo | Sin Gabinete | 5 | 3,48 | 0,00 | 1,04 | 1,04 | 29,82% |
| Universidad Estatal Amazónica | Sin Gabinete | 8 | 3,16 | 0,18 | 0,00 | 0,19 | 5,89% |
| Universidad Nacional de Loja | Sin Gabinete | 5 | 2,95 | 0,04 | 0,28 | 0,32 | 10,86% |
| Universidad Nacional de Educación UNAE | Sin Gabinete | 1 | 2,14 | 0,00 | 0,08 | 0,08 | 3,76% |
| Universidad de Guayaquil | Sin Gabinete | 3 | 1,91 | 0,11 | 0,66 | 0,76 | 39,91% |
| Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de Manabí | Sin Gabinete | 59 | 1,50 | 0,00 | 0,29 | 0,29 | 19,03% |
| Universidad de las Artes | Sin Gabinete | 1 | 1,13 | 0,03 | 0,02 | 0,05 | 4,30% |
| Universidad Estatal de Milagro | Sin Gabinete | 1 | 0,94 | 0,00 | 0,67 | 0,67 | 71,42% |
| Secretaría de Educación Intercultural Bilingüe y la Etnoeducación | Desarrollo del Talento | 1 | 0,93 | 0,00 | 0,09 | 0,09 | 10,21% |
| Universidad Agraria del Ecuador | Sin Gabinete | 6 | 0,91 | 0,00 | 0,46 | 0,46 | 50,11% |
| Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN) | Sin Gabinete | 1 | 0,90 | 0,00 | 0,39 | 0,39 | 43,66% |
| Universidad Técnica Luis Vargas Torres de Esmeraldas | Sin Gabinete | 4 | 0,86 | 0,00 | 0,64 | 0,64 | 75,24% |
| Universidad Estatal del Sur de Manabí | Sin Gabinete | 4 | 0,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Universidad de Investigación de Tecnología Experimental YACHAY | Sin Gabinete | 1 | 0,23 | 0,00 | 0,14 | 0,14 | 61,29% |
| Total | | 256 | 370,67 | 22,32 | 99,60 | 121,92 | 32,89% |

Fuente: Módulo Seguimiento a la Planificación Institucional del Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública – SIPeIP, Secretaría Nacional de Planificación. Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF, Ministerio de Economía y Finanzas - Ejecución Presupuestaria. Corte 30 de septiembre de 2023.


3.3.2 Análisis del cumplimiento de metas de los proyectos de inversión

Al objetivo 7 del plan se encuentran alineados 256 proyectos de inversión, de estos 177 proyectos tienen programación de metas físicas para el tercer trimestre de 2023; y 79 proyectos no cuentan con metas físicas programadas para el mencionado periodo.

De los 177 proyectos que cuentan con programación de metas físicas al tercer trimestre de 2023, se identifica que las instituciones Sin Gabinete cuentan con el mayor número de proyectos con programación de metas, cuya participación es del 91,53% (162 proyectos) y alcanzaron una ejecución promedio de metas físicas del 78,94%. El Gabinete Sectorial de Desarrollo del Talento tiene una participación 8,47% (15 proyectos) y presenta una ejecución promedio de metas físicas del 53,87%.

Los 177 proyectos que cuentan con programación de metas físicas al tercer trimestre de 2023, presentan un presupuesto codificado de USD 285,69 millones; siendo el Gabinete Sectorial de Desarrollo del Talento el que mayor participación de presupuesto codificado tiene 54,63% (USD 156,07 millones), de acuerdo con el siguiente detalle:

Gráfico 11. Porcentaje promedio de ejecución de metas y participación presupuestaria de proyectos por gabinete sectorial alineados al objetivo 7.

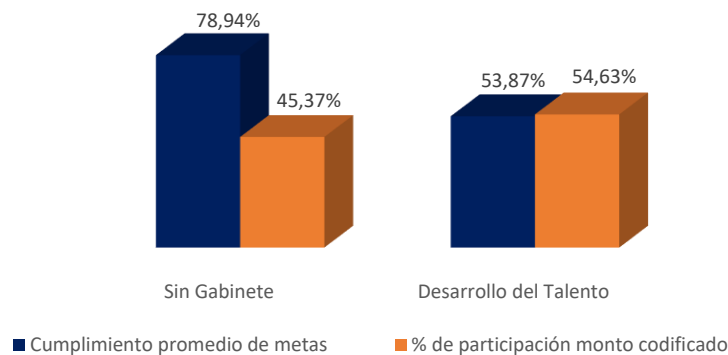

Fuente: Módulo Seguimiento a la Planificación Institucional del Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública – SIPeIP, Secretaría Nacional de Planificación. Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF, Ministerio de Economía y Finanzas - Ejecución Presupuestaria. Corte 30 de septiembre de 2023.

Cumplimiento de metas de los proyectos de inversión por entidad

El Ministerio de Educación, Secretaría de Educación Superior Ciencia Tecnología e Innovación, Ministerio de Deporte, Escuela Politécnica Nacional, Universidad Técnica de Ambato, Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE, Escuela Superior Politécnica del Litoral, Universidad Técnica Estatal de Quevedo, Universidad Nacional de Chimborazo, Universidad Regional Amazónica IKIAM, Escuela Superior Politécnica del Chimborazo, Universidad de Cuenca y Universidad Técnica del Norte, concentran el 81,63% del presupuesto codificado (USD 302,57 millones de un total de USD 370,67 millones de presupuesto codificado), con una participación en proyectos del 37,11% (95 proyectos de 256) alineados al objetivo 7, de los cuales, 69 proyectos cuentan con programación de metas físicas para el tercer trimestre de 2023.

A continuación, se realiza un análisis de los 69 proyectos, con programación de metas, de las entidades antes mencionadas correspondiente al tercer trimestre de 2023, teniendo en cuenta para el efecto, la ejecución presupuestaria, la programación de avance físico y su cumplimiento.

Ministerio de Educación

El Ministerio de Educación cuenta con 12 proyectos alineados al objetivo 7, con un total de presupuesto codificado de USD 129,11 millones, de los cuales 6 proyectos tienen programación de metas físicas al tercer trimestre de 2023 y su presupuesto codificado es de USD 77,91 millones.

Tabla 71. Proyectos de la Ministerio de Educación con programación de metas físicas alineados al objetivo 7

| CUP Proyecto | % Programación metas físicas III Trimestre | % Ejecución meta física III Trimestre | % Cumplimiento metas físicas | | % Programación Presupuestaria III Trimestre | % Ejecución III Trimestre | % Cumplimiento ejecución presupuestaria | |
|----------------------|--|---------------------------------------|------------------------------|---|---|---------------------------|---|---|
| | (a) | (b) | c (b/a) | | (d) | (e) | f (d/c) | |
| 91400000.0000.387227 | 44,19% | 14,48% | 32,77% | ● | 99,50% | 50,67% | 50,93% | ● |
| 91400000.0000.388010 | 46,67% | 17,77% | 38,08% | ● | 65,47% | 20,41% | 31,17% | ● |
| 91400000.0000.388011 | 14,26% | 0,59% | 4,14% | ● | 68,63% | 26,38% | 38,44% | ● |
| 91400000.0000.388014 | 4,39% | 0,00% | 0,00% | ● | 50,59% | 1,47% | 2,91% | ● |
| 91400000.0000.388016 | 13,38% | 6,77% | 50,60% | ● | 29,38% | 13,18% | 44,86% | ● |
| 91400000.0000.388025 | 10,00% | 0,00% | 0,00% | ● | 47,66% | 0,00% | 0,00% | ● |

Semaforización ejecución presupuestaria al tercer trimestre: ● Mayor o igual al 100%; ● 99,99% - 90,00%; ● 89,99% - 0%.

Semaforización ejecución metas al tercer trimestre: ● Mayor o igual al 100%; ● 99,99% - 90,00%; ● 89,99% - 0%.

Fuente: Módulo Seguimiento a la Planificación Institucional del Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública – SIPeIP, Secretaría Nacional de Planificación. Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF, Ministerio de Economía y Finanzas - Ejecución Presupuestaria. Corte 30 de septiembre de 2023.

Secretaría Nacional de Educación Superior Ciencia Tecnología e Innovación

La Institución cuenta con 6 proyectos alineados al objetivo 7, con un total de presupuesto codificado de USD 56,77 millones, de los cuales 5 proyectos tienen programación de metas físicas al tercer trimestre de 2023 y su presupuesto codificado es de USD 56,77 millones.

Tabla 72. Proyectos del Secretaría Nacional de Educación Superior Ciencia Tecnología e Innovación con programación de metas físicas alineados al objetivo 7

| CUP Proyecto | % Programación metas físicas III Trimestre | % Ejecución meta física III Trimestre | % Cumplimiento metas físicas | | % Programación Presupuestaria III Trimestre | % Ejecución III Trimestre | % Cumplimiento ejecución presupuestaria | |
|-----------------------|--|---------------------------------------|------------------------------|---|---|---------------------------|---|---|
| | (a) | (b) | c (b/a) | | (d) | (e) | f (d/c) | |
| 091590000.0000.372829 | 0,10% | 0,15% | 100,00% | ● | 100,00% | 84,76% | 84,76% | ● |
| 091590000.0000.375416 | 7,78% | 6,53% | 83,93% | ● | 87,63% | 28,17% | 32,15% | ● |
| 091590000.0000.387067 | 12,27% | 9,00% | 73,35% | ● | 83,23% | 23,95% | 28,78% | ● |
| 091590000.0000.387075 | 3,33% | 13,33% | 100,00% | ● | 99,40% | 87,07% | 87,59% | ● |
| 091590000.0000.387082 | 7,04% | 2,50% | 35,51% | ● | 59,95% | 17,09% | 28,51% | ● |

Semaforización ejecución presupuestaria al tercer trimestre: ● Mayor o igual al 100%; ● 99,99% - 90,00%; ● 89,99% - 0%.

Semaforización ejecución metas al tercer trimestre: ● Mayor o igual al 100%; ● 99,99% - 90,00%; ● 89,99% - 0%.

Fuente: Módulo Seguimiento a la Planificación Institucional del Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública – SIPeIP, Secretaría Nacional de Planificación. Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF, Ministerio de Economía y Finanzas - Ejecución Presupuestaria. Corte 30 de septiembre de 2023.

Ministerio de Deporte

El Ministerio de Deporte cuenta con 2 proyectos alineados al objetivo 7, con un total de presupuesto codificado de USD 15,75 millones, mismos que tienen programación de metas físicas al tercer trimestre de 2023 y su presupuesto codificado es de USD 15,75 millones.

Tabla 73. Proyectos del Ministerio de Deporte con programación de metas físicas alineados al objetivo 7

| CUP Proyecto | % Programación metas físicas III Trimestre | % Ejecución meta física III Trimestre | % Cumplimiento metas físicas | | % Programación Presupuestaria III Trimestre | % Ejecución III Trimestre | % Cumplimiento ejecución presupuestaria | |
|----------------------|--|---------------------------------------|------------------------------|---|---|---------------------------|---|---|
| | (a) | (b) | c (b/a) | | (d) | (e) | f (d/c) | |
| 91480000.0000.387211 | 14,16% | 12,70% | 89,69% | ● | 98,32% | 73,86% | 75,12% | ● |



| CUP Proyecto | % Programación metas física III Trimestre | % Ejecución meta física III Trimestre | % Cumplimiento metas físicas | | % Programación Presupuestaria III Trimestre | % Ejecución III Trimestre | % Cumplimiento ejecución presupuestaria | |
|----------------------|---|---------------------------------------|------------------------------|--|---|---------------------------|---|--|
| | (a) | (b) | c (b/a) | | (d) | (e) | f (d/c) | |
| 91480000.0000.388416 | 100,00% | 0,00% | 0,00% | | 100,00% | 0,00% | 0,00% | |

Semaforización ejecución presupuestaria al tercer trimestre: ● Mayor o igual al 100%; ● 99,99% - 90,00%; ● 89,99% - 0%.

Semaforización ejecución metas al tercer trimestre: ● Mayor o igual al 100%; ● 99,99% - 90,00%; ● 89,99% - 0%.

Fuente: Módulo Seguimiento a la Planificación Institucional del Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública – SIPeIP, Secretaría Nacional de Planificación. Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF, Ministerio de Economía y Finanzas - Ejecución Presupuestaria. Corte 30 de septiembre de 2023.

Escuela Politécnica Nacional

La Escuela Politécnica Nacional cuenta con 5 proyectos alineados al objetivo 7, con un total de presupuesto codificado de USD 15,18 millones, de los cuales 5 proyectos tienen programación de metas físicas al tercer trimestre de 2023 y su presupuesto codificado es de USD 15,18 millones.

Tabla 74. Proyectos de la Escuela Politécnica Nacional con programación de metas físicas alineados al objetivo 7

| CUP Proyecto | % Programación metas física III Trimestre | % Ejecución meta física III Trimestre | % Cumplimiento metas físicas | | % Programación Presupuestaria III Trimestre | % Ejecución III Trimestre | % Cumplimiento ejecución presupuestaria | |
|----------------------|---|---------------------------------------|------------------------------|--|---|---------------------------|---|--|
| | (a) | (b) | c (b/a) | | (d) | (e) | f (d/c) | |
| 91770000.0000.373813 | 2,75% | 2,75% | 100,00% | | 100,00% | 22,55% | 22,55% | |
| 91770000.0000.375094 | 3,33% | 3,33% | 100,00% | | 100,00% | 55,10% | 55,10% | |
| 91770000.0000.376441 | 1,74% | 1,74% | 100,00% | | 100,00% | 51,94% | 51,94% | |
| 91770000.0000.376442 | 5,32% | 5,32% | 100,00% | | 100,00% | 26,77% | 26,77% | |
| 91770000.0000.378192 | 17,43% | 4,37% | 25,07% | | 100,00% | 14,40% | 14,40% | |

Semaforización ejecución presupuestaria al tercer trimestre: ● Mayor o igual al 100%; ● 99,99% - 90,00%; ● 89,99% - 0%.

Semaforización ejecución metas al tercer trimestre: ● Mayor o igual al 100%; ● 99,99% - 90,00%; ● 89,99% - 0%.

Fuente: Módulo Seguimiento a la Planificación Institucional del Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública – SIPeIP, Secretaría Nacional de Planificación. Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF, Ministerio de Economía y Finanzas - Ejecución Presupuestaria. Corte 30 de septiembre de 2023.

Universidad Técnica de Ambato

La Universidad Técnica de Ambato cuenta con 13 proyectos alineados al objetivo 7, con un total de presupuesto codificado de USD 13,95 millones, de los cuales 11 proyectos tienen programación de metas físicas al tercer trimestre de 2023 y su presupuesto codificado es de USD 11,52 millones.

Tabla 75. Proyectos del Universidad Técnica de Ambato con programación de metas físicas alineados al objetivo 7

| CUP Proyecto | % Programación metas física III Trimestre | % Ejecución meta física III Trimestre | % Cumplimiento metas físicas | | % Programación Presupuestaria III Trimestre | % Ejecución III Trimestre | % Cumplimiento ejecución presupuestaria | |
|----------------------|---|---------------------------------------|------------------------------|--|---|---------------------------|---|--|
| | (a) | (b) | c (b/a) | | (d) | (e) | f (d/c) | |
| 91760000.0000.373738 | 2,40% | 1,60% | 66,67% | | 100,00% | 33,37% | 33,37% | |
| 91760000.0000.373808 | 11,90% | 7,39% | 62,10% | | 100,00% | 33,05% | 33,05% | |
| 91760000.0000.374334 | 4,28% | 4,58% | 100,00% | | 100,00% | 22,45% | 22,45% | |
| 91760000.0000.374696 | 3,89% | 5,24% | 100,00% | | 100,00% | 47,37% | 47,37% | |
| 91760000.0000.375507 | 3,33% | 4,33% | 100,00% | | 100,00% | 52,38% | 52,38% | |
| 91760000.0000.377386 | 5,52% | 6,80% | 100,00% | | 100,00% | 14,51% | 14,51% | |
| 91760000.0000.378235 | 1,11% | 0,98% | 88,29% | | 100,00% | 9,14% | 9,14% | |
| 91760000.0000.378238 | 22,52% | 22,53% | 100,00% | | 100,00% | 59,82% | 59,82% | |

| CUP Proyecto | % Programación metas físicas III Trimestre | % Ejecución meta física III Trimestre | % Cumplimiento metas físicas | | % Programación Presupuestaria III Trimestre | % Ejecución III Trimestre | % Cumplimiento ejecución presupuestaria | |
|----------------------|--|---------------------------------------|------------------------------|---|---|---------------------------|---|---|
| | (a) | (b) | c (b/a) | | (d) | (e) | f (d/c) | |
| 91760000.0000.378241 | 3,61% | 1,11% | 30,75% | ● | 100,00% | 38,48% | 38,48% | ● |
| 91760000.0000.385987 | 17,91% | 17,91% | 100,00% | ● | 100,00% | 75,87% | 75,87% | ● |
| 91760000.844.3274 | 5,00% | 6,00% | 100,00% | ● | 100,00% | 39,57% | 39,57% | ● |

Semaforización ejecución presupuestaria al tercer trimestre: ● Mayor o igual al 100%; ● 99,99% - 90,00%; ● 89,99% - 0%.

Semaforización ejecución metas al tercer trimestre: ● Mayor o igual al 100%; ● 99,99% - 90,00%; ● 89,99% - 0%.

Fuente: Módulo Seguimiento a la Planificación Institucional del Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública – SIPeIP, Secretaría Nacional de Planificación. Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF, Ministerio de Economía y Finanzas - Ejecución Presupuestaria. Corte 30 de septiembre de 2023.

Universidad de las Fuerzas Armadas - ESPE

La Universidad de las Fuerzas Armadas – ESPE, cuenta con 15 proyectos alineados al objetivo 7, con un total de presupuesto codificado de USD 11,35 millones, de los cuales 8 proyectos tienen programación de metas físicas al tercer trimestre de 2023 y su presupuesto codificado es de USD 10,15 millones.

Tabla 76. Proyectos Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE, con programación de metas físicas alineados al objetivo 7

| CUP Proyecto | % Programación metas físicas III Trimestre | % Ejecución meta física III Trimestre | % Cumplimiento metas físicas | | % Programación Presupuestaria III Trimestre | % Ejecución III Trimestre | % Cumplimiento ejecución presupuestaria | |
|----------------------|--|---------------------------------------|------------------------------|---|---|---------------------------|---|---|
| | (a) | (b) | c (b/a) | | (d) | (e) | f (d/c) | |
| 91890000.0000.376969 | 0,50% | 0,00% | 0,00% | ● | 100,00% | 1,36% | 1,36% | ● |
| 91890000.0000.382753 | 2,01% | 0,00% | 0,00% | ● | 100,00% | 0,00% | 0,00% | ● |
| 91890000.0000.383721 | 6,50% | 3,25% | 50,00% | ● | 13,27% | 13,57% | 102,26% | ● |
| 91890000.0000.384099 | 5,00% | 5,00% | 100,00% | ● | 100,00% | 1,15% | 1,15% | ● |
| 91890000.0000.384791 | 12,68% | 4,10% | 32,33% | ● | 95,34% | 34,61% | 36,30% | ● |
| 91890000.0000.384794 | 3,00% | 3,00% | 100,00% | ● | 55,94% | 6,48% | 11,58% | ● |
| 91890000.0000.387183 | 13,74% | 13,74% | 100,00% | ● | 100,00% | 31,96% | 31,96% | ● |
| 91890000.0000.388141 | 53,23% | 39,66% | 74,51% | ● | 67,31% | 4,33% | 6,43% | ● |

Semaforización ejecución presupuestaria al tercer trimestre: ● Mayor o igual al 100%; ● 99,99% - 90,00%; ● 89,99% - 0%.

Semaforización ejecución metas al tercer trimestre: ● Mayor o igual al 100%; ● 99,99% - 90,00%; ● 89,99% - 0%.

Fuente: Módulo Seguimiento a la Planificación Institucional del Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública – SIPeIP, Secretaría Nacional de Planificación. Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF, Ministerio de Economía y Finanzas - Ejecución Presupuestaria. Corte 30 de septiembre de 2023.

Escuela Superior Politécnica del Litoral

La Escuela Superior Politécnica del Litoral, cuenta con 2 proyectos alineados al objetivo 7, con un total de presupuesto codificado de USD 11,14 millones, de los cuales 2 proyectos tienen programación de metas físicas al tercer trimestre de 2023 y su presupuesto codificado es de USD 11,14 millones.

Tabla 77. Proyectos de la Escuela Superior Politécnica del Litoral con programación de metas físicas alineados al objetivo 7

| CUP Proyecto | % Programación metas físicas III Trimestre | % Ejecución meta física III Trimestre | % Cumplimiento metas físicas | | % Programación Presupuestaria III Trimestre | % Ejecución III Trimestre | % Cumplimiento ejecución presupuestaria | |
|--------------------|--|---------------------------------------|------------------------------|---|---|---------------------------|---|---|
| | (a) | (b) | c (b/a) | | (d) | (e) | f (d/c) | |
| 91670000.1305.5712 | 2,32% | 2,55% | 100,00% | ● | 93,90% | 41,62% | 44,32% | ● |

| CUP Proyecto | % Programación metas física III Trimestre | % Ejecución meta física III Trimestre | % Cumplimiento metas físicas | | % Programación Presupuestaria III Trimestre | % Ejecución III Trimestre | % Cumplimiento ejecución presupuestaria | |
|-------------------|---|---------------------------------------|------------------------------|---|---|---------------------------|---|---|
| | (a) | (b) | c (b/a) | | (d) | (e) | f (d/c) | |
| 91670000.217.2656 | 1,22% | 1,08% | 88,52% | ● | 45,00% | 28,74% | 63,87% | ● |

Semaforización ejecución presupuestaria al tercer trimestre: ● Mayor o igual al 100%; ● 99,99% - 90,00%; ● 89,99% - 0%.

Semaforización ejecución metas al tercer trimestre: ● Mayor o igual al 100%; ● 99,99% - 90,00%; ● 89,99% - 0%.

Fuente: Módulo Seguimiento a la Planificación Institucional del Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública – SIPeIP, Secretaría Nacional de Planificación. Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF, Ministerio de Economía y Finanzas - Ejecución Presupuestaria. Corte 30 de septiembre de 2023.

Universidad Técnica Estatal de Quevedo

La Universidad Técnica Estatal de Quevedo cuenta con 2 proyectos alineados al objetivo 7, con un total de presupuesto codificado de USD 9,53 millones, de los cuales 2 proyectos tienen programación de metas físicas al tercer trimestre de 2023 y su presupuesto codificado es de USD 9,53 millones.

Tabla 78. Proyectos de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo con programación de metas físicas alineados al objetivo 7

| CUP Proyecto | % Programación metas física III Trimestre | % Ejecución meta física III Trimestre | % Cumplimiento metas físicas | | % Programación Presupuestaria III Trimestre | % Ejecución III Trimestre | % Cumplimiento ejecución presupuestaria | |
|----------------------|---|---------------------------------------|------------------------------|---|---|---------------------------|---|---|
| | (a) | (b) | c (b/a) | | (d) | (e) | f (d/c) | |
| 91720000.0000.388071 | 22,40% | 14,40% | 64,29% | ● | 56,00% | 3,09% | 5,52% | ● |
| 91720000.0000.388073 | 19,05% | 12,50% | 65,62% | ● | 70,00% | 3,07% | 4,39% | ● |

Semaforización ejecución presupuestaria al tercer trimestre: ● Mayor o igual al 100%; ● 99,99% - 90,00%; ● 89,99% - 0%.

Semaforización ejecución metas al tercer trimestre: ● Mayor o igual al 100%; ● 99,99% - 90,00%; ● 89,99% - 0%.

Fuente: Módulo Seguimiento a la Planificación Institucional del Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública – SIPeIP, Secretaría Nacional de Planificación. Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF, Ministerio de Economía y Finanzas - Ejecución Presupuestaria. Corte 30 de septiembre de 2023.

Universidad Nacional de Chimborazo

La Universidad Nacional de Chimborazo, cuenta con 8 proyectos alineados al objetivo 7, con un total de presupuesto codificado de USD 9,40 millones, de los cuales 6 proyectos tienen programación de metas físicas al tercer trimestre de 2023 y su presupuesto codificado es de USD 6,44 millones.

Tabla 79. Proyectos Universidad Nacional de Chimborazo con programación de metas físicas alineados al objetivo 7

| CUP Proyecto | % Programación metas física III Trimestre | % Ejecución meta física III Trimestre | % Cumplimiento metas físicas | | % Programación Presupuestaria III Trimestre | % Ejecución III Trimestre | % Cumplimiento ejecución presupuestaria | |
|----------------------|---|---------------------------------------|------------------------------|---|---|---------------------------|---|---|
| | (a) | (b) | c (b/a) | | (d) | (e) | f (d/c) | |
| 91800000.0000.382162 | 15,00% | 15,00% | 100,00% | ● | 74,67% | 24,61% | 32,96% | ● |
| 91800000.0000.383004 | 3,30% | 3,30% | 100,00% | ● | 72,73% | 94,02% | 129,28% | ● |
| 91800000.0000.383924 | 4,57% | 4,57% | 100,00% | ● | 100,00% | 100,00% | 100,00% | ● |
| 91800000.0000.385004 | 45,00% | 13,00% | 28,89% | ● | 87,58% | 0,00% | 0,00% | ● |
| 91800000.0000.385392 | 12,74% | 12,74% | 100,00% | ● | 74,70% | 73,14% | 97,92% | ● |

| CUP Proyecto | % Programación metas física III Trimestre | % Ejecución meta física III Trimestre | % Cumplimiento metas físicas | | % Programación Presupuestaria III Trimestre | % Ejecución III Trimestre | % Cumplimiento ejecución presupuestaria | |
|-------------------|---|---------------------------------------|------------------------------|---|---|---------------------------|---|---|
| | (a) | (b) | c (b/a) | | (d) | (e) | f (d/c) | |
| 91800000.727.7353 | 9,65% | 4,75% | 49,22% | ● | 100,00% | 0,00% | 0,00% | ● |

Semaforización ejecución presupuestaria al tercer trimestre: ● Mayor o igual al 100%; ● 99,99% - 90,00%; ● 89,99% - 0%.

Semaforización ejecución metas al tercer trimestre: ● Mayor o igual al 100%; ● 99,99% - 90,00%; ● 89,99% - 0%.

Fuente: Módulo Seguimiento a la Planificación Institucional del Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública – SIPeIP, Secretaría Nacional de Planificación. Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF, Ministerio de Economía y Finanzas - Ejecución Presupuestaria. Corte 30 de septiembre de 2023.

Universidad Regional Amazónica IKIAM

La Universidad Regional Amazónica IKIAM, cuenta con 7 proyectos alineados al objetivo 7, con un total de presupuesto codificado de USD 8,92 millones, de los cuales 5 proyectos tienen programación de metas físicas al tercer trimestre de 2023 y su presupuesto codificado es de USD 0,46 millones.

Tabla 80. Proyectos de la Universidad Regional Amazónica IKIAM, con programación de metas físicas alineados al objetivo 7

| CUP Proyecto | % Programación metas física III Trimestre | % Ejecución meta física III Trimestre | % Cumplimiento metas físicas | | % Programación Presupuestaria III Trimestre | % Ejecución III Trimestre | % Cumplimiento ejecución presupuestaria | |
|-----------------------|---|---------------------------------------|------------------------------|---|---|---------------------------|---|---|
| | (a) | (b) | c (b/a) | | (d) | (e) | f (d/c) | |
| 090870000.0000.383083 | 11,36% | 11,36% | 100,00% | ● | 100,00% | 57,40% | 57,40% | ● |
| 090870000.0000.385684 | 26,67% | 20,00% | 74,99% | ● | 47,39% | 58,70% | 123,85% | ● |
| 090870000.0000.385825 | 78,00% | 78,00% | 100,00% | ● | 100,00% | 45,06% | 45,06% | ● |
| 090870000.0000.386567 | 6,25% | 6,25% | 100,00% | ● | 100,00% | 54,03% | 54,03% | ● |
| 090870000.0000.387244 | 100,00% | 100,00% | 100,00% | ● | 100,00% | 70,10% | 70,10% | ● |

Semaforización ejecución presupuestaria al tercer trimestre: ● Mayor o igual al 100%; ● 99,99% - 90,00%; ● 89,99% - 0%.

Semaforización ejecución metas al tercer trimestre: ● Mayor o igual al 100%; ● 99,99% - 90,00%; ● 89,99% - 0%.

Fuente: Módulo Seguimiento a la Planificación Institucional del Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública – SIPeIP, Secretaría Nacional de Planificación. Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF, Ministerio de Economía y Finanzas - Ejecución Presupuestaria. Corte 30 de septiembre de 2023.

Escuela Superior Politécnica del Chimborazo

La Escuela Superior Politécnica del Chimborazo, cuenta con 9 proyectos alineados al objetivo 7, con un total de presupuesto codificado de USD 8,23 millones, de los cuales 4 proyectos tienen programación de metas físicas al tercer trimestre de 2023 y su presupuesto codificado es de USD 5,08 millones.

Tabla 81. Proyectos de la Escuela Superior Politécnica del Chimborazo con programación de metas físicas alineados al objetivo 7

| CUP Proyecto | % Programación metas física III Trimestre | % Ejecución meta física III Trimestre | % Cumplimiento metas físicas | | % Programación Presupuestaria III Trimestre | % Ejecución III Trimestre | % Cumplimiento ejecución presupuestaria | |
|----------------------|---|---------------------------------------|------------------------------|---|---|---------------------------|---|---|
| | (a) | (b) | c (b/a) | | (d) | (e) | f (d/c) | |
| 91630000.0000.382677 | 17,00% | 17,00% | 100,00% | ● | 100,00% | 32,22% | 32,22% | ● |
| 91630000.0000.382737 | 25,00% | 25,00% | 100,00% | ● | 100,00% | 36,12% | 36,12% | ● |
| 91630000.0000.382746 | 3,93% | 3,93% | 100,00% | ● | 45,01% | 41,52% | 92,25% | ● |
| 91630000.0000.386384 | 5,46% | 5,46% | 100,00% | ● | 70,00% | 55,76% | 79,66% | ● |

Semaforización ejecución presupuestaria al tercer trimestre: ● Mayor o igual al 100%; ● 99,99% - 90,00%; ● 89,99% - 0%.

Semaforización ejecución metas al tercer trimestre: ● Mayor o igual al 100%; ● 99,99% - 90,00%; ● 89,99% - 0%.



Fuente: Módulo Seguimiento a la Planificación Institucional del Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública – SIpEIP, Secretaría Nacional de Planificación. Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF, Ministerio de Economía y Finanzas - Ejecución Presupuestaria. Corte 30 de septiembre de 2023.

Universidad de Cuenca

La Universidad de Cuenca, cuenta con 4 proyectos alineados al objetivo 7, con un total de presupuesto codificado de USD 6,88 millones, de los cuales 4 proyectos tienen programación de metas físicas al tercer trimestre de 2023 y su presupuesto codificado es de USD 6,88 millones.

Tabla 82. Proyectos de la Universidad de Cuenca, con programación de metas físicas alineados al objetivo 7

| CUP Proyecto | % Programación metas física III Trimestre | % Ejecución meta física III Trimestre | % Cumplimiento metas físicas | | % Programación Presupuestaria III Trimestre | % Ejecución III Trimestre | % Cumplimiento ejecución presupuestaria | |
|----------------------|---|---------------------------------------|------------------------------|---|---|---------------------------|---|---|
| | (a) | (b) | c (b/a) | | (d) | (e) | f (d/c) | |
| 91610000.0000.376324 | 4,64% | 6,53% | 100,00% | ● | 75,00% | 10,77% | 14,36% | ● |
| 91610000.0000.388219 | 15,00% | 10,00% | 66,67% | ● | 60,00% | 88,89% | 148,15% | ● |
| 91610000.807.3723 | 5,10% | 4,67% | 91,57% | ● | 75,00% | 26,43% | 35,24% | ● |
| 91610000.807.4084 | 5,00% | 5,00% | 100,00% | ● | 75,00% | 32,36% | 43,15% | ● |

Semaforización ejecución presupuestaria al tercer trimestre: ● Mayor o igual al 100%; ● 99,99% - 90,00%; ● 89,99% - 0%.

Semaforización ejecución metas al tercer trimestre: ● Mayor o igual al 100%; ● 99,99% - 90,00%; ● 89,99% - 0%.

Fuente: Módulo Seguimiento a la Planificación Institucional del Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública – SIpEIP, Secretaría Nacional de Planificación. Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF, Ministerio de Economía y Finanzas - Ejecución Presupuestaria. Corte 30 de septiembre de 2023.

Universidad Técnica del Norte

La Universidad de Cuenca, cuenta con 10 proyectos alineados al objetivo 7, con un total de presupuesto codificado de USD 6,36 millones, de los cuales 9 proyectos tienen programación de metas físicas al tercer trimestre de 2023 y su presupuesto codificado es de USD 6,36 millones.

Tabla 83. Proyectos de la Universidad Técnica del Norte, con programación de metas físicas alineados al objetivo 7

| CUP Proyecto | % Programación metas física III Trimestre | % Ejecución meta física III Trimestre | % Cumplimiento metas físicas | | % Programación Presupuestaria III Trimestre | % Ejecución III Trimestre | % Cumplimiento ejecución presupuestaria | |
|----------------------|---|---------------------------------------|------------------------------|---|---|---------------------------|---|---|
| | (a) | (b) | c (b/a) | | (d) | (e) | f (d/c) | |
| 91690000.0000.384792 | 33,00% | 33,00% | 100,00% | ● | 50,00% | 100,00% | 200,00% | ● |
| 91690000.0000.386965 | 49,15% | 0,00% | 0,00% | ● | 50,00% | 0,00% | 0,00% | ● |
| 91690000.0000.387195 | 100,00% | 100,00% | 100,00% | ● | 100,00% | 100,00% | 100,00% | ● |
| 91690000.0000.387202 | 33,33% | 33,33% | 100,00% | ● | 50,00% | 75,00% | 150,00% | ● |
| 91690000.0000.388217 | 2,32% | 68,38% | 100,00% | ● | 100,00% | 79,06% | 79,06% | ● |
| 91690000.0000.388218 | 55,25% | 51,75% | 93,67% | ● | 49,22% | 31,09% | 63,16% | ● |
| 91690000.0000.388220 | 50,00% | 0,00% | 0,00% | ● | 50,00% | 0,00% | 0,00% | ● |
| 91690000.0000.388314 | 37,75% | 51,00% | 100,00% | ● | 50,30% | 67,28% | 133,75% | ● |
| 91690000.0000.388374 | 25,00% | 0,00% | 0,00% | ● | 50,00% | 0,00% | 0,00% | ● |

Semaforización ejecución presupuestaria al tercer trimestre: ● Mayor o igual al 100%; ● 99,99% - 90,00%; ● 89,99% - 0%.

Semaforización ejecución metas al tercer trimestre: ● Mayor o igual al 100%; ● 99,99% - 90,00%; ● 89,99% - 0%.

Fuente: Módulo Seguimiento a la Planificación Institucional del Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública – SIpEIP, Secretaría Nacional de Planificación. Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF, Ministerio de Economía y Finanzas - Ejecución Presupuestaria. Corte 30 de septiembre de 2023.

Objetivo 8: Generar nuevas oportunidades y bienestar para las zonas rurales, con énfasis en pueblos y nacionalidades

Este objetivo se enfoca en la generación de nuevas oportunidades para el bienestar de los habitantes de las zonas rurales, mediante la generación de oportunidades de empleo, incremento de la cobertura de la seguridad social, con acceso a un hábitat seguro y vivienda digna, con pertenencia cultural en educación, salud, conectividad, agua potable y saneamiento bajo la implementación de políticas públicas.

3.3.1 Análisis Presupuestario

Al objetivo 8, se encuentran alineados 6 proyectos para el tercer trimestre de 2023, registrándose un presupuesto codificado de USD 8,29 millones y una ejecución de USD 2,96 millones (35,68% ejecutado).

A nivel de los Gabinetes Sectoriales establecidos, el Gabinete Sectorial de Desarrollo Territorial es el que mayor porcentaje de participación tiene en cuanto al presupuesto codificado, con USD 5,25 millones (63,33% de participación), seguido por el Gabinete Sectorial de Desarrollo de Inversiones con USD 1,74 millones (20,94% de participación). El Gabinete Sectorial de Desarrollo del Talento con USD 1,30 millones (15,73% de participación).

A continuación, se presenta la ejecución presupuestaria correspondiente al tercer trimestre de 2023 a nivel de Gabinete Sectorial.

Tabla 84. Ejecución presupuestaria de los proyectos de inversión por gabinete alineados al objetivo 8 (millones de dólares)

| Gabinete Sectorial | Nro. Entidades | Nro. de Proyectos | Presupuesto Codificado | Anticipo | Presupuesto Devengado | Presupuesto Ejecutado | % Ejecución |
|---------------------------|----------------|-------------------|------------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| | | | (a) | (b) | (c) | (d=b+c) | (d/a) |
| Desarrollo Territorial | 2 | 3 | 5,25 | - | 2,09 | 2,09 | 39,89% |
| Desarrollo de Inversiones | 1 | 1 | 1,74 | - | - | - | 0,00% |
| Desarrollo del Talento | 2 | 2 | 1,30 | 0,04 | 0,82 | 0,86 | 66,22% |
| Total | 5 | 6 | 8,29 | 0,04 | 2,91 | 2,96 | 35,68% |

Fuente: Módulo Seguimiento a la Planificación Institucional del Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública – SIPeIP, Secretaría Nacional de Planificación. Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF, Ministerio de Economía y Finanzas - Ejecución Presupuestaria. Corte 30 de septiembre de 2023.

A nivel de entidades, la Secretaría de Gestión y Desarrollo de Pueblos y Nacionalidades, el Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria y el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, concentran el 84,27% del presupuesto codificado. A continuación, se presenta la ejecución presupuestaria teniendo en cuenta las entidades que tienen proyectos alineados al objetivo 8.

Tabla 85. Ejecución presupuestaria de los proyectos de inversión por entidad alineados al objetivo 8 (millones de dólares)

| Entidad | Gabinete Sectorial | Nro. de Proyectos | Presupuesto Codificado | Anticipo | Presupuesto Devengado | Presupuesto Ejecutado | % Ejecución |
|--|---------------------------|-------------------|------------------------|----------|-----------------------|-----------------------|-------------|
| | | | (a) | (b) | (c) | (d=b+c) | (d/a) |
| Secretaría de Gestión y desarrollo de Pueblos y Nacionalidades | Desarrollo Territorial | 2 | 3,11 | 0,00 | 1,57 | 1,57 | 50,56% |
| Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria | Desarrollo Territorial | 1 | 2,14 | 0,00 | 0,52 | 0,52 | 24,36% |
| Ministerio de Transporte y Obras Públicas | Desarrollo de Inversiones | 1 | 1,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

| Entidad | Gabinete Sectorial | Nro. de Proyectos | Presupuesto Codificado | Anticipo | Presupuesto Devengado | Presupuesto Ejecutado | % Ejecución |
|---|------------------------|-------------------|------------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| | | | (a) | (b) | (c) | (d=b+c) | (d/a) |
| Instituto Nacional de Patrimonio Cultural | Desarrollo del Talento | 1 | 1,04 | 0,00 | 0,80 | 0,80 | 76,55% |
| Ministerio de Educación | Desarrollo del Talento | 1 | 0,26 | 0,04 | 0,02 | 0,07 | 25,01% |
| Total | | 6 | 8,29 | 0,04 | 2,91 | 2,96 | 35,68% |

Fuente: Módulo Seguimiento a la Planificación Institucional del Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública – SIPeIP, Secretaría Nacional de Planificación. Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF, Ministerio de Economía y Finanzas - Ejecución Presupuestaria. Corte 30 de septiembre de 2023.


3.3.2 Análisis del cumplimiento de metas de los proyectos de inversión

Al objetivo 8 del plan se encuentran alineados 6 proyectos de inversión, de los cuales 5 proyectos tienen programación de metas físicas para el tercer trimestre de 2023; y 1 proyectos no cuentan con metas físicas programadas para el mencionado periodo.

De los 5 proyectos que cuentan con programación de metas físicas al tercer trimestre de 2023, se identifica que el Gabinete Sectorial de Desarrollo Territorial cuenta con 2 proyectos con programación de metas, cuya participación es del 40,00% (2 proyectos) y alcanza una ejecución promedio de metas físicas del 14,18%. Los Gabinetes Sectoriales de Desarrollo de Inversiones y Desarrollo del Talento tienen una participación del 60,00% (3 proyectos cada gabinete) y presenta una ejecución promedio de metas físicas del 0,00% y 50,00%; respectivamente.

Los 5 proyectos que cuentan con programación de metas físicas al tercer trimestre de 2023 presentan un presupuesto codificado de USD 8,27 millones, siendo el Gabinete Sectorial de Desarrollo Territorial que mayor participación de presupuesto codificado tiene 63,27% (USD 5,23 millones), de acuerdo con el siguiente detalle:

Gráfico 12. Porcentaje promedio de ejecución de metas y participación presupuestaria de proyectos por gabinete sectorial alineados al objetivo 8.

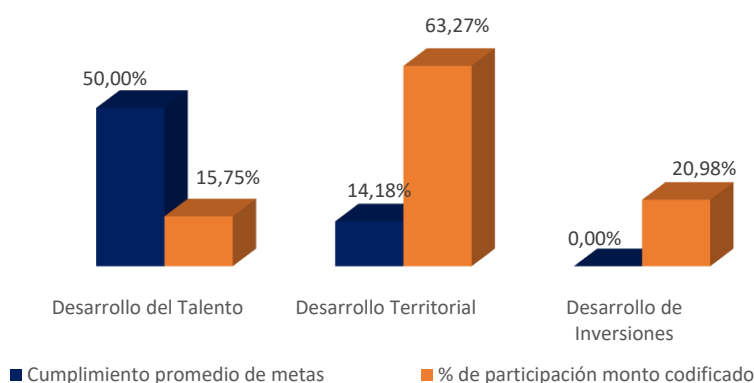

Fuente: Módulo Seguimiento a la Planificación Institucional del Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública – SIPeIP, Secretaría Nacional de Planificación. Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF, Ministerio de Economía y Finanzas - Ejecución Presupuestaria. Corte 30 de septiembre de 2023.

Cumplimiento de metas de los proyectos de inversión por entidad

La Secretaría de Gestión y Desarrollo de Pueblos y Nacionalidades, el Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria y el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, concentra el 84,27% del presupuesto codificado (USD 6,98 millones de un total de USD 8,29 millones de presupuesto codificado), con una participación en proyectos del 66,67% (4 proyectos de 6 proyectos) alineado al

objetivo 8, los mismos que 3 registran programación de metas físicas para el tercer trimestre del año 2023.

A continuación, se realiza un análisis de los proyectos de las entidades antes mencionadas correspondiente al tercer trimestre de 2023, teniendo en cuenta para el efecto, la ejecución presupuestaria, la programación de avance físico y su cumplimiento.

Secretaría de Gestión y Desarrollo de Pueblos y Nacionalidades

La Secretaría de Gestión y Desarrollo de Pueblos y Nacionalidades cuenta con 2 proyectos alineados al objetivo 8, con un total de presupuesto codificado de USD 3,11 millones, de los cuales 1 proyecto tiene programación de metas físicas al tercer trimestre de 2023.

Tabla 86. Proyectos de la Secretaría de Gestión y Desarrollo de Pueblos y Nacionalidades con programación de metas físicas alineados al objetivo 8

| CUP Proyecto | % Programación metas física III Trimestre | % Ejecución meta física III Trimestre | % Cumplimiento metas físicas | | % Programación Presupuestaria III Trimestre | % Ejecución III Trimestre | % Cumplimiento ejecución presupuestaria | |
|-----------------------|---|---------------------------------------|------------------------------|---|---|---------------------------|---|---|
| | (a) | (b) | c (b/a) | | (d) | (e) | f (d/c) | |
| 106860000.0000.387192 | 10,46% | 0,82% | 7,84% | ● | 88,63% | 50,35% | 56,81% | ● |

Semaforización ejecución presupuestaria al tercer trimestre: ● Mayor o igual al 100%; ● 99,99% - 90,00%; ● 89,99% - 0%.

Semaforización ejecución metas al tercer trimestre: ● Mayor o igual al 100%; ● 99,99% - 90,00%; ● 89,99% - 0%.

Fuente: Módulo Seguimiento a la Planificación Institucional del Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública – SIPeIP, Secretaría Nacional de Planificación. Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF, Ministerio de Economía y Finanzas - Ejecución Presupuestaria. Corte 30 de septiembre de 2023.

Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria

El Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria cuenta con 1 proyecto alineado al objetivo 8, con un total de presupuesto codificado de USD 2,14 millones, de los cuales 1 proyecto tiene programación de metas físicas al tercer trimestre de 2023.

Tabla 87. Proyectos del Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria con programación de metas físicas alineados al objetivo 8

| CUP Proyecto | % Programación metas física III Trimestre | % Ejecución meta física III Trimestre | % Cumplimiento metas físicas | | % Programación Presupuestaria III Trimestre | % Ejecución III Trimestre | % Cumplimiento ejecución presupuestaria | |
|----------------------|---|---------------------------------------|------------------------------|---|---|---------------------------|---|---|
| | (a) | (b) | c (b/a) | | (d) | (e) | f (d/c) | |
| 50610000.0000.386064 | 0,39% | 0,08% | 20,51% | ● | 83,72% | 24,36% | 29,10% | ● |

Semaforización ejecución presupuestaria al tercer trimestre: ● Mayor o igual al 100%; ● 99,99% - 90,00%; ● 89,99% - 0%.

Semaforización ejecución metas al tercer trimestre: ● Mayor o igual al 100%; ● 99,99% - 90,00%; ● 89,99% - 0%.

Fuente: Módulo Seguimiento a la Planificación Institucional del Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública – SIPeIP, Secretaría Nacional de Planificación. Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF, Ministerio de Economía y Finanzas - Ejecución Presupuestaria. Corte 30 de septiembre de 2023.

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

El Ministerio de Transporte y Obras Públicas cuenta con 1 proyecto alineado al objetivo 8, con un total de presupuesto codificado de USD 1,74 millones, de los cuales 1 proyecto tiene programación de metas físicas al tercer trimestre de 2023.

Tabla 88. Proyectos del Ministerio de Transporte y Obras Públicas

| CUP Proyecto | % Programación metas física III Trimestre | % Ejecución meta física III Trimestre | % Cumplimiento metas físicas | | % Programación Presupuestaria III Trimestre | % Ejecución III Trimestre | % Cumplimiento ejecución presupuestaria |
|-----------------------|---|---------------------------------------|------------------------------|--|---|---------------------------|---|
| | (a) | (b) | c (b/a) | | (d) | (e) | f (d/c) |
| 175200000.0000.387507 | 91,98% | 0,00% | 0,00% | | 100,00% | 0,00% | 0,00% |

Semaforización ejecución presupuestaria al tercer trimestre: ● Mayor o igual al 100%; ● 99,99% - 90,00%; ● 89,99% - 0%.

Semaforización ejecución metas al tercer trimestre: ● Mayor o igual al 100%; ● 99,99% - 90,00%; ● 89,99% - 0%.

Fuente: Módulo Seguimiento a la Planificación Institucional del Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública – SIPeIP, Secretaría Nacional de Planificación. Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF, Ministerio de Economía y Finanzas - Ejecución Presupuestaria. Corte 30 de septiembre de 2023.

Objetivo 9: Garantizar la seguridad ciudadana, orden público y gestión de riesgos

Este objetivo se enfoca en la defensa nacional, protección interna y el orden público como competencias exclusivas del Estado que garanticen una convivencia pacífica y segura para los ciudadanos, previniendo formas de violencia y discriminación. Para lograrlo se requiere plantear políticas de seguridad orientadas a erradicar la delincuencia común, el crimen organizado interno y transnacional, la inseguridad vial, y; el tráfico ilegal de drogas, de armas de fuego y terrorismo en todas sus formas. Además, fortalecer el sistema penitenciario y la gestión de riesgos.

3.3.1 Análisis Presupuestario

Al objetivo 9, se encuentran alineados 19 proyectos para el tercer trimestre de 2023, registrándose un presupuesto codificado de USD 185,04 millones y una ejecución de USD 66,10 millones (35,73% ejecutado).

A nivel de los Gabinetes Sectoriales establecidos, el Gabinete Sectorial de Seguridad es el que mayor porcentaje de participación tiene en cuanto al presupuesto codificado, con USD 181,26 millones que representa el 97,96% de participación sobre el presupuesto codificado total, seguido del Gabinete Sectorial de Desarrollo de Inversiones con un presupuesto codificado de USD 3,78 millones (2,04% de participación).

A continuación, se presenta la ejecución presupuestaria correspondiente al tercer trimestre de 2023 a nivel de Gabinete Sectorial.

Tabla 89. Ejecución presupuestaria de los proyectos de inversión por gabinete alineados al objetivo 9
(millones de dólares)

| Gabinete Sectorial | Nro. Entidades | Nro. de Proyectos | Presupuesto Codificado | Anticipo | Presupuesto Devengado | Presupuesto Ejecutado | % Ejecución |
|---------------------------|----------------|-------------------|------------------------|--------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| | | | (a) | (b) | (c) | (d=b+c) | (d/a) |
| Seguridad | 5 | 15 | 181,26 | 19,68 | 44,60 | 64,28 | 35,46% |
| Desarrollo de Inversiones | 3 | 4 | 3,78 | - | 1,83 | 1,83 | 48,30% |
| Total | 8 | 19 | 185,04 | 19,68 | 46,43 | 66,10 | 35,73% |

Fuente: Módulo Seguimiento a la Planificación Institucional del Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública – SIPeIP, Secretaría Nacional de Planificación. Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF, Ministerio de Economía y Finanzas - Ejecución Presupuestaria. Corte 30 de septiembre de 2023.

A nivel de entidades, la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, el Ministerio del Interior, y el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de La Libertad y Adolescentes Infractores, concentran el 92,82% del presupuesto codificado. A continuación, se presenta la ejecución presupuestaria teniendo en cuenta las entidades que tienen proyectos alineados al objetivo 9.

**Tabla 90. Ejecución presupuestaria de los proyectos de inversión por entidad alineados al objetivo 9
(millones de dólares)**

| Entidad | Gabinete Sectorial | Nro. de Proyectos | Presupuesto Codificado | Anticipo | Presupuesto Devengado | Presupuesto Ejecutado | % Ejecución |
|--|---------------------------|-------------------|------------------------|--------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| | | | (a) | (b) | (c) | (d=b+c) | (d/a) |
| Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos | Seguridad | 4 | 73,83 | 0,97 | 33,81 | 34,78 | 47,11% |
| Ministerio del Interior | Seguridad | 7 | 67,93 | 17,10 | 4,14 | 21,24 | 31,27% |
| Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores | Seguridad | 1 | 30,00 | 1,60 | 6,22 | 7,82 | 26,08% |
| Dirección General de Aviación Civil | Seguridad | 2 | 8,58 | 0,00 | 0,26 | 0,26 | 3,04% |
| Comisión de Tránsito del Ecuador | Desarrollo de Inversiones | 1 | 2,53 | 0,00 | 1,72 | 1,72 | 67,87% |
| Ministerio de Transporte y Obras Públicas | Desarrollo de Inversiones | 1 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 | Seguridad | 1 | 0,92 | 0,00 | 0,17 | 0,17 | 18,77% |
| Instituto de Investigación Geológico y Energético - IIGE | Desarrollo de Inversiones | 2 | 0,25 | 0,00 | 0,11 | 0,11 | 43,66% |
| Total | | 19 | 185,04 | 19,68 | 46,43 | 66,10 | 35,73% |


Fuente: Módulo Seguimiento a la Planificación Institucional del Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública – SIPeIP, Secretaría Nacional de Planificación. Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF, Ministerio de Economía y Finanzas - Ejecución Presupuestaria. Corte 30 de septiembre de 2023.

3.3.2 Análisis del cumplimiento de metas de los proyectos de inversión

Al objetivo 9 del plan se encuentran alineados 19 proyectos de inversión, de los cuales 9 proyectos tienen programación de metas físicas para el tercer trimestre de 2023; y 10 proyectos no cuentan con metas físicas programadas para el mencionado período.

Los proyectos que cuentan con programación de metas físicas para el tercer trimestre de 2023, pertenecen a los Gabinetes de Seguridad y Sectorial de Desarrollo de Inversiones, alcanzando una ejecución promedio de metas físicas de 56,77% y 65,50% respectivamente, el mismo que cuentan con un presupuesto codificado de USD 45,84 y 2,78 millones en el mismo orden descrito anteriormente.

Gráfico 13. Porcentaje promedio de ejecución de metas y participación presupuestaria de proyectos por gabinete sectorial alineados al objetivo 9.

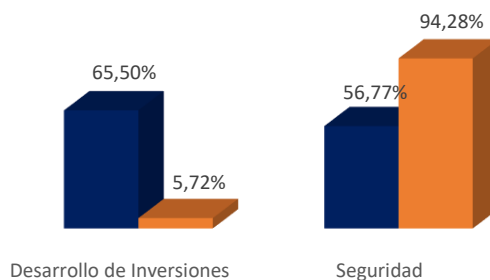

■ Cumplimiento promedio de metas ■ % de participación monto codificado

Fuente: Módulo Seguimiento a la Planificación Institucional del Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública – SIPeIP, Secretaría Nacional de Planificación. Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF, Ministerio de Economía y Finanzas - Ejecución Presupuestaria. Corte 30 de septiembre de 2023.

Cumplimiento de metas de los proyectos de inversión por entidad

La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, el Ministerio del Interior, y el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de La Libertad y Adolescentes Infractores, concentran el 92,82% del presupuesto codificado (USD 171,76 millones de un total de USD 185,04 millones de presupuesto codificado), con una participación en proyectos del 63,16% (12 proyectos de 19) alineados al objetivo 9; 4 proyectos de las entidades mencionadas; presentan programación de metas físicas para el tercer trimestre de 2023.

La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos

El Secretaria Nacional de Gestión de Riesgos, cuenta con 4 proyectos alineados al objetivo 9, con un total de presupuesto codificado de USD 73,83 millones, de los cuales 2 proyecto tiene programación de metas físicas al tercer trimestre de 2023.

Tabla 91. Proyectos Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos con programación de metas físicas alineados al objetivo 9

| CUP Proyecto | % Programación metas física III Trimestre | % Ejecución meta física III Trimestre | % Cumplimiento metas físicas | | % Programación Presupuestaria III Trimestre | % Ejecución III Trimestre | % Cumplimiento ejecución presupuestaria | |
|----------------------|---|---------------------------------------|------------------------------|---|---|---------------------------|---|---|
| | (a) | (b) | c (b/a) | | (d) | (e) | f (d/c) | |
| 30340000.0000.387104 | 5,91% | 7,62% | 100,00% | ● | 79,76% | 32,70% | 41,00% | ● |
| 30340000.238.4408 | 6,37% | 6,37% | 100,00% | ● | 100,00% | 34,40% | 34,40% | ● |

Fuente: Módulo Seguimiento a la Planificación Institucional del Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública – SIPeIP, Secretaría Nacional de Planificación. Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF, Ministerio de Economía y Finanzas - Ejecución Presupuestaria. Corte 30 de septiembre de 2023.

Ministerio de Interior

El Ministerio del Interior, cuenta con 7 proyectos alineados al objetivo 9, con un total de presupuesto codificado de USD 67,93 millones, de los cuales 1 proyecto tiene programación de metas físicas al tercer trimestre de 2023.

Tabla 92. Proyecto del Ministerio del Interior con programación de metas físicas alineados al objetivo 9

| CUP Proyecto | % Programación metas física III Trimestre | % Ejecución meta física III Trimestre | % Cumplimiento metas físicas | | % Programación Presupuestaria III Trimestre | % Ejecución III Trimestre | % Cumplimiento ejecución presupuestaria | |
|----------------------|---|---------------------------------------|------------------------------|---|---|---------------------------|---|---|
| | (a) | (b) | c (b/a) | | (d) | (e) | f (d/c) | |
| 50500000.0000.387220 | 1,49% | 0,00% | 0,00% | ● | 50,00% | 0,00% | 0,00% | ● |

Fuente: Módulo Seguimiento a la Planificación Institucional del Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública – SIPeIP, Secretaría Nacional de Planificación. Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF, Ministerio de Economía y Finanzas - Ejecución Presupuestaria. Corte 30 de septiembre de 2023.

Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores

El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores, cuenta con 1 proyecto alineado al objetivo 9, con un total de presupuesto codificado de USD 30,00 millones, de los cuales 1 proyecto tiene programación de metas físicas al tercer trimestre de 2023.

Tabla 93. Proyecto del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertada y Adolescentes Infractores con programación de metas físicas alineados al objetivo 9

| CUP Proyecto | % Programación metas física II Trimestre | % Ejecución meta física II Trimestre | % Cumplimiento metas físicas | % Programación Presupuestaria II Trimestre | % Ejecución II Trimestre | % Cumplimiento ejecución presupuestaria |
|----------------------|--|--------------------------------------|------------------------------|--|--------------------------|---|
| | (a) | (b) | (b/a) | (c) | (d) | (d/c) |
| 55780000.0000.387286 | 6,50% | 5,87% | 90,31% | 30,00% | 10,45% | 34,83% |

Fuente: Módulo Seguimiento a la Planificación Institucional del Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública – SIPeIP, Secretaría Nacional de Planificación. Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF, Ministerio de Economía y Finanzas - Ejecución Presupuestaria. Corte 30 de septiembre de 2023.

Objetivo 10: Garantizar la soberanía nacional, integridad territorial y seguridad del Estado

Este objetivo se enfoca en la implementación de medidas que inhiban el potencial de agresión mediante la disuasión defensiva, alerta temprana, la acción preventiva ante los conflictos y el fomento de medidas de confianza y seguridad entre los Estados para lograr la estabilidad y paz; con la finalidad de estar atentos a las amenazas globales que tienen una connotación transnacional que podrían afectar a la defensa y seguridad de los Estados, entre amenazas tenemos: terrorismo, narcotráfico y sus delitos conexos, crimen organizado, ciberataques, exploración y explotación ilegal de la riqueza marítima y, delincuencia organizada transnacional.

La defensa de la soberanía e integridad territorial contempla el espacio continental, insular, aéreo, marítimo, ulterior y ciberespacio.

3.3.1 Análisis Presupuestario

Al objetivo 10, se encuentran alineados 17 proyectos para el tercer trimestre de 2023, registrándose un presupuesto codificado de USD 319,17 millones y una ejecución de USD 56,17 millones (17,60% ejecutado).

A nivel de los Gabinetes Sectoriales establecidos, el Gabinete Sectorial de Seguridad es el único Gabinete alineado a este objetivo, a continuación, se presenta la ejecución presupuestaria correspondiente al tercer trimestre de 2023.

Tabla 94. Ejecución presupuestaria de los proyectos de inversión por gabinete alineados al objetivo 10 (millones de dólares)

| Gabinete Sectorial | Nro. Entidades | Nro. de Proyectos | Presupuesto Codificado | Anticipo | Presupuesto Devengado | Presupuesto Ejecutado | % Ejecución |
|--------------------|----------------|-------------------|------------------------|--------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| | | | (a) | (b) | (c) | (d=b+c) | (d/a) |
| Seguridad | 2 | 17 | 319,17 | 47,33 | 8,84 | 56,17 | 17,60% |
| Total | 2 | 17 | 319,17 | 47,33 | 8,84 | 56,17 | 17,60% |

Fuente: Módulo Seguimiento a la Planificación Institucional del Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública – SIPeIP, Secretaría Nacional de Planificación. Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF, Ministerio de Economía y Finanzas - Ejecución Presupuestaria. Corte 30 de septiembre de 2023.

A nivel de entidades, el Ministerio de Defensa Nacional, concentra el 99,51% del presupuesto codificado. A continuación, se presenta la ejecución presupuestaria teniendo en cuenta las entidades que tienen proyectos alineados al objetivo 10.

Tabla 95. Ejecución presupuestaria de los proyectos de inversión por entidad alineados al objetivo 10 (millones de dólares)


| Entidad | Gabinete Sectorial | Nro. de Proyectos | Presupuesto Codificado | Anticipo | Presupuesto Devengado | Presupuesto Ejecutado | % Ejecución |
|--------------------------------|--------------------|-------------------|------------------------|--------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| | | | (a) | (b) | (c) | (d=b+c) | (d/a) |
| Ministerio de Defensa Nacional | Seguridad | 16 | 317,61 | 47,33 | 7,85 | 55,18 | 17,37% |
| Instituto Geográfico Militar | Seguridad | 1 | 1,56 | 0,00 | 0,99 | 0,99 | 63,21% |
| Total | | 17 | 319,17 | 47,33 | 8,84 | 56,17 | 17,60% |

Fuente: Módulo Seguimiento a la Planificación Institucional del Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública – SIPeIP, Secretaría Nacional de Planificación. Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF, Ministerio de Economía y Finanzas - Ejecución Presupuestaria. Corte 30 de septiembre de 2023.

3.3.2 Análisis del cumplimiento de metas de los proyectos de inversión

Al objetivo 10 del Plan se encuentran alineados 17 proyectos de inversión, de los cuales 13 proyectos tienen programación de metas físicas para el tercer trimestre de 2023.

El Gabinete Sectorial de Seguridad concentra el 100,00% (13 proyectos) que cuentan con programación de metas físicas al tercer trimestre de 2023, y alcanzaron una ejecución promedio de metas físicas del 48,45%, con un presupuesto codificado de USD 245,56 millones.

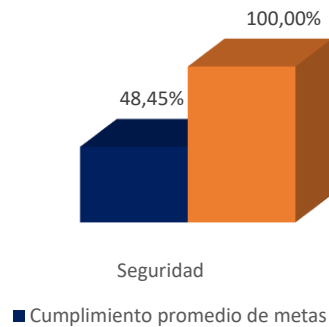Gráfico 14. Porcentaje promedio de ejecución de metas y participación presupuestaria de proyectos por gabinete sectorial alineados al objetivo 10.

Fuente: Módulo Seguimiento a la Planificación Institucional del Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública – SIPeIP, Secretaría Nacional de Planificación. Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF, Ministerio de Economía y Finanzas - Ejecución Presupuestaria. Corte 30 de septiembre de 2023.

Cumplimiento de metas de los proyectos de inversión por entidad

El Ministerio de Defensa Nacional concentra el 99,51% del presupuesto codificado (USD 317,61 millones de un total de USD 319,17 millones de presupuesto codificado), con una participación en proyectos del 94,12% (16 proyectos de 17) alineados al objetivo 10, de los cuales 12 proyectos cuentan con programación de metas físicas para el tercer trimestre de 2023.

Ministerio de Defensa Nacional

El Ministerio de Defensa Nacional cuenta con 16 proyectos alineados al objetivo 10, con un total de presupuesto codificado de USD 317,61 millones, de los cuales 12 proyecto cuenta con programación de metas físicas al tercer trimestre de 2023 y su presupuesto codificado es de USD 244,00 millones.

Tabla 96. Proyectos del Ministerio de Defensa Nacional con programación de metas físicas alineados al objetivo 10

| CUP Proyecto | % Programación metas física III Trimestre | % Ejecución meta física III Trimestre | % Cumplimiento metas físicas | | % Programación Presupuestaria III Trimestre | % Ejecución III Trimestre | % Cumplimiento ejecución presupuestaria | |
|----------------------|---|---------------------------------------|------------------------------|---|---|---------------------------|---|---|
| | (a) | (b) | c (b/a) | | (d) | (e) | f (d/c) | |
| 60700000.0000.375983 | 2,11% | 1,10% | 52,13% | ● | 100,00% | 48,92% | 48,92% | ● |
| 60700000.0000.376154 | 100,00% | 100,00% | 100,00% | ● | 0,00% | 100,00% | Ejecución presupuestaria sin programación | Ejecución presupuestaria sin programación |
| 60700000.0000.382365 | 30,00% | 3,60% | 12,00% | ● | 100,00% | 31,94% | 31,94% | ● |
| 60700000.0000.382572 | 0,03% | 0,01% | 33,33% | ● | 100,00% | 15,58% | 15,58% | ● |
| 60700000.0000.386824 | 29,40% | 29,40% | 100,00% | ● | 100,00% | 100,00% | 100,00% | ● |
| 60700000.0000.386904 | 8,64% | 0,00% | 0,00% | ● | 50,00% | 0,00% | 0,00% | ● |
| 60700000.0000.387102 | 23,43% | 18,58% | 79,30% | ● | 0,00% | 5,76% | Ejecución presupuestaria sin programación | Ejecución presupuestaria sin programación |
| 60700000.0000.387103 | 17,14% | 0,00% | 0,00% | ● | 100,00% | 0,00% | 0,00% | ● |
| 60700000.0000.387112 | 0,50% | 0,00% | 0,00% | ● | 0,00% | 0,00% | - | ● |
| 60700000.0000.387160 | 23,60% | 12,50% | 52,97% | ● | 0,00% | 5,89% | Ejecución presupuestaria sin programación | Ejecución presupuestaria sin programación |
| 60700000.0000.387981 | 20,05% | 0,03% | 0,15% | ● | 100,00% | 45,40% | 45,40% | ● |
| 60700000.0000.388000 | 17,09% | 17,09% | 100,00% | ● | 100,00% | 40,03% | 40,03% | ● |

Semaforización ejecución presupuestaria al tercer trimestre: ● Mayor o igual al 100%; ● 99,99% - 90,00%; ● 89,99% - 0%.

Semaforización ejecución metas al tercer trimestre: ● Mayor o igual al 100%; ● 99,99% - 90,00%; ● 89,99% - 0%.

Fuente: Módulo Seguimiento a la Planificación Institucional del Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública – SIPeIP, Secretaría Nacional de Planificación. Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF, Ministerio de Economía y Finanzas - Ejecución Presupuestaria. Corte 30 de septiembre de 2023.

Objetivo 11: Conservar, restaurar, proteger y hacer un uso sostenible de los recursos naturales

Este objetivo se enfoca en proponer avances en las condiciones legales, económicas y de protección ambiental para lograr el funcionamiento de las actividades humanas en el marco de la transición ecológica, a través de la programación de acciones que permita la conservación de los hábitats, la gestión eficiente de los recursos naturales y la reparación de los ecosistemas.

3.3.1 Análisis Presupuestario

Al objetivo 11, se encuentran alineados 8 proyectos para el tercer trimestre de 2023, registrándose un presupuesto codificado de USD 12,49 millones y una ejecución de USD 6,42 millones (51,43% ejecutado).

A nivel de los Gabinetes Sectoriales establecidos, el Gabinete Sectorial de Desarrollo Productivo es el que mayor porcentaje de participación tiene en cuanto al presupuesto codificado 95,32%, con un presupuesto codificado de USD 11,91 millones, seguido por el Gabinete Sectorial de sin Gabinete con USD 0,48 millones (3,87% de participación).

A continuación, se presenta la ejecución presupuestaria correspondiente al tercer trimestre de 2023 a nivel de Gabinete Sectorial.

Tabla 97. Ejecución presupuestaria de los proyectos de inversión por gabinete alineados al objetivo 11
(millones de dólares)

| Gabinete Sectorial | Nro. Entidades | Nro. de Proyectos | Presupuesto Codificado | Anticipo | Presupuesto Devengado | Presupuesto Ejecutado | % Ejecución |
|---------------------------|----------------|-------------------|------------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| | | | (a) | (b) | (c) | (d=b+c) | (d/a) |
| Desarrollo Productivo | 1 | 6 | 11,91 | 0,03 | 6,24 | 6,27 | 52,62% |
| Sin Gabinete | 1 | 1 | 0,48 | 0,00 | 0,08 | 0,08 | 17,25% |
| Desarrollo de Inversiones | 1 | 1 | 0,10 | 0,00 | 0,08 | 0,08 | 75,07% |
| Total | 3 | 8 | 11,02 | 0,03 | 6,40 | 6,42 | 51,43% |

Fuente: Módulo Seguimiento a la Planificación Institucional del Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública – SIPeIP, Secretaría Nacional de Planificación. Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF, Ministerio de Economía y Finanzas - Ejecución Presupuestaria. Corte 30 de septiembre de 2023.

A nivel de entidades, el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica, concentra el 95,32% del presupuesto codificado. A continuación, se presenta la ejecución presupuestaria teniendo en cuenta las entidades que tienen proyectos alineados al objetivo 11.

Tabla 98. Ejecución presupuestaria de los proyectos de inversión por entidad alineados al objetivo 11 (millones de dólares)

| Entidad | Gabinete Sectorial | Nro. de Proyectos | Presupuesto Codificado | Anticipo | Presupuesto Devengado | Presupuesto Ejecutado | % Ejecución |
|--|---------------------------|-------------------|------------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| | | | (a) | (b) | (c) | (d=b+c) | (d/a) |
| Ministerio del Ambiente y Agua | Desarrollo Productivo | 6 | 11,91 | 0,03 | 6,24 | 6,27 | 52,62% |
| Parque Nacional Galápagos | Sin Gabinete | 1 | 0,48 | 0,00 | 0,08 | 0,08 | 17,25% |
| Instituto de Investigación Geológico y Energético - IIGE | Desarrollo de Inversiones | 1 | 0,10 | 0,00 | 0,08 | 0,08 | 75,07% |
| Total | | 8 | 12,49 | 0,03 | 6,40 | 6,42 | 51,43% |

Fuente: Módulo Seguimiento a la Planificación Institucional del Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública – SIPeIP, Secretaría Nacional de Planificación. Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF, Ministerio de Economía y Finanzas - Ejecución Presupuestaria. Corte 30 de septiembre de 2023.


3.3.2 Análisis del cumplimiento de metas de los proyectos de inversión

Al objetivo 11 del plan se encuentran alineados 8 proyectos de inversión, de los cuales 6 proyectos tienen programación de metas físicas para el tercer trimestre de 2023; y 2 proyectos no cuentan con metas físicas programadas para el mencionado periodo.

De los 6 proyectos que cuentan con programación de metas físicas para el tercer trimestre de 2023, se identifica que el Gabinete Sectorial de Desarrollo Productivo cuenta con los 5 proyectos que concentra el 83,33% de participación de proyectos y el Gabinete de Desarrollo de Inversiones 1 proyecto que concentra el 16,67% con programación de metas físicas y alcanzaron una ejecución promedio de metas físicas del 95,52% y 0,00% respectivamente.

Los 6 proyectos que cuentan con programación de metas físicas para el tercer trimestre de 2023 presentan un presupuesto codificado de USD 10,08 millones, siendo el Gabinete Sectorial de Desarrollo Productivo con el mayor porcentaje de participación en el presupuesto codificado con el 99,00% (USD 9,98 millones), de acuerdo con el siguiente detalle:

Gráfico 15. Porcentaje promedio de ejecución de metas y participación presupuestaria de proyectos por gabinete sectorial alineados al objetivo 11.



Fuente: Módulo Seguimiento a la Planificación Institucional del Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública – SIPeIP, Secretaría Nacional de Planificación. Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF, Ministerio de Economía y Finanzas - Ejecución Presupuestaria. Corte 30 de septiembre de 2023.

Cumplimiento de metas de los proyectos de inversión por entidad

El Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica, concentran el 95,32% del presupuesto codificado (USD 11,91 millones de un total de USD 12,49 millones de presupuesto codificado), con una participación en proyectos del 75,00% (6 proyectos de 8 proyectos) alineados al objetivo 11, de los cuales 5 proyectos cuentan con programación de metas físicas para el tercer trimestre de 2023 y su presupuesto codificado es de USD 9,98 millones.

Tabla 99. Proyectos del Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica con programación de metas físicas alineados al objetivo 11

| CUP Proyecto | % Programación metas física III Trimestre | % Ejecución meta física III Trimestre | % Cumplimiento metas físicas | | % Programación Presupuestaria III Trimestre | % Ejecución III Trimestre | % Cumplimiento ejecución presupuestaria | |
|----------------------|---|---------------------------------------|------------------------------|---|---|---------------------------|---|---|
| | (a) | (b) | c (b/a) | | (d) | (e) | f (d/c) | |
| 40400000.0000.372409 | 11,38% | 12,43% | 100,00% | ● | 80,44% | 58,40% | 72,60% | ● |
| 46090000.0000.387080 | 3,33% | 3,33% | 100,00% | ● | 89,79% | 23,99% | 26,72% | ● |
| 46090000.0000.387085 | 10,10% | 7,84% | 77,62% | ● | 53,24% | 57,33% | 107,68% | ● |
| 46090000.0000.387111 | 8,64% | 8,64% | 100,00% | ● | 100,00% | 20,37% | 20,37% | ● |
| 46090000.0000.387188 | 18,77% | 22,32% | 100,00% | ● | 67,80% | 68,12% | 100,47% | ● |

Semaforización ejecución presupuestaria al tercer trimestre: ● Mayor o igual al 100%; ● 99,99% - 90,00%; ● 89,99% - 0%.

Semaforización ejecución metas al tercer trimestre: ● Mayor o igual al 100%; ● 99,99% - 90,00%; ● 89,99% - 0%.

Fuente: Módulo Seguimiento a la Planificación Institucional del Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública – SIPeIP, Secretaría Nacional de Planificación. Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF, Ministerio de Economía y Finanzas - Ejecución Presupuestaria. Corte 30 de septiembre de 2023.

Objetivo 12: Fomentar modelos de desarrollo sostenibles aplicando medidas de adaptación y mitigación al Cambio Climático

Este objetivo se enfoca en la generación e implementación de un modelo económico circular que busque el aprovechamiento sostenible y equitativo de los recursos, marcando un nuevo desafío en la reducción, reutilización y el reciclaje, mediante la incentivación de innovación de nuevas tecnologías que optimicen la recuperación con métodos de producción eficientes, reduciendo los efectos del cambio climático.

3.3.1 Análisis Presupuestario

Al objetivo 12, se encuentran alineados 20 proyectos para el tercer trimestre de 2023, registrándose un presupuesto codificado de USD 80,80 millones y una ejecución de USD 23,69 millones (29,32% ejecutado).

A nivel de los Gabinetes Sectoriales establecidos, el Gabinete Sectorial de Desarrollo de Inversiones es el que mayor porcentaje de participación tiene en cuanto al presupuesto codificado, con USD 78,52 millones (97,18% de participación), seguido por el Gabinete Sectorial de Desarrollo Productivo con USD 2,28 millones (2,82% de participación).

A continuación, se presenta la ejecución presupuestaria correspondiente al tercer trimestre de 2023 a nivel de Gabinete Sectorial.

Tabla 100. Ejecución presupuestaria de los proyectos de inversión por gabinete alineados al objetivo 12 (millones de dólares)

| Gabinete Sectorial | Nro. Entidades | Nro. de Proyectos | Presupuesto Codificado | Anticipo | Presupuesto Devengado | Presupuesto Ejecutado | % Ejecución |
|---------------------------|----------------|-------------------|------------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| | | | (a) | (b) | (c) | (d=b+c) | (d/a) |
| Desarrollo de Inversiones | 2 | 17 | 78,52 | 0,00 | 22,24 | 22,24 | 28,33% |
| Desarrollo Productivo | 2 | 3 | 2,28 | 0,31 | 1,14 | 1,45 | 63,65% |
| Total | 4 | 20 | 80,80 | 0,31 | 23,28 | 23,69 | 29,32% |

Fuente: Módulo Seguimiento a la Planificación Institucional del Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública – SIPeIP, Secretaría Nacional de Planificación. Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF, Ministerio de Economía y Finanzas - Ejecución Presupuestaria. Corte 30 de septiembre de 2023.

A nivel de entidades, el Ministerio de Energía y Minas concentra el 96,68% del presupuesto codificado. A continuación, se presenta la ejecución presupuestaria teniendo en cuenta las entidades que tienen proyectos alineados al objetivo 12.

Tabla 101. Ejecución presupuestaria de los proyectos de inversión por entidad alineados al objetivo 12 (millones de dólares)

| Entidad | Gabinete Sectorial | Nro. de Proyectos | Presupuesto Codificado | Anticipo | Presupuesto Devengado | Presupuesto Ejecutado | % Ejecución |
|--|---------------------------|-------------------|------------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| | | | (a) | (b) | (c) | (d=b+c) | (d/a) |
| Ministerio de Energía y Minas | Desarrollo de Inversiones | 12 | 78,12 | 0,00 | 22,02 | 22,02 | 28,18% |
| Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología - INAMHI | Desarrollo Productivo | 1 | 1,39 | 0,31 | 0,52 | 0,83 | 60,15% |
| Ministerio del Ambiente y Agua | Desarrollo Productivo | 2 | 0,89 | 0,00 | 0,62 | 0,62 | 69,11% |
| Instituto de Investigación Geológico y Energético - IIGE | Desarrollo de Inversiones | 5 | 0,40 | 0,00 | 0,23 | 0,23 | 56,36% |
| Total | | 20 | 80,80 | 0,31 | 23,38 | 23,69 | 29,32% |

Fuente: Módulo Seguimiento a la Planificación Institucional del Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública – SIPeIP, Secretaría Nacional de Planificación. Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF, Ministerio de Economía y Finanzas - Ejecución Presupuestaria. Corte 30 de septiembre de 2023.


3.3.2 Análisis del cumplimiento de metas de los proyectos de inversión

Al objetivo 12 del plan se encuentran alineados 20 proyectos de inversión, de los cuales 13 proyectos tienen programación de metas físicas para el tercer trimestre de 2023; y 7 proyectos no cuentan con metas físicas programadas para el mencionado periodo.

De los 13 proyectos que cuentan con programación de metas físicas para el tercer trimestre de 2023, se identifica que el Gabinete Sectorial de Desarrollo de Inversiones cuenta con el mayor número de proyectos con programación de metas, cuya participación es del 76,92% (10 proyectos) y alcanzaron una ejecución promedio de metas físicas del 67,12%. El Gabinete Sectorial de Desarrollo Productivo tiene una participación 23,08% (3 proyectos) y presenta una ejecución promedio de metas físicas del 91,00%.

Los 13 proyectos que cuentan con programación de metas físicas para el tercer trimestre de 2023 presentan un presupuesto codificado de USD 42,66 millones, siendo el Gabinete Sectorial de Desarrollo de Inversiones el que mayor participación de presupuesto codificado tiene 94,66% (40,38 millones), de acuerdo con el siguiente detalle:

Gráfico 16. Porcentaje promedio de ejecución de metas y participación presupuestaria de proyectos por gabinete sectorial alineados al objetivo 12.

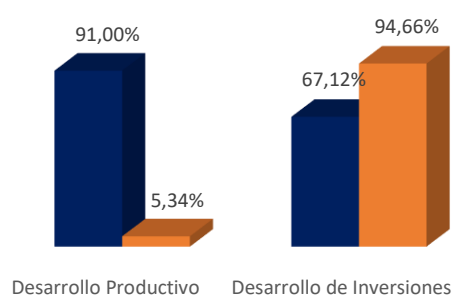

■ Cumplimiento promedio de metas ■ % de participación monto codificado

Fuente: Módulo Seguimiento a la Planificación Institucional del Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública – SIPeIP, Secretaría Nacional de Planificación. Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF, Ministerio de Economía y Finanzas - Ejecución Presupuestaria. Corte 30 de septiembre de 2023.

Cumplimiento de metas de los proyectos de inversión por entidad

El Ministerio de Energía y Minas, concentra el 96,68% del presupuesto codificado (USD 78,12 millones de un total de USD 80,80 millones de presupuesto codificado), con una participación en proyectos del 60,00% (12 proyectos de 20) alineados al objetivo 12, de los cuales 5 proyectos cuentan con programación de metas físicas para el tercer trimestre de 2023 con un presupuesto codificado de USD 39,98 millones.

Tabla 102. Proyectos del Ministerio de Energía y Minas con programación de metas físicas alineados al objetivo 12

| CUP Proyecto | % Programación metas física III Trimestre | % Ejecución meta física III Trimestre | % Cumplimiento metas físicas | | % Programación Presupuestaria III Trimestre | % Ejecución III Trimestre | % Cumplimiento ejecución presupuestaria | |
|-----------------------|---|---------------------------------------|------------------------------|---|---|---------------------------|---|---|
| | (a) | (b) | c (b/a) | | (d) | (e) | f (d/c) | |
| 144190000.0000.384564 | 13,78% | 0,75% | 5,44% | ● | 91,40% | 97,33% | 106,48% | ● |
| 144190000.0000.385885 | 2,15% | 0,65% | 30,23% | ● | 56,65% | 9,14% | 16,13% | ● |
| 144190000.0000.387200 | 3,33% | 3,33% | 100,00% | ● | 39,71% | 11,41% | 28,73% | ● |
| 144280000.461.2527 | 2,26% | 0,00% | 0,00% | ● | 92,19% | 15,63% | 16,95% | ● |
| 144280000.461.3692 | 0,54% | 0,29% | 53,70% | ● | 99,02% | 12,37% | 12,49% | ● |

Semaforización ejecución presupuestaria al tercer trimestre: ● Mayor o igual al 100%; ● 99,99% - 90,00%; ● 89,99% - 0%.

Semaforización ejecución metas al tercer trimestre: ● Mayor o igual al 100%; ● 99,99% - 90,00%; ● 89,99% - 0%.

Fuente: Módulo Seguimiento a la Planificación Institucional del Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública – SIPeIP, Secretaría Nacional de Planificación. Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF, Ministerio de Economía y Finanzas - Ejecución Presupuestaria. Corte 30 de septiembre de 2023.

Objetivo 13: Promover la gestión integral de los recursos hídricos

Este objetivo se enfoca en el desarrollo de políticas específicas para la gestión de los recursos hídricos que permitan ordenar el uso y acceso al recurso, priorizando las necesidades básicas del ser humano; además promover políticas para el uso de actividades productivas con enfoque ecológico.

3.3.1 Análisis Presupuestario

Al objetivo 13, se encuentran alineados 3 proyectos para el tercer trimestre de 2023, registrándose un presupuesto codificado de USD 9,36 millones y una ejecución de USD 3,38 millones (36,07% ejecutado). A nivel de los Gabinetes Sectoriales establecidos, el Gabinete Sectorial de Desarrollo Productivo es el que es el que concentra el presupuesto codificado con 9,36 millones (100,00% de participación), como se detalla a continuación:

Tabla 103. Ejecución presupuestaria de los proyectos de inversión por gabinete alineados al objetivo 13
(millones de dólares)

| Gabinete Sectorial | Nro. Entidades | Nro. de Proyectos | Presupuesto Codificado | Anticipo | Presupuesto Devengado | Presupuesto Ejecutado | % Ejecución |
|-----------------------|----------------|-------------------|------------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| | | | (a) | (b) | (c) | (d=b+c) | (d/a) |
| Desarrollo Productivo | 1 | 3 | 9,36 | 0,00 | 3,38 | 3,38 | 36,07% |
| Total | 1 | 3 | 9,36 | 0,00 | 3,38 | 3,38 | 36,07% |

Fuente: Módulo Seguimiento a la Planificación Institucional del Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública – SIPeIP, Secretaría Nacional de Planificación. Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF, Ministerio de Economía y Finanzas - Ejecución Presupuestaria. Corte 30 de septiembre de 2023.

A nivel de entidades, el Ministerio del Ambiente Agua y Transición concentra el 100,00% del presupuesto codificado como se detalla a continuación:

Tabla 104. Ejecución presupuestaria de los proyectos de inversión por entidad alineados al objetivo 13
(millones de dólares)


| Entidad | Gabinete Sectorial | Nro. de Proyectos | Presupuesto Codificado | Anticipo | Presupuesto Devengado | Presupuesto Ejecutado | % Ejecución |
|---|-----------------------|-------------------|------------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| | | | (a) | (b) | (c) | (d=b+c) | (d/a) |
| Ministerio del Ambiente Agua y Transición Ecológica | Desarrollo Productivo | 3 | 9,36 | 0,00 | 3,38 | 3,38 | 36,07% |
| Total | | 3 | 9,36 | 0,00 | 3,38 | 3,38 | 36,07% |

Fuente: Módulo Seguimiento a la Planificación Institucional del Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública – SIPeIP, Secretaría Nacional de Planificación. Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF, Ministerio de Economía y Finanzas - Ejecución Presupuestaria. Corte 30 de septiembre de 2023.

3.3.2 Análisis del cumplimiento de metas de los proyectos de inversión

Al objetivo 13 del plan se encuentran alineados 3 proyectos de inversión, de los cuales 1 proyecto tiene programación de metas físicas para el tercer trimestre de 2023 con una ejecución de meta física del 85,20%, y un presupuesto codificado de USD 0,95 millones.

Gráfico 17. Porcentaje promedio de ejecución de metas y participación presupuestaria de proyectos por gabinete sectorial alineados al objetivo 13.



■ Cumplimiento promedio de metas

Fuente: Módulo Seguimiento a la Planificación Institucional del Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública – SIPeIP, Secretaría Nacional de Planificación. Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF, Ministerio de Economía y Finanzas - Ejecución Presupuestaria. Corte 30 de septiembre de 2023.

Cumplimiento de metas de los proyectos de inversión por entidad

El Ministerio del Ambiente Agua y Transición Ecológica, concentra el 100,00% del presupuesto codificado (USD 9,36 millones de presupuesto codificado), con una participación en proyectos del 100,00% (3 proyectos) alineados al objetivo 13, de los cuales, 1 proyecto cuenta con programación de metas físicas para el tercer trimestre de 2023.

Tabla 105. Proyectos Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica con programación de metas físicas alineados al objetivo 13

| CUP Proyecto | % Programación metas física III Trimestre | % Ejecución meta física III Trimestre | % Cumplimiento metas físicas | % Programación Presupuestaria III Trimestre | % Ejecución III Trimestre | % Cumplimiento ejecución presupuestaria |
|----------------------|---|---------------------------------------|------------------------------|---|---------------------------|---|
| | (a) | (b) | c (b/a) | (d) | (e) | f (d/c) |
| 46090000.0000.387081 | 15,95% | 13,59% | 85,20% ● | 77,51% | 68,12% | 87,89% ● |

Semaforización ejecución presupuestaria al tercer trimestre: ● Mayor o igual al 100%; ● 99,99% - 90,00%; ● 89,99% - 0%.

Semaforización ejecución metas al tercer trimestre: ● Mayor o igual al 100%; ● 99,99% - 90,00%; ● 89,99% - 0%.

Fuente: Módulo Seguimiento a la Planificación Institucional del Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública – SIPeIP, Secretaría Nacional de Planificación. Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF, Ministerio de Economía y Finanzas - Ejecución Presupuestaria. Corte 30 de septiembre de 2023.

Objetivo 14: Fortalecer las capacidades del Estado con énfasis en la administración de justicia y eficiencia en los procesos de regulación y control, con independencia y autonomía

Enfocada en garantizar el pleno goce de derechos y libertades de los ciudadanos, el Estado debe facilitar la prestación de sus servicios en materia judicial a la población de forma oportuna, eficiente y con igualdad de oportunidades; con la necesidad en mira de reducir los procesos burocráticos, tiempos de resolución y evitar la injerencia del Estado u otros grupos de poder.

3.3.1 Análisis Presupuestario

Al objetivo 14, se encuentran alineados 58 proyectos para el tercer trimestre de 2023 registrándose un presupuesto codificado de USD 300,51 millones y una ejecución de USD 161,34 millones (53,69% ejecutado).

A nivel de los Gabinetes Sectoriales establecidos, el Gabinete Sectorial de Desarrollo del Talento es el que mayor porcentaje de participación tiene en cuanto al presupuesto codificado, con USD 230,01 millones (76,54% de participación), seguido por el sector Sin Gabinete con USD 64,94 millones (21,61% de participación).

A continuación, se presenta la ejecución presupuestaria correspondiente al tercer trimestre de 2023 a nivel de Gabinete Sectorial.

Tabla 106. Ejecución presupuestaria de los proyectos de inversión por gabinete alineados al objetivo 14 (millones de dólares)

| Gabinete Sectorial | Nro. Entidades | Nro. de Proyectos | Presupuesto Codificado | Anticipo | Presupuesto Devengado | Presupuesto Ejecutado | % Ejecución |
|---------------------------|----------------|-------------------|------------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| | | | (a) | (b) | (c) | (d=b+c) | (d/a) |
| Desarrollo del Talento | 1 | 2 | 230,01 | 0,00 | 132,39 | 132,39 | 57,56% |
| Sin Gabinete | 25 | 52 | 64,94 | 3,47 | 22,80 | 26,27 | 40,45% |
| Seguridad | 1 | 2 | 3,55 | 0,65 | 1,12 | 1,77 | 49,87% |
| Desarrollo de Inversiones | 1 | 1 | 2,01 | 0,00 | 0,92 | 0,92 | 45,61% |
| Desarrollo Territorial | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Total | 29 | 58 | 300,51 | 4,12 | 157,23 | 161,34 | 53,69% |

Fuente: Módulo Seguimiento a la Planificación Institucional del Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública – SIPeIP, Secretaría Nacional de Planificación. Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF, Ministerio de Economía y Finanzas - Ejecución Presupuestaria. Corte 30 de septiembre de 2023.

A nivel de entidades, el Ministerio del Trabajo y el Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos concentra el 80,99% del presupuesto codificado. A continuación, se presenta la ejecución presupuestaria teniendo en cuenta las entidades que tienen proyectos alineados al objetivo 14.

Tabla 107. Ejecución presupuestaria de los proyectos de inversión por entidad alineados al objetivo 14 (millones de dólares)

| Entidad | Gabinete Sectorial | Nro. de Proyectos | Presupuesto Codificado | Anticipo | Presupuesto Devengado | Presupuesto Ejecutado | % Ejecución |
|---|---------------------------|-------------------|------------------------|----------|-----------------------|-----------------------|-------------|
| | | | (a) | (b) | (c) | (d=b+c) | (d/a) |
| Ministerio del Trabajo | Desarrollo del Talento | 2 | 230,01 | 0,00 | 132,39 | 132,39 | 57,56% |
| Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos | Sin Gabinete | 1 | 13,38 | 1,17 | 1,75 | 2,92 | 21,85% |
| Consejo Nacional de la Judicatura | Sin Gabinete | 5 | 13,23 | 0,30 | 8,09 | 8,39 | 63,40% |
| Fiscalía General del Estado | Sin Gabinete | 7 | 6,11 | 0,21 | 1,36 | 1,57 | 25,69% |
| Universidad Nacional de Loja | Sin Gabinete | 5 | 5,90 | 0,18 | 0,86 | 1,04 | 17,66% |
| Universidad Nacional de Educación UNAE | Sin Gabinete | 1 | 4,34 | 0,10 | 2,71 | 2,81 | 64,65% |
| Universidad Agraria del Ecuador | Sin Gabinete | 9 | 3,65 | 0,00 | 0,15 | 0,15 | 4,08% |
| Servicio Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses | Seguridad | 2 | 3,55 | 0,65 | 1,12 | 1,77 | 49,87% |
| Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE | Sin Gabinete | 2 | 3,48 | 0,00 | 1,65 | 1,65 | 47,33% |
| Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí | Sin Gabinete | 1 | 2,45 | 0,00 | 2,39 | 2,39 | 97,50% |
| Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de Manabí | Sin Gabinete | 1 | 2,26 | 1,13 | 0,00 | 1,13 | 50,00% |
| Comisión de Tránsito del Ecuador | Desarrollo de Inversiones | 1 | 2,01 | 0,00 | 0,92 | 0,92 | 45,61% |
| Corte Constitucional | Sin Gabinete | 1 | 1,90 | 0,00 | 0,60 | 0,60 | 31,64% |
| Universidad Técnica de Machala | Sin Gabinete | 3 | 1,23 | 0,00 | 0,13 | 0,13 | 10,25% |
| Procuraduría General del Estado | Sin Gabinete | 1 | 1,02 | 0,00 | 0,15 | 0,15 | 14,29% |
| Universidad de Cuenca | Sin Gabinete | 1 | 1,00 | 0,00 | 0,50 | 0,50 | 50,17% |
| Universidad de Guayaquil | Sin Gabinete | 3 | 0,94 | 0,18 | 0,49 | 0,67 | 70,71% |
| Escuela Superior Politécnica del Litoral | Sin Gabinete | 1 | 0,90 | 0,00 | 0,48 | 0,48 | 53,77% |
| Defensoría Pública | Sin Gabinete | 1 | 0,54 | 0,00 | 0,34 | 0,34 | 62,02% |
| Universidad Nacional de Chimborazo | Sin Gabinete | 1 | 0,51 | 0,00 | 0,29 | 0,29 | 56,97% |

| Entidad | Gabinete Sectorial | Nro. de Proyectos | Presupuesto Codificado | Anticipo | Presupuesto Devengado | Presupuesto Ejecutado | % Ejecución |
|--|------------------------|-------------------|------------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| | | | (a) | (b) | (c) | (d=b+c) | (d/a) |
| Secretaría Técnica de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica - STCA | Sin Gabinete | 1 | 0,50 | 0,00 | 0,22 | 0,22 | 44,86% |
| Universidad Estatal del Sur de Manabí | Sin Gabinete | 1 | 0,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Universidad Técnica de Babahoyo | Sin Gabinete | 1 | 0,42 | 0,10 | 0,21 | 0,31 | 75,28% |
| Universidad Estatal Amazónica | Sin Gabinete | 1 | 0,24 | 0,10 | 0,00 | 0,10 | 42,81% |
| Secretaría Nacional de Planificación | Sin Gabinete | 1 | 0,21 | 0,00 | 0,21 | 0,21 | 100,00% |
| Escuela Superior Politécnica del Chimborazo | Sin Gabinete | 1 | 0,20 | 0,00 | 0,20 | 0,20 | 99,06% |
| Universidad Politécnica Estatal del Carchi | Sin Gabinete | 1 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Universidad Técnica de Cotopaxi | Sin Gabinete | 1 | 0,03 | 0,00 | 0,03 | 0,03 | 100,00% |
| Ministerio de Gobierno | Desarrollo Territorial | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Total | | 58 | 300,51 | 4,12 | 157,23 | 161,34 | 53,69% |

Fuente: Módulo Seguimiento a la Planificación Institucional del Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública – SIPeIP, Secretaría Nacional de Planificación. Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF, Ministerio de Economía y Finanzas - Ejecución Presupuestaria. Corte 30 de septiembre de 2023.


3.3.2 Análisis del cumplimiento de metas de los proyectos de inversión

El objetivo 14 del plan se encuentran alineados 58 proyectos de inversión, de los cuales 35 proyectos tienen programación de metas físicas para el tercer trimestre de 2023; y 23 proyectos no cuentan con metas físicas programadas para el mencionado periodo.

Los 35 proyectos que cuentan con programación de metas físicas al tercer trimestre de 2023, se identifican que las instituciones Sin Gabinete tienen una participación de proyectos del 88,57% (31 proyectos) y una ejecución promedio de metas físicas del 63,13%. Seguido por los Gabinetes de Talento, Seguridad, Inversiones, Desarrollo Territorial con una participación de 2,86% (1 proyecto para cada Gabinete); y una ejecución promedio de metas físicas de 76,55%, 100,00%, 100,00%, 100,00%, 0,00% respectivamente.

Los 35 proyectos que cuentan con programación de metas físicas para el tercer trimestre de 2023, presentan un presupuesto codificado de USD 271,35 millones, siendo el Gabinete Sectorial de Desarrollo del Talento el que mayor participación de presupuesto codificado tiene 84,76% (USD 230,00 millones de dólares), de acuerdo con el siguiente detalle:

Gráfico 18. Porcentaje promedio de ejecución de metas y participación presupuestaria de proyectos por gabinete sectorial alineados al objetivo 14.

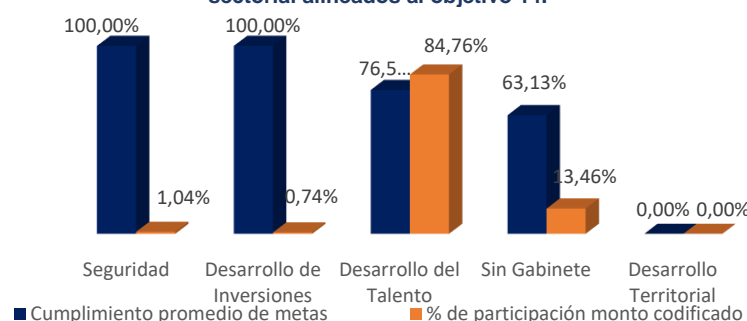

Fuente: Módulo Seguimiento a la Planificación Institucional del Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública – SIPeIP, Secretaría Nacional de Planificación. Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF, Ministerio de Economía y Finanzas - Ejecución Presupuestaria. Corte 30 de septiembre de 2023.

*Cumplimiento de metas de los proyectos de inversión por entidad***Ministerio de Trabajo**

El Ministerio del Trabajo, concentran el 76,54% del presupuesto codificado (USD 230,01 millones de un total de USD 300,51 millones de presupuesto codificado), con una participación en proyectos del 3,45% (2 proyectos de 58) alineados al objetivo 14, de los cuales, 1 proyecto cuenta con programación de metas físicas para el tercer trimestre de 2023.

Tabla 108. Proyectos del Ministerio del Trabajo con programación de metas físicas alineados al objetivo 14

| CUP Proyecto | % Programación metas física III Trimestre | % Ejecución meta física III Trimestre | % Cumplimiento metas físicas | % Programación Presupuestaria III Trimestre | % Ejecución III Trimestre | % Cumplimiento ejecución presupuestaria |
|-----------------------|---|---------------------------------------|------------------------------|---|---------------------------|---|
| | (a) | (b) | c (b/a) | (d) | (e) | f (d/c) |
| 113150000.0000.388033 | 11,60% | 8,88% | 76,55% ● | 99,99% | 57,56% | 57,56% ● |

Semaforización ejecución presupuestaria al tercer trimestre: ● Mayor o igual al 100%; ● 99,99% - 90,00%; ● 89,99% - 0%.

Semaforización ejecución metas al tercer trimestre: ● Mayor o igual al 100%; ● 99,99% - 90,00%; ● 89,99% - 0%.

Fuente: Módulo Seguimiento a la Planificación Institucional del Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública – SIpEIP, Secretaría Nacional de Planificación. Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF, Ministerio de Economía y Finanzas - Ejecución Presupuestaria. Corte 30 de septiembre de 2023.

Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos

El Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos, concentran el 4,45% del presupuesto codificado (USD 13,38 millones de un total de USD 300,51 millones de presupuesto codificado), con una participación en proyectos del 1,72% (1 proyectos de 58) alineados al objetivo 14, de los cuales, 1 proyecto cuenta con programación de metas físicas para el tercer trimestre de 2023.

Tabla 109. Proyecto del Consejo de Gobierno del régimen Especial de Galápagos con programación de metas físicas alineados al objetivo 14

| CUP Proyecto | % Programación metas física III Trimestre | % Ejecución meta física III Trimestre | % Cumplimiento metas físicas | % Programación Presupuestaria III Trimestre | % Ejecución III Trimestre | % Cumplimiento ejecución presupuestaria |
|-----------------------|---|---------------------------------------|------------------------------|---|---------------------------|---|
| | (a) | (b) | c (b/a) | (d) | (e) | f (d/c) |
| 040450000.0000.388415 | 17,45% | 15,11% | 86,59% ● | 78,38% | 21,85% | 27,88% ● |

Semaforización ejecución presupuestaria al tercer trimestre: ● Mayor o igual al 100%; ● 99,99% - 90,00%; ● 89,99% - 0%.

Semaforización ejecución metas al tercer trimestre: ● Mayor o igual al 100%; ● 99,99% - 90,00%; ● 89,99% - 0%.

Fuente: Módulo Seguimiento a la Planificación Institucional del Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública – SIpEIP, Secretaría Nacional de Planificación. Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF, Ministerio de Economía y Finanzas - Ejecución Presupuestaria. Corte 30 de septiembre de 2023.

Objetivo 15: Fomentar la ética pública, la transparencia y la lucha contra la corrupción

Este objetivo se enfoca en que el sector público deje de ser visto como corrupto y llegue a una imagen positiva de servicio eficiente a la sociedad; en tal sentido, el Gobierno Abierto, como modelo de gestión, representa una oportunidad para crear las instituciones formales e informales, que permitan la participación ciudadana plena en todos los procesos de formulación e implementación de políticas públicas y de esa forma consolidar el control social y lucha contra la corrupción.

3.3.1 Análisis Presupuestario

Al objetivo 15, se encuentran alineados 12 proyectos para el tercer trimestre de 2023, registrándose un presupuesto codificado de USD 12,36 millones y una ejecución de USD 3,04 millones (24,60% ejecutado).

A nivel de los Gabinetes Sectoriales establecidos, las instituciones Sin Gabinete es el que presenta mayor porcentaje de participación respecto al presupuesto codificado, con USD 7,90 millones que representa el 63,94% de participación sobre el presupuesto codificado total, seguido por el Gabinete Sectorial Económico y Financiero con USD 2,37 millones (19,14% de participación); el Gabinete Sectorial de Desarrollo de Territorial con USD 1,94 millones (15,72% de participación) y finalmente el Gabinete de Desarrollo de Inversiones con USD 0,15 millones (1,19% de participación).

A continuación, se presenta la ejecución presupuestaria correspondiente al tercer trimestre de 2023 a nivel de Gabinete Sectorial.

Tabla 110. Ejecución presupuestaria de los proyectos de inversión por gabinete alienados al objetivo 15 (millones de dólares)

| Gabinete Sectorial | Nro. Entidades | Nro. de Proyectos | Presupuesto Codificado | Anticipo | Presupuesto Devengado | Presupuesto Ejecutado | % Ejecución |
|---------------------------|----------------|-------------------|------------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| | | | (a) | (b) | (c) | (d=b+c) | (d/a) |
| Sin Gabinete | 3 | 8 | 7,90 | 0,21 | 1,52 | 1,73 | 21,90% |
| Económico y Financiero | 1 | 1 | 2,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Desarrollo Territorial | 1 | 2 | 1,94 | 0,35 | 0,96 | 1,31 | 67,38% |
| Desarrollo de Inversiones | 1 | 1 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Total | 6 | 12 | 12,36 | 0,55 | 2,49 | 3,04 | 24,60% |

Fuente: Módulo Seguimiento a la Planificación Institucional del Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública – SIPeIP, Secretaría Nacional de Planificación. Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF, Ministerio de Economía y Finanzas - Ejecución Presupuestaria. Corte 30 de septiembre de 2023.

A nivel de entidades, la Contraloría General del Estado, el Servicio de Contratación Pública – SERCOP y la Dirección General de Registro Civil Identificación y Cedulación concentran el 84,73% del presupuesto codificado. A continuación, se presenta la ejecución presupuestaria teniendo en cuenta las entidades que tienen proyectos alineados al objetivo 15.

Tabla 111. Ejecución presupuestaria de los proyectos de inversión por entidad alienados al objetivo 15 (millones de dólares)

| Entidad | Gabinete Sectorial | Nro. de Proyectos | Presupuesto Codificado | Anticipo | Presupuesto Devengado | Presupuesto Ejecutado | % Ejecución |
|--|------------------------|-------------------|------------------------|----------|-----------------------|-----------------------|-------------|
| | | | (a) | (b) | (c) | (d=b+c) | (d/a) |
| Contraloría General del Estado | Sin Gabinete | 6 | 6,16 | 0,08 | 1,10 | 1,18 | 19,11% |
| Servicio de Contratación Pública - SERCOP | Económico y Financiero | 1 | 2,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación | Desarrollo Territorial | 2 | 1,94 | 0,35 | 0,96 | 1,31 | 67,38% |
| Secretaría Nacional de Planificación | Sin Gabinete | 1 | 1,48 | 0,13 | 0,25 | 0,37 | 25,22% |
| Instituto Nacional de Estadística y Censos-INEC | Sin Gabinete | 1 | 0,26 | 0,00 | 0,18 | 0,18 | 69,30% |

| Entidad | Gabinete Sectorial | Nro. de Proyectos | Presupuesto Codificado | Anticipo | Presupuesto Devengado | Presupuesto Ejecutado | % Ejecución |
|-------------------------------|---------------------------|-------------------|------------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| | | | (a) | (b) | (c) | (d=b+c) | (d/a) |
| Ministerio de Energía y Minas | Desarrollo de Inversiones | 1 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Total | | 12 | 12,36 | 0,55 | 2,49 | 3,04 | 24,60% |


Fuente: Módulo Seguimiento a la Planificación Institucional del Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública – SIpEIP, Secretaría Nacional de Planificación. Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF, Ministerio de Economía y Finanzas - Ejecución Presupuestaria. Corte 30 de septiembre de 2023.

3.3.2 Análisis del cumplimiento de metas de los proyectos de inversión

Al objetivo 15 del plan se encuentran alineados 12 proyectos de inversión, de los cuales 5 proyectos tienen programación de metas físicas para el tercer trimestre de 2023 y alcanzó una ejecución promedio de metas físicas del 50,00% los proyectos con programación de metas físicas para el tercer trimestre cuentan con un presupuesto codificado de USD 5,60 millones. Los 7 proyectos, restantes, no cuentan con metas físicas programadas para el mencionado periodo.

Los 5 proyectos que cuentan con programación de metas físicas para el tercer trimestre de 2023, presentan un presupuesto codificado de USD 5,60 millones, alineado a las instituciones Sin Gabinete.

Gráfico 19. Porcentaje promedio de ejecución de metas y participación presupuestaria de proyectos por gabinete sectorial alineados al objetivo 15.

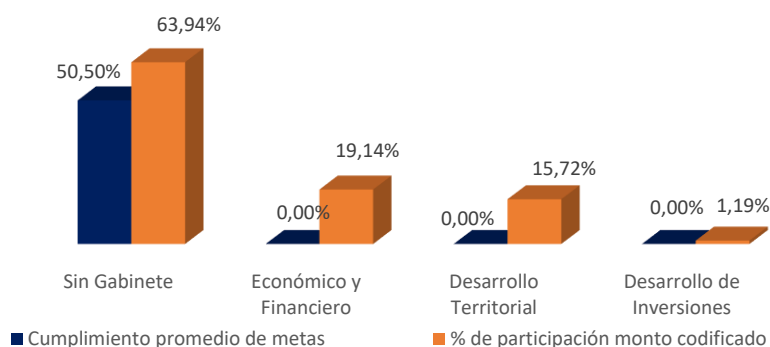

Fuente: Módulo Seguimiento a la Planificación Institucional del Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública – SIpEIP, Secretaría Nacional de Planificación. Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF, Ministerio de Economía y Finanzas - Ejecución Presupuestaria. Corte 30 de septiembre de 2023.

Cumplimiento de metas de los proyectos de inversión por entidad

La Contraloría General del Estado, el Servicio de Contratación Pública - SERCOP y la Dirección General de Registro Civil Identificación y Cedulación, concentran el 84,73% del presupuesto codificado (USD 10,47 millones de un total de USD 12,36 millones de presupuesto codificado), con una participación en proyectos del 75,00% (9 proyectos de 12) alineados al objetivo 15, de los cuales 3 proyectos pertenecientes a la Contraloría del Estado, cuentan con programación de metas físicas para el tercer trimestre de 2023.

Contraloría General del Estado

La Contraloría General del Estado cuenta con 6 proyectos alineados al objetivo 15, con un total de presupuesto codificado de USD 6,16 millones, de los cuales 3 proyectos cuentan con programación de metas físicas al tercer trimestre de 2023 y su presupuesto codificado es de USD 3,86 millones.

Tabla 112. Proyectos de la Contraloría General del Estado con programación de metas físicas alineados al objetivo 15

| CUP Proyecto | % Programación metas físicas III Trimestre | % Ejecución meta física III Trimestre | % Cumplimiento metas físicas | % Programación Presupuestaria III Trimestre | % Ejecución III Trimestre | % Cumplimiento ejecución presupuestaria | |
|-----------------------|--|---------------------------------------|------------------------------|---|---------------------------|---|---|
| | (a) | (b) | c (b/a) | (d) | (e) | f (d/c) | |
| 195910000.0000.385934 | 1,00% | 1,00% | 100,00% | 100,00% | 51,18% | 51,18% | ● |
| 195910000.0000.386624 | 97,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | - | - |
| 195910000.0000.388279 | 25,00% | 0,00% | 0,00% | 50,00% | 44,64% | 89,28% | ● |

Semaforización ejecución presupuestaria al tercer trimestre: ● Mayor o igual al 100%; ● 99,99% - 90,00%; ● 89,99% - 0%.

Semaforización ejecución metas al tercer trimestre: ● Mayor o igual al 100%; ● 99,99% - 90,00%; ● 89,99% - 0%.

Fuente: Módulo Seguimiento a la Planificación Institucional del Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública – SIPeIP, Secretaría Nacional de Planificación. Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF, Ministerio de Economía y Finanzas - Ejecución Presupuestaria. Corte 30 de septiembre de 2023.

Objetivo 16: Promover la integración regional, la inserción estratégica del país en el mundo y garantizar los derechos de las personas en situación de movilidad humana

Este objetivo se enfoca en fortalecer la inserción estratégica internacional, mediante la cooperación, la situación de los migrantes y las relaciones comerciales, lo que permitirá la diversificación internacional, en función de los intereses nacionales, salvaguardando la soberanía, la paz y los derechos humanos, teniendo entre sus prioridades: el fortalecimiento de vínculos con el mundo y sus países vecinos; la movilidad humana de ecuatorianos en el exterior y de los extranjeros en el país, en síntesis es abordar temáticas de relaciones exteriores, bilaterales cooperación internacional no reembolsable (financiera y técnica) y la situación de movilidad humana.

3.3.1 Análisis Presupuestario

Al objetivo 16, se encuentran alineados 2 proyectos para el tercer trimestre de 2023, registrándose un presupuesto codificado de USD 23,84 millones y una ejecución de USD 6,15 millones (25,82% ejecutado).

A nivel de los Gabinetes Sectoriales establecidos, el Gabinete Sectorial de Desarrollo de Inversiones es el que mayor porcentaje de participación tiene en cuanto al presupuesto codificado, con USD 22,66 millones (95,07% de participación), seguido por el Gabinete Sectorial de Seguridad con USD 1,18 millones (4,93% de participación).

A continuación, se presenta la ejecución presupuestaria correspondiente al tercer trimestre de 2023 a nivel de Gabinete Sectorial.

Tabla 113. Ejecución presupuestaria de los proyectos de inversión por gabinete alineados al objetivo 16 (millones de dólares)

| Gabinete Sectorial | Nro. Entidades | Nro. de Proyectos | Presupuesto Codificado | Anticipo | Presupuesto Devengado | Presupuesto Ejecutado | % Ejecución |
|---------------------------|----------------|-------------------|------------------------|----------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| | | | (a) | (b) | (c) | (d=b+c) | (d/a) |
| Desarrollo de Inversiones | 1 | 1 | 22,66 | - | 5,97 | 5,97 | 26,33% |
| Seguridad | 1 | 1 | 1,18 | - | 0,19 | 0,19 | 16,06% |
| Total | 2 | 2 | 23,84 | - | 6,15 | 6,15 | 25,82% |

Fuente: Módulo Seguimiento a la Planificación Institucional del Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública – SIPeIP, Secretaría Nacional de Planificación. Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF, Ministerio de Economía y Finanzas - Ejecución Presupuestaria. Corte 30 de septiembre de 2023.

A nivel de entidades, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, concentra el 95,07% del presupuesto codificado. A continuación, se presenta la ejecución presupuestaria teniendo en cuenta las entidades que tienen proyectos alineados al objetivo 16.

Tabla 114. Ejecución presupuestaria de los proyectos de inversión por entidad alineados al objetivo 16
(millones de dólares)

| Entidad | Gabinete Sectorial | Nro. de Proyectos | Presupuesto Codificado | Anticipo | Presupuesto Devengado | Presupuesto Ejecutado | % Ejecución |
|--|---------------------------|-------------------|------------------------|----------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| | | | (a) | (b) | (c) | (d=b+c) | (d/a) |
| Ministerio de Transporte y Obras Públicas | Desarrollo de Inversiones | 1 | 22,66 | - | 5,97 | 5,97 | 26,33% |
| Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada | Seguridad | 1 | 1,18 | - | 0,19 | 0,19 | 16,06% |
| Total | | 2 | 23,84 | - | 6,15 | 6,15 | 25,82% |


Fuente: Módulo Seguimiento a la Planificación Institucional del Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública – SIPeIP, Secretaría Nacional de Planificación. Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF, Ministerio de Economía y Finanzas - Ejecución Presupuestaria. Corte 30 de septiembre de 2023.

3.3.2 Análisis del cumplimiento de metas de los proyectos de inversión

Al objetivo 16 del plan se encuentran alineados 2 proyectos de inversión, los cuales tienen programación de metas físicas para el tercer trimestre de 2023.

Los 2 proyectos presentan un presupuesto codificado de USD 23,84 millones, siendo el Gabinete Sectorial de Desarrollo de Inversiones el que mayor participación de presupuesto codificado con el 95,07% (USD 2 millones), de acuerdo con el siguiente detalle:

Gráfico 20. Porcentaje promedio de ejecución de metas y participación presupuestaria de proyectos por gabinete sectorial alineados al objetivo 16.

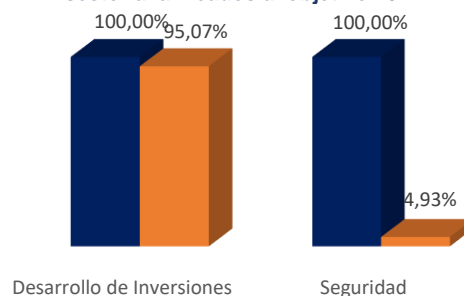

■ Cumplimiento promedio de metas ■ % de participación monto codificado

Fuente: Módulo Seguimiento a la Planificación Institucional del Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública – SIPeIP, Secretaría Nacional de Planificación. Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF, Ministerio de Economía y Finanzas - Ejecución Presupuestaria. Corte 30 de septiembre de 2023.

Cumplimiento de metas de los proyectos de inversión por entidad

El Ministerio de Transporte y Obras Públicas concentra el 95,07% del presupuesto codificado (USD 22,66 millones de un total de USD 23,84 millones de presupuesto codificado), con una participación en proyectos del 50,00% (1 proyectos de 2) alineados al objetivo 16, con un presupuesto codificado de USD 22,66 millones de dólares.

Tabla 115. Proyectos Ministerio de Transporte y Obras Públicas con programación de metas físicas alineados al objetivo 16

| CUP Proyecto | % Programación metas física III Trimestre | % Ejecución meta física III Trimestre | % Cumplimiento metas físicas | | % Programación Presupuestaria III Trimestre | % Ejecución III Trimestre | % Cumplimiento ejecución presupuestaria | |
|-----------------------|---|---------------------------------------|------------------------------|---|---|---------------------------|---|---|
| | (a) | (b) | c (b/a) | | (d) | (e) | f (d/c) | |
| 175200000.0000.375906 | 28,27% | 28,27% | 100,00% | ● | 54,20% | 26,33% | 48,58% | ● |

Semaforización ejecución presupuestaria al tercer trimestre: ● Mayor o igual al 100%; ● 99,99% - 90,00%; ● 89,99% - 0%.

Semaforización ejecución metas al tercer trimestre: ● Mayor o igual al 100%; ● 99,99% - 90,00%; ● 89,99% - 0%.

Fuente: Módulo Seguimiento a la Planificación Institucional del Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública – SIPeIP, Secretaría Nacional de Planificación. Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF, Ministerio de Economía y Finanzas - Ejecución Presupuestaria. Corte 30 de septiembre de 2023.

3.4. Alertas de proyectos de inversión

En el presente capítulo se detallan las principales alertas que presentan los estudios, programas y proyectos de inversión, como resultado del proceso de seguimiento correspondiente al tercer trimestre de 2023.

3.4.1. Proyectos sin programación de metas físicas y sin programación presupuestaria

Se identifican 183 proyectos dentro de las categorías “Proyectos sin programación de metas físicas y sin programación presupuestaria; y Proyectos sin programación de metas físicas, sin programación presupuestaria y sin reporte en el SIPeIP, al III trimestre 2023” y se encuentran incluidos en el Plan Anual de Inversiones - PAI, de acuerdo con el siguiente detalle:

Tabla 116. Proyectos sin programación de metas físicas y sin programación presupuestaria

| CUP Proyecto | % Programación metas física III Trimestre | % Ejecución meta física III Trimestre | % Cumplimiento metas físicas | | % Programación Presupuestaria III Trimestre | % Ejecución III Trimestre | % Cumplimiento ejecución presupuestaria | |
|-----------------------|---|---------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|---|---------------------------|---|---|
| | (a) | (b) | c (b/a) | | (d) | (e) | f (d/c) | |
| 00101610 | 0,00% | 0,00% | - | - | 74,58% | 71,26% | 95,55% | ● |
| 020150000.0000.385385 | 0,00% | 0,00% | - | - | 0,00% | 62,02% | Ejecución presupuestaria sin programación | Ejecución presupuestaria sin programación |
| 025810000.0000.388284 | 0,00% | 0,82% | 100,00% | Ejecución física sin programación | 0,00% | 31,64% | Ejecución presupuestaria sin programación | Ejecución presupuestaria sin programación |
| 052290000.0000.382649 | 0,00% | 0,00% | - | - | 87,47% | 87,47% | 100,00% | ● |
| 090870000.0000.387994 | 0,00% | 0,00% | - | - | 76,00% | 8,96% | 11,79% | ● |
| 090890000.0000.373634 | 0,00% | 0,00% | - | - | 47,00% | 42,53% | 90,49% | ● |
| 091590000.0000.372746 | 0,00% | 0,00% | - | - | 0,00% | 100,00% | Ejecución presupuestaria sin programación | Ejecución presupuestaria sin programación |
| 102800000.0000.383775 | 0,00% | 2,78% | 100,00% | Ejecución física sin programación | 66,10% | 55,32% | 83,70% | ● |
| 102800000.0000.383964 | 0,00% | 0,00% | - | - | 78,14% | 7,92% | 10,14% | ● |
| 102800000.0000.385568 | 0,00% | 13,91% | 100,00% | Ejecución física sin programación | 75,00% | 49,53% | 66,04% | ● |
| 102800000.0000.387203 | 0,00% | 0,00% | - | - | 93,52% | 48,69% | 52,06% | ● |
| 102800000.740.5492 | 0,00% | 0,00% | - | - | 82,41% | 92,40% | 112,12% | ● |



| CUP Proyecto | % Programación metas física III Trimestre | % Ejecución meta física III Trimestre | % Cumplimiento metas físicas | | % Programación Presupuestaria III Trimestre | % Ejecución III Trimestre | % Cumplimiento ejecución presupuestaria | |
|-----------------------|---|---------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|---|---------------------------|---|---|
| | (a) | (b) | c (b/a) | | (d) | (e) | f (d/c) | |
| 113100000.855.3309 | 0,00% | 0,00% | - | - | 100,00% | 52,34% | 52,34% | ● |
| 113150000.0000.381389 | 0,00% | 0,00% | - | - | 0,00% | 0,00% | - | - |
| 113150000.0000.383224 | 0,00% | 0,00% | - | - | 100,00% | 65,78% | 65,78% | ● |
| 123200000.0000.381243 | 0,00% | 1,33% | 100,00% | Ejecución física sin programación | 100,00% | 69,47% | 69,47% | ● |
| 123200000.0000.383728 | 0,00% | 0,00% | - | - | 0,00% | 0,00% | - | - |
| 123200000.0000.385165 | 0,00% | 66,62% | 100,00% | Ejecución física sin programación | 99,55% | 0,00% | 0,00% | ● |
| 123200000.0000.385484 | 0,00% | 0,00% | - | - | 100,00% | 100,00% | 100,00% | ● |
| 123200000.0000.388215 | 0,00% | 0,00% | - | - | 0,00% | 14,58% | Ejecución presupuestaria sin programación | Ejecución presupuestaria sin programación |
| 123200000.0000.388299 | 0,00% | 0,00% | - | - | 0,00% | 0,00% | - | - |
| 123200000.510.6303 | 0,00% | 0,00% | - | - | 0,00% | 2,21% | Ejecución presupuestaria sin programación | Ejecución presupuestaria sin programación |
| 123200000.632.2477 | 0,00% | 0,00% | - | - | 0,00% | 2,40% | Ejecución presupuestaria sin programación | Ejecución presupuestaria sin programación |
| 133600000.0000.385264 | 0,00% | 0,00% | - | - | 51,28% | 1,02% | 1,99% | ● |
| 133600000.1373.6832 | 0,00% | 0,00% | - | - | 100,00% | 100,00% | 100,00% | ● |
| 144190000.0000.384144 | 0,00% | 0,00% | - | - | 100,00% | 0,00% | 0,00% | ● |
| 144190000.0000.383984 | 0,00% | 0,00% | - | - | 0,00% | 0,00% | - | - |
| 144190000.0000.387088 | 0,00% | 0,00% | - | - | 17,82% | 0,00% | 0,00% | ● |
| 144190000.0000.388755 | 0,00% | 0,00% | - | - | 0,00% | 0,00% | - | - |
| 144190000.0000.388756 | 0,00% | 0,00% | - | - | 0,00% | 0,00% | - | - |
| 144210000.0000.374174 | 0,00% | 0,00% | - | - | 91,27% | 1,03% | 1,13% | ● |
| 144210000.0000.375934 | 0,00% | 0,00% | - | - | 68,77% | 96,79% | 140,75% | ● |
| 144210000.906.4241 | 0,00% | 0,00% | - | - | 0,00% | 0,00% | - | - |
| 144270000.0000.375789 | 0,00% | 0,02% | 100,00% | Ejecución física sin programación | 89,33% | 8,88% | 9,94% | ● |
| 152180000.0000.385345 | 0,00% | 0,00% | - | - | 0,00% | 6,25% | Ejecución presupuestaria sin programación | Ejecución presupuestaria sin programación |
| 165100000.0000.382657 | 0,00% | 0,00% | - | - | 0,00% | 100,00% | Ejecución presupuestaria sin programación | Ejecución presupuestaria sin programación |
| 175200000.0000.372343 | 0,00% | 0,00% | - | - | 0,00% | 98,74% | Ejecución presupuestaria sin programación | Ejecución presupuestaria sin programación |
| 175200000.0000.372489 | 0,00% | 0,00% | - | - | 0,00% | 100,00% | Ejecución presupuestaria sin programación | Ejecución presupuestaria sin programación |
| 175200000.0000.372758 | 0,00% | 0,00% | - | - | 0,00% | 100,00% | Ejecución presupuestaria sin programación | Ejecución presupuestaria sin programación |
| 201115 | 0,00% | 0,00% | - | - | 0,00% | 0,00% | - | - |
| 175200000.0000.386925 | 0,00% | 0,00% | - | - | 0,00% | 0,00% | - | - |
| 175200000.0000.387450 | 0,00% | 0,00% | - | - | 0,00% | 0,00% | - | - |

| CUP Proyecto | % Programación metas física III Trimestre | % Ejecución meta física III Trimestre | % Cumplimiento metas físicas | | % Programación Presupuestaria III Trimestre | % Ejecución III Trimestre | % Cumplimiento ejecución presupuestaria | |
|-----------------------|---|---------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|---|---------------------------|---|---|
| | (a) | (b) | c (b/a) | | (d) | (e) | f (d/c) | |
| 175200000.0000.387471 | 0,00% | 0,00% | - | - | 0,00% | 0,00% | - | - |
| 175200000.0000.387473 | 0,00% | 0,00% | - | - | 90,82% | 0,00% | 0,00% | ● |
| 175200000.0000.387863 | 0,00% | 0,00% | - | - | 100,00% | 0,00% | 0,00% | ● |
| 175200000.0000.387864 | 0,00% | 12,50% | 100,00% | Ejecución física sin programación | 25,76% | 7,34% | 28,49% | ● |
| 175200000.0000.388854 | 0,00% | 0,00% | - | - | 0,00% | 0,00% | - | - |
| 175200000.0000.388953 | 0,00% | 0,00% | - | - | 0,00% | 0,00% | - | - |
| 175200000.506.3656 | 0,00% | 0,00% | - | - | 89,29% | 89,29% | 100,00% | ● |
| 175200000.641.4056 | 0,00% | 0,00% | - | - | 0,00% | 100,00% | Ejecución presupuestaria sin programación | Ejecución presupuestaria sin programación |
| 175220000.0000.388056 | 0,00% | 0,00% | - | - | 0,00% | 0,00% | - | - |
| 195910000.0000.375508 | 0,00% | 0,00% | - | - | 44,56% | 0,00% | 0,00% | ● |
| 195910000.0000.385304 | 0,00% | 0,00% | - | - | 0,00% | 0,00% | - | - |
| 195910000.0000.387152 | 0,00% | 0,00% | - | - | 0,00% | 0,00% | - | - |
| 195980000.0000.388072 | 0,00% | 0,00% | - | - | 8,30% | 0,00% | 0,00% | ● |
| 195980000.0000.388076 | 0,00% | 0,00% | - | - | 62,50% | 0,00% | 0,00% | ● |
| 201000000.0000.373591 | 0,00% | 0,00% | - | - | 0,00% | 0,00% | - | - |
| 201000000.0000.377945 | 0,00% | 0,00% | - | - | 0,00% | 0,00% | - | - |
| 201000000.0000.387114 | 0,00% | 0,00% | - | - | 100,00% | 72,56% | 72,56% | ● |
| 201000000.0000.387136 | 0,00% | 0,00% | - | - | 59,01% | 32,11% | 54,41% | ● |
| 201000000.0000.387364 | 0,00% | 0,00% | - | - | 75,43% | 90,71% | 120,26% | ● |
| 303300000.988.4201 | 0,00% | 0,00% | - | - | 97,16% | 97,16% | 100,00% | ● |
| 303400000.0000.387748 | 0,00% | 0,00% | - | - | 35,02% | 6,04% | 17,25% | ● |
| 303400000.0000.388996 | 0,00% | 0,00% | - | - | 0,00% | 50,02% | Ejecución presupuestaria sin programación | Ejecución presupuestaria sin programación |
| 303900000.0000.388757 | 0,00% | 0,00% | - | - | 0,00% | 0,00% | - | - |
| 304400000.0000.374042 | 0,00% | 0,00% | - | - | 0,00% | 61,96% | Ejecución presupuestaria sin programación | Ejecución presupuestaria sin programación |
| 916100000.0000.376744 | 0,00% | 4,93% | 100,00% | Ejecución física sin programación | 35,00% | 50,17% | 143,34% | ● |
| 360700000.0000.387649 | 0,00% | 0,00% | - | - | 0,00% | 0,00% | - | - |
| 438700000.0000.387194 | 0,00% | 0,00% | - | - | 79,00% | 17,25% | 21,84% | ● |
| 460900000.0000.387068 | 0,00% | 13,65% | 100,00% | Ejecución física sin programación | 68,59% | 53,00% | 77,27% | ● |
| 460900000.0000.387190 | 0,00% | 0,00% | - | - | 72,94% | 73,52% | 100,79% | ● |
| 460900000.0000.389124 | 0,00% | 0,00% | - | - | 0,00% | 0,00% | - | - |
| 505000000.0000.373761 | 0,00% | 0,00% | - | - | 18,60% | 0,88% | 4,73% | ● |
| 505000000.0000.387222 | 0,00% | 0,00% | - | - | 40,00% | 50,00% | 125,00% | ● |
| 505000000.0000.387223 | 0,00% | 0,00% | - | - | 30,00% | 0,00% | 0,00% | ● |
| 505100000.0000.388282 | 0,00% | 0,00% | - | - | 100,00% | 100,00% | 100,00% | ● |
| 505100000.0000.388295 | 0,00% | 0,00% | - | - | 50,97% | 54,76% | 107,43% | ● |



| CUP Proyecto | % Programación metas física III Trimestre | % Ejecución meta física III Trimestre | % Cumplimiento metas físicas | | % Programación Presupuestaria III Trimestre | % Ejecución III Trimestre | % Cumplimiento ejecución presupuestaria | |
|----------------------|---|---------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|---|---------------------------|---|---|
| | (a) | (b) | c (b/a) | | (d) | (e) | f (d/c) | |
| 50590000.1504.6387 | 0,00% | 0,00% | - | - | 0,00% | 0,00% | - | - |
| 56220000.0000.388128 | 0,00% | 0,00% | - | - | 0,00% | 0,00% | - | - |
| 56220000.0000.388129 | 0,00% | 2,58% | 100,00% | Ejecución física sin programación | 40,00% | 24,88% | 62,20% | ● |
| 56220000.0000.388139 | 0,00% | 0,00% | - | - | 30,00% | 39,37% | 131,23% | ● |
| 60700000.0000.386844 | 0,00% | 0,00% | - | - | 0,00% | 0,00% | - | - |
| 60700000.0000.387983 | 0,00% | 0,00% | - | - | 41,50% | 48,90% | 117,82% | ● |
| 60700000.0000.388454 | 0,00% | 0,00% | - | - | 100,00% | 0,00% | 0,00% | ● |
| 60700000.0000.389018 | 0,00% | 0,00% | - | - | 0,00% | 0,00% | - | - |
| 81300000.0000.378186 | 0,00% | 0,00% | - | - | 100,00% | 0,00% | 0,00% | ● |
| 81300000.0000.388355 | 0,00% | 0,00% | - | - | 100,00% | 0,00% | 0,00% | ● |
| 81350000.0000.375356 | 0,00% | 0,00% | - | - | 62,03% | 63,14% | 101,78% | ● |
| 81360000.0000.388045 | 0,00% | 0,02% | 100,00% | Ejecución física sin programación | 71,83% | 0,00% | 0,00% | ● |
| 91400000.0000.387004 | 0,00% | 0,00% | - | - | 100,00% | 87,48% | 87,48% | ● |
| 91400000.0000.388013 | 0,00% | 0,00% | - | - | 11,33% | 0,00% | 0,00% | ● |
| 91400000.0000.388874 | 0,00% | 0,00% | - | - | 62,50% | 36,14% | 57,82% | ● |
| 91400000.378.4015 | 0,00% | 0,00% | - | - | 0,00% | 17,58% | Ejecución presupuestaria sin programación | Ejecución presupuestaria sin programación |
| 91400000.378.4136 | 0,00% | 0,00% | - | - | 0,00% | 100,00% | Ejecución presupuestaria sin programación | Ejecución presupuestaria sin programación |
| 91400000.78.6172 | 0,00% | 0,00% | - | - | 85,35% | 44,33% | 51,94% | ● |
| 91500000.0000.376387 | 0,00% | 0,00% | - | - | 0,00% | 0,00% | - | - |
| 91630000.0000.382739 | 0,00% | 0,00% | - | - | 100,00% | 53,91% | 53,91% | ● |
| 91630000.0000.384105 | 0,00% | 0,00% | - | - | 0,00% | 0,00% | - | - |
| 91630000.0000.385206 | 0,00% | 0,00% | - | - | 100,00% | 97,04% | 97,04% | ● |
| 91630000.0000.387324 | 0,00% | 0,00% | - | - | 0,00% | 0,00% | - | - |
| 91630000.607.2655 | 0,00% | 0,00% | - | - | 100,00% | 0,00% | 0,00% | ● |
| 91640000.0000.384665 | 0,00% | 0,00% | - | - | 0,00% | 0,00% | - | - |
| 91640000.0000.388695 | 0,00% | 0,00% | - | - | 0,00% | 0,00% | - | - |
| 91640000.0000.388698 | 0,00% | 0,00% | - | - | 0,00% | 0,00% | - | - |
| 91640000.0000.389174 | 0,00% | 0,00% | - | - | 0,00% | 0,00% | - | - |
| 91650000.0000.386786 | 0,00% | 0,00% | - | - | 0,00% | 71,43% | Ejecución presupuestaria sin programación | Ejecución presupuestaria sin programación |
| 91650000.0000.388285 | 0,00% | 0,00% | - | - | 25,06% | 100,00% | 399,04% | ● |
| 91650000.0000.388286 | 0,00% | 0,00% | - | - | 91,96% | 100,00% | 108,74% | ● |
| 91650000.0000.388287 | 0,00% | 0,00% | - | - | 25,34% | 65,31% | 257,76% | ● |
| 91660000.0000.377024 | 0,00% | 0,00% | - | - | 0,00% | 0,00% | - | - |
| 91660000.0000.385024 | 0,00% | 0,00% | - | - | 0,00% | 0,00% | - | - |
| 91680000.0000.372843 | 0,00% | 0,00% | - | - | 0,00% | 0,00% | - | - |
| 91680000.0000.380648 | 0,00% | 0,00% | - | - | 0,00% | 0,00% | - | - |
| 91680000.0000.383718 | 0,00% | 0,00% | - | - | 0,00% | 0,00% | - | - |

| CUP Proyecto | % Programación metas física III Trimestre | % Ejecución meta física III Trimestre | % Cumplimiento metas físicas | | % Programación Presupuestaria III Trimestre | % Ejecución III Trimestre | % Cumplimiento ejecución presupuestaria | |
|----------------------|---|---------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|---|---------------------------|---|---|
| | (a) | (b) | c (b/a) | | (d) | (e) | f (d/c) | |
| 91680000.0000.384184 | 0,00% | 0,00% | - | - | 0,00% | 0,00% | - | - |
| 91680000.0000.384735 | 0,00% | 0,00% | - | - | 0,00% | 0,00% | - | - |
| 91680000.0000.384742 | 0,00% | 0,00% | - | - | 0,00% | 19,43% | Ejecución presupuestaria sin programación | Ejecución presupuestaria sin programación |
| 91680000.0000.387213 | 0,00% | 0,00% | - | - | 0,00% | 0,00% | - | - |
| 91690000.0000.387201 | 0,00% | 0,00% | - | - | 50,00% | 0,00% | 0,00% | ● |
| 91700000.0000.383793 | 0,00% | 0,00% | - | - | 0,00% | 0,00% | - | - |
| 91700000.0000.388855 | 0,00% | 0,00% | - | - | 0,00% | 0,00% | - | - |
| 91710000.0000.388950 | 0,00% | 0,00% | - | - | 50,00% | 0,00% | 0,00% | ● |
| 91710000.0000.388955 | 0,00% | 0,00% | - | - | 0,00% | 0,00% | - | - |
| 91710000.0000.388994 | 0,00% | 0,00% | - | - | 0,00% | 0,00% | - | - |
| 91730000.0000.389014 | 0,00% | 0,00% | - | - | 0,00% | 0,00% | - | - |
| 91730000.0000.389015 | 0,00% | 0,00% | - | - | 0,00% | 0,00% | - | - |
| 91760000.0000.387984 | 0,00% | 0,00% | - | - | 100,00% | 30,76% | 30,76% | ● |
| 91760000.0000.389097 | 0,00% | 0,00% | - | - | 0,00% | 0,00% | - | - |
| 91800000.0000.388834 | 0,00% | 0,04% | 100,00% | Ejecución física sin programación | 11,73% | 8,36% | 71,27% | ● |
| 91800000.746.3050 | 0,00% | 0,00% | - | - | 0,00% | 0,00% | - | - |
| 91820000.0000.387648 | 0,00% | 0,00% | - | - | 0,00% | 0,00% | - | - |
| 91820000.0000.388776 | 0,00% | 0,00% | - | - | 0,00% | 0,00% | - | - |
| 91850000.0000.389114 | 0,00% | 0,00% | - | - | 0,00% | 0,00% | - | - |
| 91850000.0000.389115 | 0,00% | 0,00% | - | - | 0,00% | 0,00% | - | - |
| 91850000.0000.388878 | 0,00% | 0,00% | - | - | 0,00% | 0,00% | - | - |
| 91870000.0000.384092 | 0,00% | 0,00% | - | - | 100,00% | 0,00% | 0,00% | ● |
| 91870000.0000.387829 | 0,00% | 0,00% | - | - | 100,00% | 0,00% | 0,00% | ● |
| 91870000.0000.387830 | 0,00% | 25,00% | 100,00% | Ejecución física sin programación | 100,00% | 0,00% | 0,00% | ● |
| 91870000.0000.387831 | 0,00% | 30,00% | 100,00% | Ejecución física sin programación | 100,00% | 0,00% | 0,00% | ● |
| 91870000.0000.387832 | 0,00% | 70,00% | 100,00% | Ejecución física sin programación | 100,00% | 99,96% | 99,96% | ● |
| 91870000.0000.387833 | 0,00% | 40,00% | 100,00% | Ejecución física sin programación | 100,00% | 0,00% | 0,00% | ● |
| 91870000.0000.387834 | 0,00% | 0,00% | - | - | 100,00% | 0,00% | 0,00% | ● |
| 91870000.0000.387836 | 0,00% | 28,20% | 100,00% | Ejecución física sin programación | 100,00% | 12,94% | 12,94% | ● |
| 91870000.0000.387837 | 0,00% | 0,00% | - | - | 100,00% | 0,00% | 0,00% | ● |
| 91870000.0000.387838 | 0,00% | 0,00% | - | - | 100,00% | 0,00% | 0,00% | ● |
| 91870000.0000.387841 | 0,00% | 0,00% | - | - | 0,00% | 0,00% | - | - |
| 91870000.0000.388754 | 0,00% | 0,00% | - | - | 100,00% | 86,08% | 86,08% | ● |
| 91870000.0000.388894 | 0,00% | 0,00% | - | - | 100,00% | 30,00% | 30,00% | ● |
| 91870000.0000.388934 | 0,00% | 0,00% | - | - | 0,00% | 0,00% | - | - |



| CUP Proyecto | % Programación metas física III Trimestre | % Ejecución meta física III Trimestre | % Cumplimiento metas físicas | | % Programación Presupuestaria III Trimestre | % Ejecución III Trimestre | % Cumplimiento ejecución presupuestaria | |
|----------------------|---|---------------------------------------|------------------------------|---|---|---------------------------|---|---|
| | (a) | (b) | c (b/a) | | (d) | (e) | f (d/c) | |
| 91870000.0000.388935 | 0,00% | 0,00% | - | - | 0,00% | 0,00% | - | - |
| 91870000.0000.388938 | 0,00% | 0,00% | - | - | 0,00% | 0,00% | - | - |
| 91870000.0000.388939 | 0,00% | 0,00% | - | - | 0,00% | 0,00% | - | - |
| 91870000.0000.388940 | 0,00% | 0,00% | - | - | 0,00% | 0,00% | - | - |
| 91870000.0000.388941 | 0,00% | 0,00% | - | - | 0,00% | 0,00% | - | - |
| 91870000.0000.388942 | 0,00% | 0,00% | - | - | 0,00% | 0,00% | - | - |
| 91870000.0000.388943 | 0,00% | 0,00% | - | - | 0,00% | 0,00% | - | - |
| 91870000.0000.388944 | 0,00% | 0,00% | - | - | 0,00% | 0,00% | - | - |
| 91870000.0000.388945 | 0,00% | 0,00% | - | - | 0,00% | 0,00% | - | - |
| 91870000.0000.388946 | 0,00% | 0,00% | - | - | 0,00% | 0,00% | - | - |
| 91870000.0000.388962 | 0,00% | 0,00% | - | - | 0,00% | 0,00% | - | - |
| 91870000.0000.388979 | 0,00% | 0,00% | - | - | 0,00% | 0,00% | - | - |
| 91870000.0000.388999 | 0,00% | 0,00% | - | - | 0,00% | 0,00% | - | - |
| 91870000.0000.389000 | 0,00% | 0,00% | - | - | 0,00% | 0,00% | - | - |
| 91870000.0000.389003 | 0,00% | 0,00% | - | - | 0,00% | 0,00% | - | - |
| 91870000.0000.389017 | 0,00% | 0,00% | - | - | 0,00% | 0,00% | - | - |
| 91880000.0000.383746 | 0,00% | 0,00% | - | - | 0,00% | 0,00% | - | - |
| 91880000.0000.388093 | 0,00% | 0,00% | - | - | 40,00% | 0,00% | 0,00% | ● |
| 91880000.0000.388937 | 0,00% | 0,00% | - | - | 0,00% | 50,00% | Ejecución presupuestaria sin programación | Ejecución presupuestaria sin programación |
| 91890000.0000.382769 | 0,00% | 0,00% | - | - | 82,55% | 28,10% | 34,04% | ● |
| 91890000.0000.382772 | 0,00% | 0,00% | - | - | 0,00% | 11,70% | Ejecución presupuestaria sin programación | Ejecución presupuestaria sin programación |
| 91890000.0000.383670 | 0,00% | 0,00% | - | - | 100,00% | 12,37% | 12,37% | ● |
| 91890000.0000.386764 | 0,00% | 0,00% | - | - | 100,00% | 100,00% | 100,00% | ● |
| 91890000.0000.386987 | 0,00% | 0,00% | - | - | 98,11% | 20,92% | 21,32% | ● |
| 91890000.0000.387424 | 0,00% | 0,00% | - | - | 0,00% | 42,29% | Ejecución presupuestaria sin programación | Ejecución presupuestaria sin programación |
| 91890000.0000.387425 | 0,00% | 0,00% | - | - | 95,94% | 0,00% | 0,00% | ● |
| 91890000.0000.388138 | 0,00% | 0,00% | - | - | 85,71% | 12,40% | 14,47% | ● |
| 92060000.0000.387702 | 0,00% | 0,00% | - | - | 100,00% | 0,00% | 0,00% | ● |
| 95840000.0000.388515 | 0,00% | 0,00% | - | - | 71,31% | 37,95% | 53,22% | ● |
| 17520000.0000.376107 | 0,00% | 0,00% | - | - | 0,00% | 0,00% | - | - |
| 17520000.0000.387179 | 0,00% | 0,00% | - | - | 0,00% | 0,00% | - | - |
| 17522000.0000.388066 | 0,00% | 0,00% | - | - | 0,00% | 0,00% | - | - |
| 36080000.0000.388495 | 0,00% | 0,00% | - | - | 0,00% | 0,00% | - | - |
| 91630000.0000.386473 | 0,00% | 0,00% | - | - | 0,00% | 0,00% | - | - |

Fuente: Módulo Seguimiento a la Planificación Institucional del Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública – SIPeIP, Secretaría Nacional de Planificación. Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF, Ministerio de Economía y Finanzas - Ejecución Presupuestaria. Corte 30 de septiembre de 2023.

3.4.2 Proyectos con bajo cumplimiento de metas físicas y bajo cumplimiento presupuestario

Se identifica 143 proyectos dentro de la categoría “bajo cumplimiento de metas físicas y bajo cumplimiento presupuestario”; es decir, el proyecto presenta una baja ejecución de metas físicas (menor al 90% de lo programado) y baja ejecución presupuestaria (menor al 90% de lo programado).

Tabla 117. Proyectos con bajo cumplimiento de metas físicas y bajo cumplimiento presupuestario

| CUP Proyecto | % Programación metas física III Trimestre | % Ejecución meta física III Trimestre | % Cumplimiento metas físicas | | % Programación Presupuestaria III Trimestre | % Ejecución III Trimestre | % Cumplimiento ejecución presupuestaria | |
|-----------------------|---|---------------------------------------|------------------------------|---|---|---------------------------|---|---|
| | (a) | (b) | c (b/a) | | (d) | (e) | f (d/c) | |
| 00360000.0000.388254 | 19,53% | 0,00% | 0,00% | ● | 21,54% | 7,87% | 36,54% | ● |
| 032660000.0000.381722 | 18,83% | 1,09% | 5,79% | ● | 100,00% | 18,77% | 18,77% | ● |
| 040450000.0000.388415 | 17,45% | 15,11% | 86,59% | ● | 78,38% | 21,85% | 27,88% | ● |
| 091590000.0000.375416 | 7,78% | 6,53% | 83,93% | ● | 87,63% | 28,17% | 32,15% | ● |
| 091590000.0000.387067 | 12,27% | 9,00% | 73,35% | ● | 83,23% | 23,95% | 28,78% | ● |
| 091590000.0000.387082 | 7,04% | 2,50% | 35,51% | ● | 59,95% | 17,09% | 28,51% | ● |
| 091830000.0000.383770 | 5,17% | 3,02% | 58,41% | ● | 100,00% | 61,29% | 61,29% | ● |
| 102800000.0000.384446 | 7,05% | 5,77% | 81,84% | ● | 97,64% | 42,89% | 43,93% | ● |
| 102800000.0000.387547 | 14,23% | 4,41% | 30,99% | ● | 67,72% | 24,94% | 36,83% | ● |
| 106860000.0000.387192 | 10,46% | 0,82% | 7,84% | ● | 88,63% | 50,35% | 56,81% | ● |
| 113150000.0000.387998 | 12,43% | 0,00% | 0,00% | ● | 94,81% | 0,59% | 0,62% | ● |
| 113150000.0000.388033 | 11,60% | 8,88% | 76,55% | ● | 99,99% | 57,56% | 57,56% | ● |
| 123200000.0000.387091 | 16,50% | 11,58% | 70,18% | ● | 79,28% | 70,63% | 89,09% | ● |
| 123200000.0000.387186 | 9,41% | 0,00% | 0,00% | ● | 20,00% | 0,00% | 0,00% | ● |
| 123200000.0000.388051 | 24,59% | 12,12% | 49,29% | ● | 76,37% | 25,22% | 33,02% | ● |
| 123200000.0000.388123 | 21,81% | 15,67% | 71,85% | ● | 100,00% | 55,79% | 55,79% | ● |
| 123200000.0000.388137 | 3,83% | 0,00% | 0,00% | ● | 99,70% | 0,00% | 0,00% | ● |
| 123200000.0000.388156 | 20,25% | 13,91% | 68,69% | ● | 83,61% | 27,05% | 32,35% | ● |
| 133340000.0000.386570 | 3,44% | 3,00% | 87,21% | ● | 79,56% | 42,75% | 53,74% | ● |
| 133600000.0000.375447 | 1,13% | 0,67% | 59,29% | ● | 61,62% | 27,37% | 44,42% | ● |
| 133600000.0000.387089 | 3,79% | 0,00% | 0,00% | ● | 51,56% | 7,25% | 14,06% | ● |
| 133600000.0000.387090 | 16,17% | 5,16% | 31,91% | ● | 83,25% | 52,88% | 63,52% | ● |
| 133600000.0000.387098 | 11,50% | 8,78% | 76,35% | ● | 89,02% | 61,54% | 69,13% | ● |
| 133600000.0000.387116 | 6,60% | 5,30% | 80,30% | ● | 77,00% | 55,48% | 72,05% | ● |
| 133600000.0000.388126 | 3,39% | 1,67% | 49,26% | ● | 51,61% | 43,72% | 84,71% | ● |
| 133600000.0000.388280 | 43,50% | 10,40% | 23,91% | ● | 19,86% | 14,68% | 73,92% | ● |
| 133600000.0000.388675 | 15,78% | 0,00% | 0,00% | ● | 98,97% | 19,16% | 19,36% | ● |
| 133900000.0000.385944 | 44,90% | 15,00% | 33,41% | ● | 56,82% | 0,00% | 0,00% | ● |
| 144190000.0000.385885 | 2,15% | 0,65% | 30,23% | ● | 56,65% | 9,14% | 16,13% | ● |
| 144270000.0000.384673 | 16,50% | 13,50% | 81,82% | ● | 81,62% | 13,50% | 16,54% | ● |
| 144270000.0000.384695 | 17,00% | 7,54% | 44,35% | ● | 88,81% | 63,58% | 71,59% | ● |
| 144280000.461.2527 | 2,26% | 0,00% | 0,00% | ● | 92,19% | 15,63% | 16,95% | ● |
| 144280000.461.3692 | 0,54% | 0,29% | 53,70% | ● | 99,02% | 12,37% | 12,49% | ● |
| 152180000.0000.388434 | 15,58% | 0,00% | 0,00% | ● | 76,69% | 18,61% | 24,27% | ● |
| 152180000.0000.384004 | 1,50% | 1,33% | 88,67% | ● | 100,00% | 23,92% | 23,92% | ● |
| 165100000.0000.388221 | 8,70% | 0,04% | 0,46% | ● | 50,90% | 27,75% | 54,52% | ● |
| 175200000.0000.374588 | 10,77% | 6,55% | 60,82% | ● | 14,17% | 7,52% | 53,07% | ● |
| 175200000.0000.374666 | 4,11% | 1,75% | 42,58% | ● | 78,39% | 20,62% | 26,30% | ● |
| 175200000.0000.383124 | 43,77% | 37,43% | 85,52% | ● | 100,00% | 73,55% | 73,55% | ● |

| CUP Proyecto | % Programación metas física III Trimestre | % Ejecución meta física III Trimestre | % Cumplimiento metas físicas | | % Programación Presupuestaria III Trimestre | % Ejecución III Trimestre | % Cumplimiento ejecución presupuestaria | |
|-----------------------|---|---------------------------------------|------------------------------|---|---|---------------------------|---|---|
| | (a) | (b) | c (b/a) | | (d) | (e) | f (d/c) | |
| 175200000.0000.383589 | 100,00% | 50,00% | 50,00% | ● | 100,00% | 59,50% | 59,50% | ● |
| 32540000.0000.384924 | 0,04% | 0,01% | 25,00% | ● | 86,82% | 10,03% | 11,55% | ● |
| 175200000.0000.387507 | 91,98% | 0,00% | 0,00% | ● | 100,00% | 0,00% | 0,00% | ● |
| 175200000.0000.387609 | 95,08% | 0,00% | 0,00% | ● | 78,77% | 0,00% | 0,00% | ● |
| 175200000.0000.387614 | 36,51% | 0,00% | 0,00% | ● | 80,15% | 0,00% | 0,00% | ● |
| 175200000.0000.387709 | 96,43% | 74,11% | 76,85% | ● | 87,51% | 74,57% | 85,21% | ● |
| 175200000.0000.387728 | 82,00% | 0,00% | 0,00% | ● | 83,81% | 0,00% | 0,00% | ● |
| 175200000.0000.387925 | 13,89% | 8,74% | 62,92% | ● | 78,61% | 40,31% | 51,28% | ● |
| 175200000.0000.387930 | 87,81% | 2,85% | 3,25% | ● | 88,06% | 34,51% | 39,19% | ● |
| 175200000.0000.387972 | 70,00% | 0,00% | 0,00% | ● | 79,62% | 0,00% | 0,00% | ● |
| 175200000.0000.388535 | 49,07% | 5,72% | 11,66% | ● | 81,00% | 0,32% | 0,40% | ● |
| 175200000.0000.388555 | 100,00% | 80,00% | 80,00% | ● | 100,00% | 28,89% | 28,89% | ● |
| 175200000.0000.388574 | 58,17% | 0,00% | 0,00% | ● | 83,00% | 49,96% | 60,19% | ● |
| 32540000.0000.386244 | 6,24% | 2,50% | 40,06% | ● | 100,00% | 50,00% | 50,00% | ● |
| 175400000.0000.387527 | 7,55% | 3,13% | 41,46% | ● | 97,90% | 0,00% | 0,00% | ● |
| 185500000.0000.384629 | 4,00% | 1,91% | 47,75% | ● | 93,01% | 34,72% | 37,33% | ● |
| 185500000.0000.388060 | 11,80% | 0,51% | 4,32% | ● | 62,08% | 34,44% | 55,48% | ● |
| 195910000.0000.388279 | 25,00% | 0,00% | 0,00% | ● | 50,00% | 44,64% | 89,28% | ● |
| 195930000.0000.388143 | 29,50% | 5,83% | 19,76% | ● | 43,66% | 0,40% | 0,92% | ● |
| 195980000.0000.387885 | 100,00% | 0,00% | 0,00% | ● | 100,00% | 33,96% | 33,96% | ● |
| 195980000.0000.388074 | 80,00% | 0,00% | 0,00% | ● | 88,13% | 11,09% | 12,58% | ● |
| 195980000.0000.388082 | 100,00% | 0,00% | 0,00% | ● | 100,00% | 0,00% | 0,00% | ● |
| 31210000.0000.382700 | 9,10% | 6,60% | 72,53% | ● | 97,79% | 86,35% | 88,30% | ● |
| 32540000.0000.388032 | 19,00% | 11,20% | 58,95% | ● | 77,57% | 44,86% | 57,83% | ● |
| 36080000.0000.386706 | 50,69% | 30,50% | 60,17% | ● | 55,48% | 25,22% | 45,46% | ● |
| 46090000.0000.387081 | 15,95% | 13,59% | 85,20% | ● | 77,51% | 68,12% | 87,89% | ● |
| 50500000.0000.387220 | 1,49% | 0,00% | 0,00% | ● | 50,00% | 0,00% | 0,00% | ● |
| 50500000.0000.388027 | 67,57% | 0,00% | 0,00% | ● | 100,00% | 0,00% | 0,00% | ● |
| 50610000.0000.386064 | 0,39% | 0,08% | 20,51% | ● | 83,72% | 24,36% | 29,10% | ● |
| 50680000.0000.387096 | 7,92% | 4,13% | 52,15% | ● | 100,00% | 67,87% | 67,87% | ● |
| 55780000.0000.387286 | 15,50% | 11,47% | 74,00% | ● | 70,00% | 26,08% | 37,26% | ● |
| 60700000.0000.375983 | 2,11% | 1,10% | 52,13% | ● | 100,00% | 48,92% | 48,92% | ● |
| 60700000.0000.382365 | 30,00% | 3,60% | 12,00% | ● | 100,00% | 31,94% | 31,94% | ● |
| 60700000.0000.382572 | 0,03% | 0,01% | 33,33% | ● | 100,00% | 15,58% | 15,58% | ● |
| 60700000.0000.386904 | 8,64% | 0,00% | 0,00% | ● | 50,00% | 0,00% | 0,00% | ● |
| 60700000.0000.387103 | 17,14% | 0,00% | 0,00% | ● | 100,00% | 0,00% | 0,00% | ● |
| 60700000.0000.387981 | 20,05% | 0,03% | 0,15% | ● | 100,00% | 45,40% | 45,40% | ● |
| 81300000.0000.383697 | 9,44% | 6,84% | 72,46% | ● | 59,54% | 2,92% | 4,90% | ● |
| 81300000.0000.384584 | 36,53% | 19,53% | 53,46% | ● | 38,79% | 0,00% | 0,00% | ● |
| 81350000.0000.388194 | 1,75% | 1,32% | 75,43% | ● | 16,47% | 1,05% | 6,38% | ● |
| 91400000.0000.387227 | 44,19% | 14,48% | 32,77% | ● | 99,50% | 50,67% | 50,93% | ● |

| CUP Proyecto | % Programación metas física III Trimestre | % Ejecución meta física III Trimestre | % Cumplimiento metas físicas | | % Programación Presupuestaria III Trimestre | % Ejecución III Trimestre | % Cumplimiento ejecución presupuestaria | |
|----------------------|---|---------------------------------------|------------------------------|---|---|---------------------------|---|---|
| | (a) | (b) | c (b/a) | | (d) | (e) | f (d/c) | |
| 91400000.0000.388010 | 46,67% | 17,77% | 38,08% | ● | 65,47% | 20,41% | 31,17% | ● |
| 91400000.0000.388011 | 14,26% | 0,59% | 4,14% | ● | 68,63% | 26,38% | 38,44% | ● |
| 91400000.0000.388014 | 4,39% | 0,00% | 0,00% | ● | 50,59% | 1,47% | 2,91% | ● |
| 91400000.0000.388016 | 13,38% | 6,77% | 50,60% | ● | 29,38% | 13,18% | 44,86% | ● |
| 91400000.0000.388025 | 10,00% | 0,00% | 0,00% | ● | 47,66% | 0,00% | 0,00% | ● |
| 91480000.0000.387211 | 14,16% | 12,70% | 89,69% | ● | 98,32% | 73,86% | 75,12% | ● |
| 91480000.0000.387224 | 43,75% | 0,00% | 0,00% | ● | 98,95% | 36,84% | 37,23% | ● |
| 91480000.0000.387225 | 16,67% | 6,25% | 37,49% | ● | 68,52% | 60,79% | 88,72% | ● |
| 91480000.0000.388416 | 100,00% | 0,00% | 0,00% | ● | 100,00% | 0,00% | 0,00% | ● |
| 91500000.0000.387122 | 48,00% | 5,00% | 10,42% | ● | 96,11% | 60,46% | 62,91% | ● |
| 91500000.0000.388616 | 8,02% | 4,90% | 61,10% | ● | 58,63% | 8,93% | 15,23% | ● |
| 91640000.0000.382693 | 49,99% | 36,66% | 73,33% | ● | 40,00% | 10,02% | 25,05% | ● |
| 91640000.0000.384668 | 46,67% | 0,00% | 0,00% | ● | 70,00% | 0,00% | 0,00% | ● |
| 91660000.0000.380106 | 0,07% | 0,05% | 71,43% | ● | 100,00% | 81,60% | 81,60% | ● |
| 91660000.0000.383122 | 0,09% | 0,00% | 0,00% | ● | 100,00% | 0,00% | 0,00% | ● |
| 91660000.0000.388414 | 100,00% | 0,00% | 0,00% | ● | 100,00% | 44,36% | 44,36% | ● |
| 91670000.217.2656 | 1,22% | 1,08% | 88,52% | ● | 45,00% | 28,74% | 63,87% | ● |
| 91690000.0000.386965 | 49,15% | 0,00% | 0,00% | ● | 50,00% | 0,00% | 0,00% | ● |
| 91690000.0000.388220 | 50,00% | 0,00% | 0,00% | ● | 50,00% | 0,00% | 0,00% | ● |
| 91690000.0000.388374 | 25,00% | 0,00% | 0,00% | ● | 50,00% | 0,00% | 0,00% | ● |
| 91700000.0000.374677 | 5,75% | 4,50% | 78,26% | ● | 82,14% | 18,90% | 23,01% | ● |
| 91700000.0000.386024 | 18,74% | 6,24% | 33,30% | ● | 100,00% | 40,03% | 40,03% | ● |
| 91700000.681.4167 | 6,17% | 0,75% | 12,16% | ● | 93,72% | 20,07% | 21,41% | ● |
| 91700000.682.2815 | 2,62% | 1,15% | 43,89% | ● | 66,44% | 35,10% | 52,83% | ● |
| 91700000.682.6679 | 1,82% | 1,50% | 82,42% | ● | 100,00% | 9,55% | 9,55% | ● |
| 91700000.683.4028 | 14,28% | 11,43% | 80,04% | ● | 86,66% | 21,21% | 24,47% | ● |
| 91700000.683.6682 | 3,06% | 1,68% | 54,90% | ● | 100,00% | 27,31% | 27,31% | ● |
| 91710000.0000.387788 | 100,00% | 0,00% | 0,00% | ● | 100,00% | 23,78% | 23,78% | ● |
| 91720000.0000.388071 | 22,40% | 14,40% | 64,29% | ● | 56,00% | 3,09% | 5,52% | ● |
| 91720000.0000.388073 | 19,05% | 12,50% | 65,62% | ● | 70,00% | 3,07% | 4,39% | ● |
| 91730000.0000.388125 | 55,00% | 0,00% | 0,00% | ● | 54,65% | 0,00% | 0,00% | ● |
| 91730000.0000.388256 | 100,00% | 44,00% | 44,00% | ● | 100,00% | 43,87% | 43,87% | ● |
| 91730000.0000.388277 | 100,00% | 50,90% | 50,90% | ● | 100,00% | 84,10% | 84,10% | ● |
| 91730000.0000.388296 | 100,00% | 0,00% | 0,00% | ● | 100,00% | 0,00% | 0,00% | ● |
| 91730000.0000.388815 | 3,00% | 0,00% | 0,00% | ● | 2,93% | 0,00% | 0,00% | ● |
| 91740000.0000.387996 | 37,81% | 12,58% | 33,27% | ● | 85,09% | 53,87% | 63,31% | ● |
| 91750000.0000.375123 | 36,00% | 16,00% | 44,44% | ● | 83,66% | 30,92% | 36,96% | ● |
| 91760000.0000.373738 | 2,40% | 1,60% | 66,67% | ● | 100,00% | 33,37% | 33,37% | ● |
| 91760000.0000.373808 | 11,90% | 7,39% | 62,10% | ● | 100,00% | 33,05% | 33,05% | ● |
| 91760000.0000.378235 | 1,11% | 0,98% | 88,29% | ● | 100,00% | 9,14% | 9,14% | ● |
| 91760000.0000.378241 | 3,61% | 1,11% | 30,75% | ● | 100,00% | 38,48% | 38,48% | ● |

| CUP Proyecto | % Programación metas física III Trimestre | % Ejecución meta física III Trimestre | % Cumplimiento metas físicas | | % Programación Presupuestaria III Trimestre | % Ejecución III Trimestre | % Cumplimiento ejecución presupuestaria | |
|----------------------|---|---------------------------------------|------------------------------|---|---|---------------------------|---|---|
| | (a) | (b) | c (b/a) | | (d) | (e) | f (d/c) | |
| 91770000.0000.378192 | 17,43% | 4,37% | 25,07% | ● | 100,00% | 14,40% | 14,40% | ● |
| 91790000.0000.387154 | 46,60% | 39,60% | 84,98% | ● | 100,00% | 8,10% | 8,10% | ● |
| 91800000.0000.385004 | 45,00% | 13,00% | 28,89% | ● | 87,58% | 0,00% | 0,00% | ● |
| 91800000.727.7353 | 9,65% | 4,75% | 49,22% | ● | 100,00% | 0,00% | 0,00% | ● |
| 91820000.0000.388714 | 100,00% | 0,00% | 0,00% | ● | 60,00% | 0,00% | 0,00% | ● |
| 91820000.0000.388775 | 100,00% | 0,00% | 0,00% | ● | 60,00% | 0,00% | 0,00% | ● |
| 91820000.0000.388877 | 100,00% | 0,00% | 0,00% | ● | 60,00% | 0,00% | 0,00% | ● |
| 91850000.388875 | 21,43% | 7,14% | 33,32% | ● | 30,00% | 16,59% | 55,30% | ● |
| 91850000.0000.388876 | 15,00% | 0,00% | 0,00% | ● | 50,00% | 0,00% | 0,00% | ● |
| 91880000.0000.384758 | 25,00% | 0,00% | 0,00% | ● | 50,00% | 0,00% | 0,00% | ● |
| 91880000.0000.387016 | 19,00% | 6,00% | 31,58% | ● | 50,00% | 30,50% | 61,00% | ● |
| 91880000.0000.388103 | 31,25% | 23,77% | 76,06% | ● | 60,00% | 33,74% | 56,23% | ● |
| 91880000.0000.388936 | 80,00% | 40,00% | 50,00% | ● | 100,00% | 0,00% | 0,00% | ● |
| 91890000.0000.376969 | 0,50% | 0,00% | 0,00% | ● | 100,00% | 1,36% | 1,36% | ● |
| 91890000.0000.382753 | 2,01% | 0,00% | 0,00% | ● | 100,00% | 0,00% | 0,00% | ● |
| 91890000.0000.384064 | 20,70% | 11,13% | 53,77% | ● | 100,00% | 53,83% | 53,83% | ● |
| 91890000.0000.384791 | 12,68% | 4,10% | 32,33% | ● | 95,34% | 34,61% | 36,30% | ● |
| 91890000.0000.388141 | 53,23% | 39,66% | 74,51% | ● | 67,31% | 4,33% | 6,43% | ● |
| 92320000.0000.387668 | 76,66% | 33,66% | 43,91% | ● | 100,00% | 43,66% | 43,66% | ● |
| 92330000.0000.373224 | 9,76% | 4,91% | 50,31% | ● | 76,60% | 41,70% | 54,44% | ● |
| 92330000.0000.386785 | 9,09% | 0,00% | 0,00% | ● | 100,00% | 0,00% | 0,00% | ● |
| 95840000.0000.387126 | 10,81% | 9,28% | 85,85% | ● | 77,15% | 28,75% | 37,27% | ● |

Semaforización ejecución presupuestaria al tercer trimestre: ● Mayor o igual al 100%; ● 99,99% - 90,00%; ● 89,99% - 0%.

Semaforización ejecución metas al tercer trimestre: ● Mayor o igual al 100%; ● 99,99% - 90,00%; ● 89,99% - 0%.

Fuente: Módulo Seguimiento a la Planificación Institucional del Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública – SIPeIP, Secretaría Nacional de Planificación. Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF, Ministerio de Economía y Finanzas - Ejecución Presupuestaria. Corte 30 de septiembre de 2023.

Anexos

- Anexo 1. Reporte de Planes Institucionales – corte 30 de septiembre de 2023 (archivo digital)
- Anexo 2. Reporte de Seguimiento PAI – corte 30 de septiembre de 2023 (archivo digital)
- Anexo 3. Glosario de Términos

Fecha: 10 de noviembre de 2023

Firmas de responsabilidad

| | Nombre / Cargo | Firma |
|-----------------------|---|-------|
| Elaborado por: | Juan José Robayo Contreras Especialista en Seguimiento a la Planificación y Política Pública | |
| | Jessica de Lourdes Cifuentes Proaño Especialista en Seguimiento a la Planificación y Política Pública | |
| | Nancy Yolanda Arias Barreno Especialista en Seguimiento a la Planificación y Política Pública | |
| | Alfredo Iván Oña Gudiño Especialista en Seguimiento a la Planificación y Política Pública | |
| | Pablo Roberto Cárdenas Nasner Analista en Seguimiento a la Planificación y Política Pública | |
| | Milton Rolando Gómez Gordillo Especialista en Seguimiento a la Inversión | |
| Revisado por: | Edwin Paulino Sumba Director de Seguimiento a la Planificación y Política Pública | |
| | Dimas Francisco Delgado Solarte Director de Seguimiento a la Inversión | |
| Aprobado por: | Roberto Eduardo Vargas Zambrano Subsecretario de Seguimiento | |



@PlanificacionEc



@PlanificacionEc



@PlanificacionEc

Secretaría Nacional de Planificación



República
del Ecuador
